

OPERADO

2021

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-40

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: SE210031 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PASEO PUEBLO NUEVO, PASEO LOS ANGELES Y PASEO LLANO GRANDE

Ubicación:

Colonia: COL. PASEO DE LA PREDERA

Fecha Real de Inicio: 12/11/2021 Fecha Real de Terminación: 31/12/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO.

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 484.47 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0638	28 de octubre de 2021	\$544,995.03	\$544,995.03	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 578.8 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$534,083.35	\$534,083.35	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Guarniciones. Limpieza, trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1,000 a 2,000 m2, incluye topógrafo y cadenero. Excavación a mano en terreno tipo "b", cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal, f'c=150 kg/cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra. Aprovecho de guarnición con producto de excavación. Banquetas. Excavación a mano en terreno tipo "b", cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 acabado rayado y remates a volteador de 10 centímetros de espesor, incluye materiales, desperdicios, traslapes, acarreos, cimbra, descimbrado, curado, mano de obra, cargas y descargas, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rampa de concreto f'c=150 kg/cm2 con pendiente de 7.5% hasta 1.50 metros x 1.50 metros, acabado cepillado, rotulo con el símbolo universal de discapacidad y pintura azul tráfico, incluye demolición y corte de concreto. Rampa de concreto f'c= 150 kg/cm2 con pendiente de 7.5% de 1.20 x 1.50 mts acabado cepillado, rotulo con símbolo universal de discapacidad y pintura tráfico, incluye demolición y corte de concreto. Demolición a mano de banqueta de concreto de 10 cm de espesor sin armar, incluye: retiro de material producto de la demolición y limpieza. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros con material de banco de rechazo al 90% proctor modificado, para estabilizar el terreno. Registro sanitario de 0.68 x 0.88 y 0.60 metros de profundidad, con muros de tabique de 14 centímetros asentado con mortero arena, acabado pulido en su interior, incluye tapa de concreto f'c= 150kg/cm2 y contramarco de ángulo de 1" x 3/16". Renivelación de registro sanitario de 68 x 88 x 60 centímetros, con ladrillo rojo recocado asentado con mortero arena 1:5, acabado pulido en su interior, incluye tapa de concreto f'c=150 kg./cm2 y contramarco de ángulo de 1" x 3/16". Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Renivelación de registro sanitario de 46x46x60 cms con ladrillo rojo recocado asentado con mortero, arena 1:5 acabado pulido en su interior, incluye: tapa de concreto f'c= 150 kg/cm2 y contramarco de ángulo 1"x 3/16"

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUÑOZ CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Cecilia Guevara
Cecilia Judith Guevara S.

BENEFICIARIOS
6181827126

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

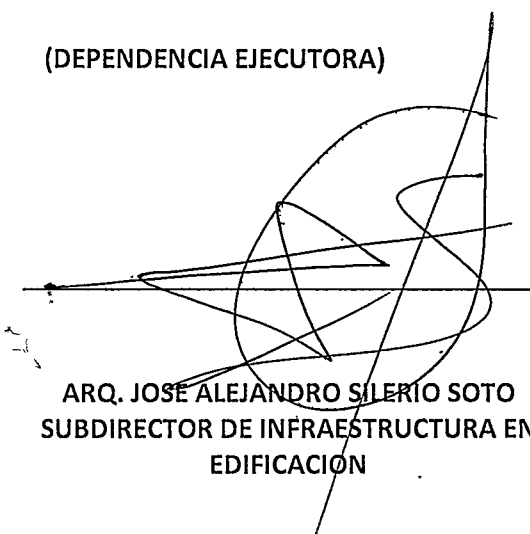

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION

OPERADO

2021

FISM

OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

