

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-11

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE220021 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - MASIÉ

Ubicación:

Colonia: COL. MASIÉ



Fecha Real de Inicio: 01/06/2022

Fecha Real de Terminación: 29/08/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0743	11 de abril de 2022	\$1,237,438.9	\$1,237,438.9	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,230,791.91	\$1,230,791.91	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

CANCHA DE FUTBOL Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 50 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena sílica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material ,mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: resanes con mezcla de cemento arena 1:4, sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. IMAGEN INSTITUCIONAL Lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos. ALUMBRADO. CANCHA DE FUTBOL 7. Retiro, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km 2.5 de reflector completo de aditivos metálicos tipo campana de 1000 w incluye desmontar a cualquier altura. Suministro y colocación de reflector led de 600 watts 63000LM 85-305V 6500 k MARCA TECNOLITE MODELO ML-RPS-600 wsmad Incluye colocación en arbotante a cualquier altura, cable de uso rudo 3x12, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector para acometida forrado. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 12 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y esmalte, a dos tonos indicados por supervisión incluye materiales, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa de 3.5x6 ALUMBRADO PERIMETRAL Suministro y colocación de luminaria City Plus de 70 watts mca. SOLA BASIC, incluye: brazo de 50 cm. Por 2" de diámetro, placa de tres perforaciones para atornillar en percha de arbotante, pintura, conexiones, pruebas a cualquier altura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y esmalte, a dos tonos indicados por supervisión incluye materiales, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de conector para acometida forrado. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa de 3.5x6. DOMO Retiro, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km 2.5 de reflector de 400 w. Suministro y colocación de reflector led de 150 watts, mca. forlighting 6000°k, modelo halcon led slim incluye: cable uso rudo cal 3x14, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para intemperie en caja condulet FS de 3/4 incluye: dos cables thw cal 10 línea, neutro y cal 12 desnudo, fijación a 2.20 mts del soporte de domo, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de tubería conduit 3/4 galvanizada pared delgada incluye: dos cables cal 12 THW, un cable cal 12 de Cu desnudo, cinta scotch, abrazaderas omegas, coples, conectores, condulets, cable uso rudo 3x12, codos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de cable THW cal. 12. PRECIOS ATÍPICOS Suministro e instalación de malla ciclónica de 63x63 calibre 10.5 en tramos aislados, soldada a solera de 3/4" x 3/16" incluye cortes, desperdicios, acarreo, material, mano de obra, equipo y herramienta Suministro y aplicación de pintura esmalte en estructura metálica ptr de 2" a 6". Reparación de herrería en puerta de acceso a unidad y canchas de futbol, incluye: pintura anticorrosiva y pintura esmalte.


De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



DANIELA MUÑOZ CH.
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

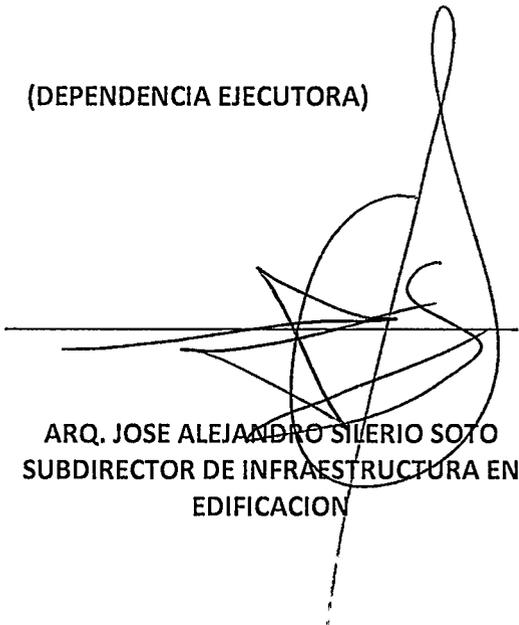

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DURANGO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

