

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: SE220027 CP

Descripción de la Obra: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ARBOLEDAS

Ubicación: ENTRE C. DALÍ Y REAL VICTORIA, EN C. REAL VICTORIA ENTRE AV. ARBOLEDAS Y C. DALÍ Y C. DALÍ ENTRE AV. ARBOLEDAS Y REAL VICTORIA.

Colonia: FRACC. REAL VICTORIA II

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022

Fecha Real de Terminación: 04/08/2022

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 302.45

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0742	11 de abril de 2022	\$558,000.00	\$558,000.00	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0915	30 de diciembre de 2022	\$146,341.66	\$146,341.66	\$0	\$0	\$0
No. 2022-PNM-AM-0903	30 de diciembre de 2022	\$143,334.53	\$0	\$0	\$143,334.53	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 239.28

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$554,992.87	\$411,658.34	\$0	\$143,334.53	\$0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:**

GUARNICIONES. Demolición de guarnición de concreto simple de sección tipo, incluye: carga y acarreo de material no útil hacia fuera de la obra. Limpieza de terreno, incluye acarreo fuera de la obra de material no útil. Trazo y nivelación del terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en áreas de construcción. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal f'c=150 kg/cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra. Aplicación de Pintura para tráfico pesado Mca. BEREL y/o similar Color amarillo sobre guarnición tipo con dos aplicaciones de acuerdo a la norma (nom-034-sct2-2003, incluye: preparación de la superficie y limpieza, P.U.O.T. BANQUETAS Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Suministro y relleno de material de banco, compactado en capas de 20 centímetros de espesor del 80% al 85% proctor con placa apisonadora (Bailarina), incluye acarreo volumen medido compacto. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 10 centímetros de espesor, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra, frontera, acabado rayado Rampa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 1.50m x 1.50m de 10 cm de esp. Acabado rayado incluye logotipo de discapacitados pintura color blanco trafico pesado Mca. BEREL y/o similar, pintura azul de trafico Mca. BEREL y/o similar en resto de rampa, en abanico Suministro y colocación de señal "cruce escolar" en color amarillo con negro de lámina galvanizada de 4 milímetros con ceja de 61x61 centímetros a base de ptr de 2x2 de 2.5 metros acabado gris mate, incluye anclaje de concreto de f'c=150 kg/cm2 de 40x40 centímetros. Suministro y colocación de barandal de protección de 1.65 metros de alto por 3.05 metros de largo para acceso de Jardín de Niños a base de largueros y postes de PTR 2"X2" CAL 14 según diseño. incluye fondo anticorrosivo y pintura de esmalte LONA INSTITUCIONAL DE 2.00 X 1.00 MTS CON ROTULACIÓN DEFINIDA POR LA SUPERVISIÓN. FIRMES Limpieza de terreno, incluye acarreo fuera de la obra de material no útil. Trazo y nivelación del terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en áreas de construcción. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Suministro y relleno de material de banco, compactado en capas de 20 centímetros de espesor del 80% al 85% proctor con placa apisonadora (Bailarina), incluye acarreo volumen medido compacto. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 10 centímetros de espesor, acabado estampado, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera.

# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

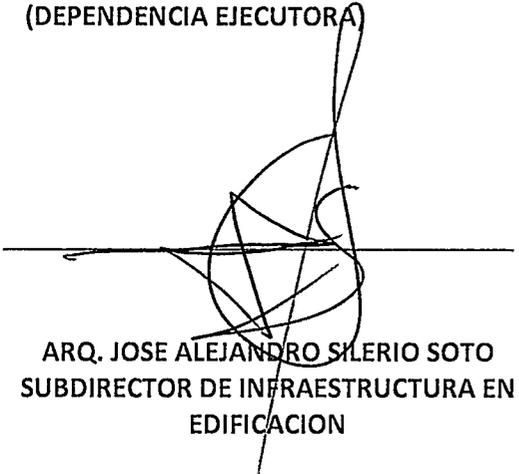
ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MILARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo March Fernández M.  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION



**OBRAS PÚBLICAS**  
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

