



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19 -02019-52

Programa: SE.-URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS
Clave de la Obra: 19/05024 CP
Descripción de la Obra: GUARNICIONES EN CALLE COLIMA
Ubicación: ENTRE YUCATAN Y QUERETARO
Colonia: MEXICO



Fecha Real de Inicio: 30/07/2019

Fecha Real de Terminación: 31/07/2019

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 9

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-004/19, 14/02/19, \$3,881, \$2,600, \$0, \$0, \$1,281

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 9.44

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2019, \$3,771.65, \$2,526.61, \$0, \$0, \$1,245.02

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías comunitaria. Escarificación y excavación en material tipo "c" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. Promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Reafine de t.n. por medios mecanicos en material tipo c. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 20 cm compactos. Pavimento riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.tendido de pavimento de concreto hidraulico de 15 cms de espesor promedio con fibra de polipropileno en una proporción de 900 grs/m3 colado continuo, incluye cimbra metalica, membrana de curado, celotex y corte de juntas frias con disco. Suministro de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr. / m³. Sellado de juntas a base de emulsion asfaltica incluye: limpieza y barrido de la junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta obra complementaria renivelacion de pozo de visita tipo comun de 70 cms de altura con muro de tabique rojo recocido de 28 cms de espesor, asentado con mortero-cemento-arena 1:5 aplanado pulido interior de 2.5 cms suministro y colocación de brocal de fo.fo. Para trafico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2016-2019 para pozos de visita incluye:colocado y m. De o.




## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

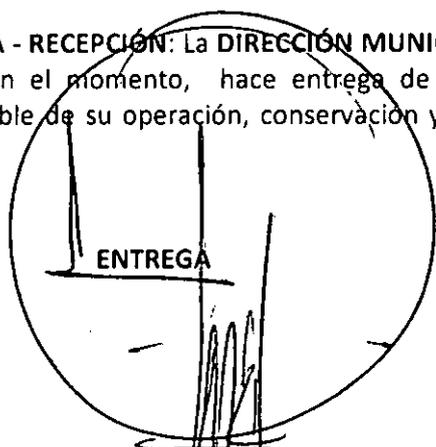

ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

*Martha Sánchez Marroel*  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

~~ARQ. SERGIO HUMBERTO QUINONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS~~





# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

