


4

# **PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL (PNM) 2020**



**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**  
**PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL**  
**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	34,513.86	984,384.84	1,483,835.65	-	27,532.26	1,456,303.39	560,409.34	71,052.74	71,052.74	12.68	33.33	4.00	4.00	-	-	
SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE	60,653.72	-	3,875,874.74	-	45,108.12	3,830,766.62	1,138,912.83	129,416.38	129,416.38	11.36	33.33	4.00	4.00	-	-	
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	269,408.47	15,394,855.58	8,644,410.81	-	-	8,644,410.81	3,629,515.21	269,408.47	269,408.47	31.01	17.56	6.00	1.00	4.00	1.00	
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	162,001.56	3,652,155.89	850,066.63	-	-	850,066.63	589,692.72	162,001.56	162,001.56	27.47	6.53	2.00	-	1.00	1.00	
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES	107,406.91	11,742,699.69	7,794,344.18	-	-	7,794,344.18	3,039,822.49	107,406.91	107,406.91	3.53	11.03	4.00	1.00	3.00	-	
07.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS	-	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	6,092,544.00	6,092,544.00	-	6,092,544.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	112,500.00	4,000,000.00	4,000,000.00	360,000.00	410,000.00	3,950,000.00	2,945,000.00	2,794,075.00	2,194,075.00	74.50	95.38	13.00	11.00	2.00	-	
ESPACIOS PÚBLICOS	-	1,274,562.59	1,274,562.59	-	349,079.52	925,483.07	925,483.07	224,369.30	224,369.30	24.24	85.00	1.00	-	1.00	-	
BACHEO	-	9,000,000.00	11,010,498.00	-	-	11,010,498.00	11,007,607.68	3,287,635.25	2,775,774.25	25.22	40.17	3.00	-	2.00	1.00	
FRESADOS	-	-	4,610,129.00	-	-	4,610,129.00	4,610,129.00	-	-	0.00	0.00	3.00	-	-	3.00	
OBRAS DIVERSAS	-	1,577,080.00	1,508,934.74	-	1,000,000.00	508,934.74	508,934.74	-	-	0.00	16.67	1.00	1.00	-	-	
FONDO MINERO	-	30,118,120.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>477,076.05</b>	<b>68,441,547.01</b>	<b>46,300,789.53</b>	<b>360,000.00</b>	<b>11,724,263.90</b>	<b>34,936,525.63</b>	<b>25,325,991.87</b>	<b>6,775,957.14</b>	<b>5,664,096.14</b>	<b>17.90</b>	<b>32.14</b>	<b>35.00</b>	<b>21.00</b>	<b>9.00</b>	<b>5.00</b>	

  
 JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**MÚNICPIO DE DURANGO, DGO.**  
**PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL**  
**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Operativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
<b>SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE</b>																												
SC200006 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	62,638.68	146,710.61	-	-	146,710.61	146,710.61	-	-	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-151220-SC200006-00000000-0000	TERMINADA	100	75	M.L.	98		
SC200008 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	20,879.56	20,880.00	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-140220-SC200008-00000000-0000	TERMINADA	100	75	M.L.	98		
N/A	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	82,232.73	66,668.09	-	-	66,668.09	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	127	M.L.	N/A	
N/A	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	27,410.91	27,410.91	-	-	27,410.91	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	127	M.L.	N/A	
SC200010 CP	AGUA POTABLE EN LA CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON PAV. HD.)	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	2,528.06	63,228.14	-	27,171.57	36,056.57	36,056.57	36,056.57	36,056.57	36,056.57	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-151220-SC200010-00000000-0000	TERMINADA	100	43.3	M.L.	43	
SC200010 CP	AGUA POTABLE EN LA CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON PAV. HD.)	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	842.69	843.00	-	360.69	482.31	482.31	482.31	482.31	482.31	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-140220-SC200010-00000000-0000	TERMINADA	100	43.3	M.L.	43	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	78,956.16	201,744.01	-	-	201,744.01	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	91.5	M.L.	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	26,318.72	26,318.72	-	-	26,318.72	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	91.5	M.L.	N/A	
N/A	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE FRAY DIEGO DE GANTE Y MAGNOLIAS	FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	17,891.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	7	TOMA	N/A	
N/A	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE FRAY DIEGO DE GANTE Y MAGNOLIAS	FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	5,963.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	7	TOMA	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	48,125.41	50,195.14	-	-	50,195.14	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	16	TOMA	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	16,041.80	16,041.80	-	-	16,041.80	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	16	TOMA	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	41,150.17	48,360.31	-	-	48,360.31	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	14	TOMA	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	13,716.72	13,716.72	-	-	13,716.72	-	-	-	-	-	NO INICIADA	0	14	TOMA	N/A	

SUMA DE HOJA	-	444,696.77	682,137.45	-	27,532.26	654,605.19	204,129.49	36,538.88	36,538.88
SUBTOTAL	-	444,696.77	682,137.45	-	27,532.26	654,605.19	204,129.49	36,538.88	36,538.88
TOTAL	-	444,696.77	682,137.45	-	27,532.26	654,605.19	204,129.49	36,538.88	36,538.88

FORMULO  
  
 ARO. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES LASCURAIN  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO  
  
 C.P. y M.I. MARTHA RUTH HERNANDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 JORGE ALEJANDRO SALUN DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLABEM

Vo. Bo.  
  
 M. A. P. LUZ MARIA DE GUAY AVITIA  
 SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																												
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																												
SC200015 CP	AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	29,592.18	50,570.32	101,316.58	-	-	101,316.58	101,316.58	29,592.18	29,592.18	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002002-6141-2-151220-SC200015-00000000-0000	TERMINADA	100	90.3	M.L.	55		
SC200015 CP	AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	4,921.68	16,856.77	16,857.00	-	-	16,857.00	16,857.00	4,921.68	4,921.68	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002002-6141-2-140220-SC200015-00000000-0000	TERMINADA	100	90.3	M.L.	55		
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	69,067.97	190,496.32	-	-	190,496.32	-	-	-	-	NO INICIADA	0	105	M.L.	N/A		
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	23,022.66	23,022.66	-	-	23,022.66	-	-	-	-	NO INICIADA	0	105	M.L.	N/A		
N/A	5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL. JOSE REVUELTAS	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	151,235.37	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	185	M.L.	N/A		
N/A	5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL. JOSE REVUELTAS	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	50,411.79	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	185	M.L.	N/A		
N/A	SEMARINAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	31,368.57	81,228.99	-	-	81,228.99	-	-	-	-	NO INICIADA	0	9	TOMA	N/A		
N/A	SEMARINAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	10,462.86	10,462.86	-	-	10,462.86	-	-	-	-	NO INICIADA	0	9	TOMA	N/A		
SC200019 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	102,503.63	203,936.27	-	-	203,936.27	203,936.27	-	-	-	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-151220-SC200019-00000000-0000	TERMINADA	100	148	M.L.	30	
SC200019 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	34,167.94	34,168.00	-	-	34,168.00	34,168.00	-	-	-	1-1235040006-999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-140220-SC200019-00000000-0000	TERMINADA	100	148	M.L.	30	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	41,038.59	-	-	41,038.59	-	-	-	-	NO INICIADA	0	40.7	M.L.	N/A		
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	13,679.53	-	-	13,679.53	-	-	-	-	NO INICIADA	0	40.7	M.L.	N/A		
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTIÑAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	64,117.05	-	-	64,117.05	-	-	-	-	NO INICIADA	0	58	M.L.	N/A		
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTIÑAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	21,372.35	-	-	21,372.35	-	-	-	-	NO INICIADA	0	58	M.L.	N/A		

SUMA DE HOJA	34,513.86	539,688.07	801,698.19	-	-	801,698.19	356,279.85	34,513.86	34,513.86
SUBTOTAL	34,513.86	984,384.84	1,483,835.65	-	27,532.26	1,456,303.39	560,409.34	71,052.74	71,052.74
TOTAL	34,513.86	984,384.84	1,483,835.65	-	27,532.26	1,456,303.39	560,409.34	71,052.74	71,052.74

FORMULO  
  
 ARQ. RODRIGO ALEJANDRO NÁJARES CASAVANTES  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULO  
  
 C.P. M.I. ERKA HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 JORGE ALEJANDRO SALAS DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
  
 M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA  
 JUDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AYALA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
SD- ALCANTARILLADO Y DRENAJE																											
01- REHABILITACIÓN																											
SD200040 CP	ALCANTARILLADO EN CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		85,403.09		33,831.10		51,572.00	51,572.00	51,572.00	51,572.00	1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-151220-SD200040-0000000-0000	TERMINADA	100	43.3	ML	43	
SD200040 CP	ALCANTARILLADO EN CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		28,467.69		11,277.03		17,190.67	17,190.67	17,190.67	17,190.67	1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-140220-SD200040-0000000-0000	TERMINADA	100	43.3	ML	43	
SD200041 CP	ALCANTARILLADO EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	45,490.29	156,008.67				156,008.67	156,008.67	45,490.29	45,490.29	1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-151220-SD200041-0000000-0000	TERMINADA	100	69.3	ML	55	
SD200041 CP	ALCANTARILLADO EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	15,163.43	52,002.89				52,002.89	52,002.89	15,163.43	15,163.43	1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-140220-SD200041-0000000-0000	TERMINADA	100	68.3	ML	55	
SD200042 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		269,171.73				269,171.73	269,171.73			1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-151220-SD200042-0000000-0000	TERMINADA	100	77.2	ML	96	
SD200042 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		89,723.91				89,723.91	89,723.91			1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-140220-SD200042-0000000-0000	TERMINADA	100	77.2	ML	96	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		130,050.16				130,050.16					NO INICIADA	0	50.2	ML	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		43,350.05				43,350.05					NO INICIADA	0	50.2	ML	N/A	
N/A	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		177,139.37				177,139.37					NO INICIADA	0	65.5	ML	N/A	
N/A	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		59,046.46				59,046.46					NO INICIADA	0	65.5	ML	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		552,209.72				552,209.72					NO INICIADA	0	151.2	ML	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		184,069.91				184,069.91					NO INICIADA	0	151.2	ML	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		251,122.46				251,122.46					NO INICIADA	0	97.2	ML	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		83,707.46				83,707.46					NO INICIADA	0	97.2	ML	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		232,760.45				232,760.45					NO INICIADA	0	91.6	ML	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020		77,586.82				77,586.82					NO INICIADA	0	91.6	ML	N/A	

SUMA DE HOJA	60,653.72	-	2,471,820.84	-	45,108.12	2,426,712.72	635,669.86	129,416.38	129,416.38
SUBTOTAL	60,653.72	-	2,471,820.84	-	45,108.12	2,426,712.72	635,669.86	129,416.38	129,416.38
TOTAL	95,167.58	984,384.84	3,955,656.68	-	72,640.38	3,883,016.11	1,196,079.20	200,469.12	200,469.12

FORMULO: **ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO: **C.P. y M.I. MARTHA RIVA HERNANDEZ**  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: **JORGE ALEJANDRO SALAS DE PALACIO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

VS. BO: **ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES**  
COORDINADOR GENERAL DEL COPCADEM

VS. BO: **M. A. P. LUZ MARÍA CARRIÓN AVITIA**  
SINDICO MUNICIPAL

VS. BO: **C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO**  
CONTRALORA MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
	SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE																										
	01.- REHABILITACIÓN																										
	01.- REHABILITACIÓN																										
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			306,342.47			306,342.47					NO INICIADA	0	113.8	ML	N/A	
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			102,114.16			102,114.16					NO INICIADA	0	113.8	ML	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			223,587.20			223,587.20					NO INICIADA	0	97.5	ML	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			74,529.07			74,529.07					NO INICIADA	0	97.5	ML	N/A	
SD200047 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO # O BLVD DE LAS ROSAS	COL JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			377,432.23			377,432.23	377,432.23			1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-405003001-6141-2-151220-SD200047-00000000-0000	TERMINADA	100	154	ML	214	
SD200047 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO # O BLVD DE LAS ROSAS	COL JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			125,810.74			125,810.74	125,810.74			1-1235040007-999-00-1050101-2103-000-405003001-6141-2-140220-SD200047-00000000-0000	TERMINADA	100	154	ML	214	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			145,678.52			145,678.52					NO INICIADA	0	77.2	ML	N/A	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020			46,559.51			46,559.51					NO INICIADA	0	77.2	ML	N/A	

SUMA DE HOJA	-	-	1,404,053.90	-	-	1,404,053.90	503,242.97	-	-
SUBTOTAL	60,653.72	-	3,875,874.74	-	45,108.12	3,830,766.62	1,138,912.83	129,416.38	129,416.38
TOTAL	95,167.58	984,384.84	5,359,710.39	-	72,640.38	5,287,070.01	1,699,322.17	200,469.12	200,469.12

FORMULO  
  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO  
  
C.P. Y M. ESMERALDA HERNANDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH VILLA LUCERO  
CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**  
**PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL**  
**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Gubernativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
SE200001 CP	SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS BANQUETAS EN LA CALLE LAUREANO RONCAL	ZONA CENTRO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	162,001.56	3,339,691.01	550,135.12	-	-	550,135.12	550,135.12	162,001.56	162,001.56	1-1235040001-999-00-1050101-2201-000-K05004001-6141-2-151220-SE200001-0000000-0000	PROCESO	98	737.79	M²	125,500	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	10,982.00	8,189.60	-	-	8,189.60	-	-	-	-	NO INICIADA	0	28.9	M.L	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	3,294.60	3,295.00	-	-	3,295.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	28.9	M.L	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	95,632.20	71,132.46	-	-	71,132.46	-	-	-	-	NO INICIADA	0	252.19	M.L	N/A	
N/A	22 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	28,749.66	28,750.00	-	-	28,750.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	252.19	M.L	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	33,265.35	28,288.60	-	-	28,288.60	-	-	-	-	NO INICIADA	0	90.15	M.L	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	11,268.75	11,269.00	-	-	11,269.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	90.15	M.L	N/A	
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	70,455.80	58,082.00	-	-	58,082.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	185.41	M.L	N/A	
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	21,136.74	21,137.00	-	-	21,137.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	185.41	M.L	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	22,902.60	22,172.20	-	-	22,172.20	-	-	-	-	NO INICIADA	0	60.27	M.L	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	6,870.78	6,871.00	-	-	6,871.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	60.27	M.L	N/A	
SE200007 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	5,756.40	37,607.60	-	-	37,607.60	37,607.60	-	-	-	NO INICIADA	0	92.51	M.L	46	
SE200007 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00	1,950.00	-	-	-	NO INICIADA	0	92.51	M.L	46	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTRAIPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	795.32	-	-	795.32	-	-	-	-	NO INICIADA	0	3	M.L	N/A	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTRAIPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	391.73	-	-	391.73	-	-	-	-	NO INICIADA	0	3	M.L	N/A	

SUMA DE HOJA	162,001.56	3,652,155.89	850,066.63	-	-	850,066.63	589,692.72	162,001.56	162,001.56
SUBTOTAL	162,001.56	3,652,155.89	850,066.63	-	-	850,066.63	589,692.72	162,001.56	162,001.56
TOTAL	257,169.14	4,636,540.73	6,209,777.02	-	-	72,640.38	6,137,136.64	2,289,014.89	362,470.68

FORMULO  
 ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUARES CASAVANTES  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULO  
 C.P. H. MERCEDES REYNAÑOZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
 JORGE ALEJANDRO SALAM DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.  
 ING. HENRIEETO VILLARREAL PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

VO. BO.  
 M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVILA  
 SINDICO MUNICIPAL

VO. BO.  
 C.P. y M. J. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**  
**PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL**  
**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	Id de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
<b>SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																											
<b>06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES</b>																											
SE20008 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	608,406.37	598,892.65	-	-	598,892.65	598,892.65	-	-	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151220-SE200008-0000000-0000	PROCESO	5	704.99	M²	98	
SE20008 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	143,112.97	143,113.00	-	-	143,113.00	143,113.00	-	-	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-140220-SE200008-0000000-0000	PROCESO	5	704.99	M²	98	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	226,029.20	221,918.30	-	-	221,918.30	-	-	-	-	NO INICIADA	0	283.6	M²	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	76,288.40	76,288.40	-	-	76,288.40	-	-	-	-	NO INICIADA	0	283.6	M²	N/A	
N/A	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	778,977.36	738,643.10	-	-	738,643.10	-	-	-	-	NO INICIADA	0	876.24	M²	N/A	
N/A	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	155,094.48	155,094.48	-	-	155,094.48	-	-	-	-	NO INICIADA	0	876.24	M²	N/A	
SE200011 CP	PAVIMENTACION CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON EL PAV. HID)	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	295,963.83	288,640.59	-	-	288,640.59	288,640.59	-	-	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151220-SE200011-0000000-0000	TERMINADA	100	306.23	M²	43	
SE200011 CP	PAVIMENTACION CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON EL PAV. HID)	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	30,477.35	30,477.00	-	-	30,477.00	30,477.00	-	-	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-140220-SE200011-0000000-0000	TERMINADA	100	306.23	M²	43	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	780,051.70	752,360.97	-	-	752,360.97	-	-	-	-	NO INICIADA	0	902.69	M²	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	182,215.85	182,215.85	-	-	182,215.85	-	-	-	-	NO INICIADA	0	902.69	M²	N/A	
N/A	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE FRAY DIEGO DE GANTE Y MAGNOLIAS	FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	1,786,147.75	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	1941.54	M²	N/A	
N/A	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE FRAY DIEGO DE GANTE Y MAGNOLIAS	FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	303,533.90	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	1941.54	M²	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	536,288.56	515,605.33	-	-	515,605.33	-	-	-	-	NO INICIADA	0	620.57	M²	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	125,239.06	125,239.06	-	-	125,239.06	-	-	-	-	NO INICIADA	0	620.57	M²	N/A	

SUMA DE HOJA	-	6,007,826.76	3,828,488.73	-	-	3,828,488.73	1,061,123.24	-	-
SUBTOTAL	-	6,007,826.76	3,828,488.73	-	-	3,828,488.73	1,061,123.24	-	-
TOTAL	257,169.14	10,644,367.49	10,038,265.75	-	-	72,640.38	9,965,625.37	3,350,138.13	362,470.68

FORMULO  
**DR. RODRIGO ALEJANDRO MUIRES CASAVANTES**  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO  
**C.P. M.I. EMERANZ VERNANDEZ**  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
**JORGE ALEJANDRO SALAM DEL RALACIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
**ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES**  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo.Bo.  
**M. A. P. LUZ MARIA SANCAY AVITIA**  
 SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.  
**C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH ANILA LUCERO**  
 CONTRALORA MUNICIPAL





**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.**  
**PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL**  
**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020**  
**AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
N/A	SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																											
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	693,106.85	660,173.67	-	-	660,173.67	-	-	-	-	NO INICIADA	0	779.65	M²	N/A		
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	137,996.05	137,996.05	-	-	137,996.05	-	-	-	-	NO INICIADA	0	779.65	M²	N/A		
SE200016 CP	PAVIMENTACIÓN CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	86,688.12	338,443.79	334,008.04	-	-	334,008.04	334,008.04	86,688.12	86,688.12	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151220-SE200016-00000000-0000	PROCESO	25	393.33	M²	55		
SE200016 CP	PAVIMENTACIÓN CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	20,718.79	79,845.99	79,846.00	-	-	79,846.00	79,846.00	20,718.79	20,718.79	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-140220-SE200016-00000000-0000	PROCESO	25	393.33	M²	55		
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	258,267.85	271,995.50	-	-	271,995.50	-	-	-	-	NO INICIADA	0	324.05	M²	N/A		
N/A	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	87,169.45	87,169.45	-	-	87,169.45	-	-	-	-	NO INICIADA	0	324.05	M²	N/A		
N/A	5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL JOSE REVUELTAS	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	1,916,981.69	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	1974.93	M²	N/A		
N/A	5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL JOSE REVUELTAS	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	188,293.69	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	1974.93	M²	N/A		
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	314,168.53	301,908.99	-	-	301,908.99	-	-	-	-	NO INICIADA	0	389.57	M²	N/A		
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	101,113.09	101,113.09	-	-	101,113.09	-	-	-	-	NO INICIADA	0	389.57	M²	N/A		
SE200020 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	1,456,804.00	1,403,167.21	-	-	1,403,167.21	1,403,167.21	-	-	1-1235040002-999-00-1050101-2202-000-K05004005-6141-2-151220-SE200020-00000000-0000	PROCESO	2	1,539.79	M²	214		
SE200020 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	161,677.95	161,678.00	-	-	161,678.00	161,678.00	-	-	1-1235040002-999-00-1050101-2202-000-K05004005-6141-2-140220-SE200020-00000000-0000	PROCESO	2	1,539.79	M²	214		
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	337,499.97	-	-	337,499.97	-	-	-	-	NO INICIADA	0	347.96	M²	N/A		
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	89,297.48	-	-	89,297.48	-	-	-	-	NO INICIADA	0	347.96	M²	N/A		

SUMA DE HOJA	107,406.91	5,734,872.93	3,965,855.45	-	-	3,965,855.45	1,978,699.25	107,406.91	107,406.91
SUBTOTAL	107,406.91	11,742,699.69	7,794,344.18	-	-	7,794,344.18	3,039,822.49	107,406.91	107,406.91
TOTAL	364,576.05	16,379,240.42	14,004,121.20	-	-	13,931,480.82	5,328,837.38	469,877.59	469,877.59

FORMULÓ  
 DR. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ  
 C.P. Y M.I. SONIA ANNE FERNANDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
 JORGE ALEJANDRO SALIM DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL ELLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
 M. A. P. LUZ MARÍA SORIBAY AVTIA  
 SINDICA MUNICIPAL

Vo. Bo.  
 C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL																												
07.-CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS																												
NA	CICLOVÍA EN AV. JESUS GARCÍA DESDE LAUREANO RONCAL HASTA BLVD. FRANCISCO VILLA	VICTORIA DE DURANGO	NA	NA	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00							CANCELADA	NA	2,600.00	ML	NA		

SUMA DE HOJA	-	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	364,576.05	16,379,240.42	17,804,121.20	-	3,872,640.38	13,931,480.82	5,326,837.38	469,877.59	469,877.59																			

FORMULO  
ARG. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULO  
C.P. Y M.I. ERIN RIVERA HERNANDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PASADÓ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
M. A. P. LUZ MARÍA GONZÁLEZ AVITIA  
SINDICADA MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Gubernativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	\$ de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
<b>SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																											
SH20001 CP	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO (CALENTADORES SOLARES)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	VIV	2020	-	734,800.00	734,800.00	-	734,800.00	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	128	ACCION	128	
SH20002 CP	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO (REFRIGERADOR)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	VIV	2020	-	1,068,800.00	1,068,800.00	-	1,068,800.00	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	248	ACCION	248	
SH20003 CP	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DOMESTICO SISTEMAS DE AGUA (TINACO)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	VIV	2020	-	806,944.00	806,944.00	-	806,944.00	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	320	ACCION	320	

SUMA DE HOJA	-	2,610,544.00	2,610,544.00	-	2,610,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	2,610,544.00	2,610,544.00	-	2,610,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	364,576.05	18,989,784.42	20,414,665.20	-	6,483,184.38	13,931,480.82	5,328,837.38	469,877.59	469,877.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMULO  
  
MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA  
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FORMULO  
  
C.P. y M.L. ERIN JUDITH HERNÁNDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
JORGE ALEJANDRO SALAS DEL PALACIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
  
M.A.P. LUCÍA MARÍA GARIBAY AVITIA  
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
C.P. y M.L. MARTHA JUDITH MILA LUCERO  
CONTROLORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Gubernativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
<b>TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>																											
N/A	PAQUETE DE VIVOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		10,000.00									CANCELADA	N/A	30	PAQUETE	N/A	
N/A	GRANJAS INTEGRALES	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		250,000.00									CANCELADA	N/A	15	NAVE	N/A	
TG200006 PR	AVES DE TRASPATIO ZONA RURAL	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	112,500.00	600,000.00	460,000.00		85,000.00	375,000.00	375,000.00	336,675.00	336,675.00	K14009001-6321-2-151220-TG200006-0000000000000000	PROCESO	90	1,000	PAQUETE	500	
N/A	PAQUETE DE CERDOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		300,000.00									NO INICIADA	N/A	150	PAQUETE	N/A	
TG200002 PR	SEMILLA DE MAIZ EN ZONA SIERRA	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		640,000.00	705,000.00			705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	K14009001-6321-2-151220-TG200002-0000000000000000	TERMINADA	100	300	HECTAREAS	50	
N/A	APOYO AL CONTROL DE ENFERMEDADES DEL GANADO	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		250,000.00									CANCELADA	N/A	25	BAÑO DE INMERSION	N/A	
TG200006 PR	SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN ZONA RURAL	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		333,333.33	500,000.00		10,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	K14009001-6321-2-151220-TG200006-0000000000000000	TERMINADA	100	70	TONELADA	100	
N/A	CULTIVOS ESTRATEGICOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		333,333.33	425,000.00			425,000.00					NO INICIADA	N/A	20	HECTAREAS	N/A	
TG200008 PR	CULTIVOS ESTRATEGICOS EN POB CONTRERAS	POB CONTRERAS	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020							28,700.00	28,700.00	28,700.00	K14009001-6321-2-151220-TG200007-0000000000000000	TERMINADA	100	5	HECTAREAS	1	
TG200006 PR	CULTIVOS ESTRATEGICOS EN POB BELISARIO DOMINGUEZ	POB BELISARIO DOMINGUEZ	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020							28,700.00	28,700.00	28,700.00	K14009001-6321-2-151220-TG200006-0000000000000000	TERMINADA	100	5	HECTAREAS	1	
TG200051 PR	CULTIVOS ESTRATEGICOS (AGAVE)	POB UNIDOS VENCEREMOS	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020							112,600.00				PROCESO	50	4	HECTAREAS	5	
N/A	PROYECTOS PRODUCTIVOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		266,666.67	400,000.00		145,000.00	255,000.00					NO INICIADA	N/A	10.00	PROYECTO	N/A	
TG200058 PR	PROYECTO DE PANADERIA	POB EL ARENAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020							46,270.00	46,270.00	46,270.00	K14009005-6321-2-151220-TG200058-0000000000000000	TERMINADA	100	1.00	PROYECTO	5	
TG200059 PR	PROYECTO DE PANADERIA	POB RIO ESCONDIDO	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020							46,270.00	46,270.00	46,270.00	K14009005-6321-2-151220-TG200059-0000000000000000	TERMINADA	100	1.00	PROYECTO	5	
TG200090 PR	PROYECTO DE PANADERIA	POB PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020							42,460.00	42,460.00	42,460.00	K14009005-6321-2-151220-TG200090-0000000000000000	TERMINADA	100	1.00	PROYECTO	5	
TG200003 PR	PRODUCCION DE BIOFERTILIZANTE EN POB PILAR DE ZARAGOZA	POB PILAR DE ZARAGOZA	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020			170,000.00				170,000.00	170,000.00	170,000.00	K14009001-6321-2-151220-TG200003-0000000000000000	TERMINADA	100	1.00	PROYECTO	10	
N/A	PROYECTO DE BIO FERTILIZANTE	POB MORDILLO	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020					180,000.00	180,000.00					NO INICIADA	N/A	1.00	PROYECTO	N/A	
N/A	PROYECTO DE BIO FERTILIZANTE	POB JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS)	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020					180,000.00	180,000.00					NO INICIADA	N/A	1.00	PROYECTO	N/A	

SUMA DE HOJA	112,500.00	2,983,333.33	2,660,000.00	360,000.00	240,000.00	2,780,000.00	2,045,000.00	1,894,075.00	1,894,075.00
SUBTOTAL	112,500.00	2,983,333.33	2,660,000.00	360,000.00	240,000.00	2,780,000.00	2,045,000.00	1,894,075.00	1,894,075.00
TOTAL	477,076.05	25,455,117.76	26,556,665.20	360,000.00	10,205,184.38	16,711,480.82	7,373,837.38	2,363,952.59	2,363,952.59

FORMULO: C. VALENTE PALOMARES DEL FIN, DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULO: C.P. y M.I. ERIKA RUIZ, DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. B: ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES, COORDINADOR GENERAL DEL DESARROLLO

Vo. B: M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA, SINDACO MUNICIPAL

Vo. B: C.P. y M.I. MARTHA JUDITH VILA LUCERO, CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Operativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
<b>TG - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>																											
TG200021 PR	SEMILLA DE AVENA	ZONA SIERRA	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		750,000.00	600,000.00			600,000.00	600,000.00	600,000.00		1-1237020001-999-00-1140101-2202-000-K14000001-6321-2-151220-TG200021-0000000000	TERMINADA	100	50.00	TONELADA	100	
TG200003 PR	INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN ZONA RURAL	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		100,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1-1237020001-999-00-1140101-2202-000-K14000002-6321-2-151220-TG200003-0000000000	TERMINADA	100	100.00	CABEZA	10	
TG200001 PR	EQUIPO DE NIVELACION EN MODULO DE RIEGO III	MODULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		166,666.67	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1-1237020001-999-00-1140101-2202-000-K14000001-6321-2-151220-TG200001-0000000000	TERMINADA	100	1.00	EQUIPO	10	
N/A	SEMENTALES	POB SAN BENITO	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020			100,000.00			100,000.00					NO INICIADA	N/A	20.00	CABEZA	N/A	
N/A	DESAROLVE DE DREN	POB CINCO DE MAYO	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020			170,000.00			170,000.00					NO INICIADA	N/A	1.00	OBRA	N/A	
N/A	OBRA POR DEFINIR	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020			120,000.00		120,000.00						CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUMA DE HOJA	-	1,016,666.67	1,340,000.00	-	170,000.00	1,170,000.00	900,000.00	900,000.00	300,000.00
SUBTOTAL	112,500.00	4,000,000.00	4,000,000.00	360,000.00	410,000.00	3,950,000.00	2,945,000.00	2,794,075.00	2,194,075.00
TOTAL	477,076.05	26,471,784.42	27,896,665.20	360,000.00	10,375,184.38	17,881,480.82	8,273,837.38	3,263,952.59	2,663,952.59

FORMULO  
C. VALDERRAMA PALOMARES DELFIN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULO  
C.P. Y M.I. FRANKY GUERRERO  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
JORGE ALEJANDRO SALUN DEL PALACIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
ING. TERNERIS VILLARREAL FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA  
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
CONTROLORA MUNICIPAL



DURANGO

**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (002)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
ESPACIOS PÚBLICOS																											
PARQUES																											
00200006 CP	FUENTE DE LOS DELFINES (2da ETAPA)	VICTORIA DE DURANGO	NA	NA	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020		1,274,562.59	1,274,562.59		349,079.52	925,483.07	925,483.07	224,369.30	224,369.30	1-1235900003-999-00-1050101-2202-000-005012000-6191-2-151220-00200006-00000000-0000	Proceso	85	1	OBRAS	654,675	

SUMA DE HOJA	-	1,274,562.59	1,274,562.59	-	349,079.52	925,483.07	925,483.07	224,369.30	224,369.30
SUBTOTAL	-	1,274,562.59	1,274,562.59	-	349,079.52	925,483.07	925,483.07	224,369.30	224,369.30
TOTAL	477,076.05	27,746,347.01	29,171,227.79	360,000.00	10,714,263.90	18,806,963.89	9,199,320.45	3,488,321.89	2,888,344.99

FORMULO  
  
 ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJERES DE SALVANTES  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO  
  
 C.P. y M. ERICKA RUIZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 JORGE ALEJANDRO SALAS DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
  
 M. A. P. LUZ MARIA GUZMAN AVITIA  
 SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C.P. y M. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	\$ de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
<b>SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																											
N/A	AUTOFINANCIAMIENTO POPULAR	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	VIV	2020	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	1,402	ACCION	N/A	
N/A	AUTOFINANCIAMIENTO POPULAR	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MEZCLA	BENEFICIARIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	VIV	2020	-	2,232,000.00	2,232,000.00	-	2,232,000.00	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	1,402	ACCION	N/A	

SUMA DE HOJA	-	3,482,000.00	3,482,000.00	-	3,482,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	6,092,544.00	6,092,544.00	-	6,092,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	364,576.05	22,471,784.42	23,896,665.20	-	9,965,184.38	13,931,480.82	5,328,837.38	469,877.59	469,877.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMULO  
  
 ING. JORGE FLORES HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

FORMULO  
  
 A.P. M.L. ERWAN RUIZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 JORGE ALEJANDRO SALINAS PALACIOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
  
 M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA  
 SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C.P. Y.M.I. MARTHA JUDITH VILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
SE200058 CP	MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO)	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	NA	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	AD	URB	2020		7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	6,999,845.09	1,605,196.10	1,093,335.10	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-2411-2-151220-SE200058-0000000-0000 1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-2411-2-151220-SE200058-0000000-0000 1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-2411-2-151220-SE200058-0000000-0000	PROCESO	31.50	61,454.70	MP	256,500	
SE200043 CP	MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE SLURRY - SEAL	VICTORIA DE DURANGO	NA	NA	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	AD	URB	2020		2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	1,997,377.47	1,682,439.15	1,682,439.15	1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-2411-2-151220-SE200043-0000000-0000 1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-2411-2-151220-SE200043-0000000-0000 1-1235040002-999-00-1050101-2201-000-K05004005-2411-2-151220-SE200043-0000000-0000	PROCESO	89	23,150.35	MP	256,500	
SE200066 CP	MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO)	VICTORIA DE DURANGO	NA	NA	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	AD	URB	2020			2,010,498.00			2,010,498.00	2,010,385.12				NO INICIADA	0	9,996.00	MP	256,500	

SUMA DE HOJA	-	9,000,000.00	11,010,498.00	-	-	11,010,498.00	11,007,407.68	3,287,635.25	2,775,774.27
SUBTOTAL	-	9,000,000.00	11,010,498.00	-	-	11,010,498.00	11,007,407.68	3,287,635.25	2,775,774.27
TOTAL	477,076.05	36,746,347.01	40,181,725.79	360,000.00	10,724,263.90	29,817,461.89	20,706,928.13	6,775,957.14	5,644,096.44

FORMULO  
  
 ARQ. RODRIGO ALEJANDRO NIEVES CASAVANTES  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO  
  
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH LUCERO  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 JORGE ALEJANDRO SALIM DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL OCLABEM

Vo. Bo.  
  
 M.A. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA  
 SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL





**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuentas Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
FRESADOS																												
SE200063 CP	FRESADO CIRCUITO INTERIOR ENTRE IXTLIXOCHTL Y NAZAS	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	C	URB	2020	-	-	2,077,771.00	-	-	2,077,771.00	2,077,771.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	6,376.27	M²	25,500	
SE200063 CP	FRESADO CIRCUITO INTERIOR ENTRE IXTLIXOCHTL Y NAZAS	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	C	URB	2020	-	-	323,229.00	-	-	323,229.00	323,229.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	6,376.27	M²	25,500	
SE200064 CP	FRESADO DE CRUCERO 5 DE FEBRERO Y CALLE NAZAS, COLS GULLERMINA Y BUROCRATA	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	C	URB	2020	-	-	1,095,568.00	-	-	1,095,568.00	1,095,568.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	3,348.58	M²	22,500	
SE200064 CP	FRESADO DE CRUCERO 5 DE FEBRERO Y CALLE NAZAS, COLS GULLERMINA Y BUROCRATA	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	C	URB	2020	-	-	170,432.00	-	-	170,432.00	170,432.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	3,348.58	M²	22,500	
SE200065 CP	FRESADO DE LA AVE ENRIQUE CARROLA ANTUNA ENTRE ANTONIO NORMAN FUENTES HASTA TOPAR CON PAV DE CONCRETO HID COLS GENARO VAZQUEZ VALLE DEL GUADANA Y JARDINES DE CANCUN	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	C	URB	2020	-	-	816,163.00	-	-	816,163.00	816,163.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	2,293.84	M²	15,600	
SE200065 CP	FRESADO DE LA AVE ENRIQUE CARROLA ANTUNA ENTRE ANTONIO NORMAN FUENTES HASTA TOPAR CON PAV DE CONCRETO HID COLS GENARO VAZQUEZ VALLE DEL GUADANA Y JARDINES DE CANCUN	CD VICTORIA DE DURANGO	NA	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	C	URB	2020	-	-	126,966.00	-	-	126,966.00	126,966.00	-	-	-	-	NO INICIADA	0	2,293.84	M²	15,600	

SUMA DE HOJA	-	-	4,610,129.00	-	-	4,610,129.00	4,610,129.00	-	-
SUBTOTAL	-	-	4,610,129.00	-	-	4,610,129.00	4,610,129.00	-	-
TOTAL	477,076.05	36,746,347.01	44,791,854.79	360,000.00	10,724,263.90	34,427,590.89	24,817,057.13	6,775,957.14	5,664,296.14

FORMULO  
  
 ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO  
  
 C.F. y M.I. ERICK ALFONSO BERNABEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
 JORGE ALEJANDRO SALON DEL PALACIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES  
 COORDINADOR GENERAL DEL OPLABEM

Vo. Bo.  
  
 M. A. P. LUZ MARIE BARIBAY AVITA  
 SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
  
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Fisico %	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
<b>OBRAS DIVERSAS</b>																												
00200001 CP	PROGRAMA DE ECONOMIA SOCIAL	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	OP	2020	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	100	ACCION	100	
00200002 CP	EDUCACION NUTRICIONAL	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	OP	2020	-	230,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	30	TALLER	750	
00200003 CP	EDUCACION FINANCIERA	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	OP	2020	-	56,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	12	TALLER	300	
00200004 CP	SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	OP	2020	-	230,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	30	TALLER	750	
00200005 CP	COHESION SOCIAL	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	OP	2020	-	59,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	0	12	TALLER	300	

SUMA DE HOJA	-	1,577,080.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	1,577,080.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	477,076.05	38,323,427.01	45,791,854.79	360,000.00	11,724,263.90	34,427,590.89	24,817,057.13	6,775,957.14	5,664,679.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMULO  
MANUEL DE LA PENA DE LA PARRA  
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FORMULO  
C.P. Y M.A. ERICA ROSA PÉREZ MORALES  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
ING. HERIBERTO SALARRIÁN FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA  
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C.P. Y M.L. MARTHA JHYNTH VILA LUCERO  
CONTRALORA MUNICIPAL

**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico %	Metas		Población	Observaciones
																								Cantidad	Unidad de Medida		
OBRAS DIVERSAS																											
00200007 CP	TUNEL PEATONAL "EL DURANGUÉN" AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN	BLVD ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO CRUCE AV DE LA NORMAL, VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	URB	2020		508,934.74				508,934.74	508,934.74				TERMINADA	100	1	OBRA	456,500	

SUMA DE HOJA	-	-	508,934.74	-	-	508,934.74	508,934.74	-	-
SUBTOTAL	-	1,577,080.00	1,508,934.74	-	1,000,000.00	508,934.74	508,934.74	-	-
TOTAL	477,076.05	38,323,427.01	46,300,789.53	360,000.00	11,774,263.90	34,936,525.63	25,325,991.87	6,775,957.14	5,664,055.14

FORMULO  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULO  
C.P. Y M.I. ENRIQUE PERAZA  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
JORGE ALEJANDRO SALIN DEL PALACIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.  
ING. HERIBERTO DELARREAL FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.  
M. A. P. LUZ MARÍA GARRIBAY AVITIA  
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.  
C.P. Y M.I. MARTHA JUDETA LUCERO  
CONTRALORA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2020  
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.  
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL  
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020  
AL 31 DE DICIEMBRE**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Estado de la Obra	Avance Físico	Metas		Población	Observaciones	
																								Cantidad	Unidad de Medida			
<b>FONDO MINERO</b>																												
N/A	PUESTAS DEL SOL, ENTRE BUENOS AIRES Y ARROYO SECO	COL. MANUEL GÓMEZ MORIN	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FDRS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	M²		N/A	
N/A	LOS TRUENOS ENTRE AV. LA SALLE Y ALAMOS	COL. EL SALTITO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FDRS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	9,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	M²		N/A	
N/A	ARBOLEDAS, ENTRE SAN MANUEL Y SAN MARCOS	COL. SAN MIGUEL	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FDRS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	6,314,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	M²		N/A	
N/A	BUENOS AIRES, ENTRE ARBOLEDAS Y PUESTA DEL SOL	COL. SAN MIGUEL	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FDRS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	6,864,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	M²		N/A	
N/A	CIRCUITO INTERIOR, ENTRE TURQUESA Y LIC. OSCAR ZARZOZA	FRACC. REFORMA	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FDRS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	4,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	M²		N/A	
N/A	MELCHOR OCAÑO, ENTRE BATALLA DE PUEBLA Y FRANCISCO ZARCO	POB. 5 DE MAYO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FDRS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	1,530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CANCELADA	N/A	M²		N/A	

SUMA DE HOJA	-	30,118,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	30,118,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	477,076.05	68,441,547.01	46,300,789.53	360,000.00	11,724,263.90	34,936,525.63	25,325,991.87	6,775,957.14	5,664,091.11																									

FORMULO

*[Signature]*

ARO. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CAJAYANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULO

*[Signature]*

C.P. M. I. ERMA SANCHEZ PEREZ  
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

*[Signature]*

JORGE ALEJANDRO SALIN DEL PALACIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

ING. HERIBERTO VICARREAL FLORES  
COORDINADOR GENERAL DEL CDPLADEM

Vo. B.

*[Signature]*

M. A. P. LUZ MARI GARRIBAY AVITIA  
SINDICO MUNICIPAL

Vo. B.

*[Signature]*

C.P. Y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO  
CONTRALORA MUNICIPAL

**5**

# **ANEXO FOTOGRAFICO**




# **FISM - 2020**





**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**

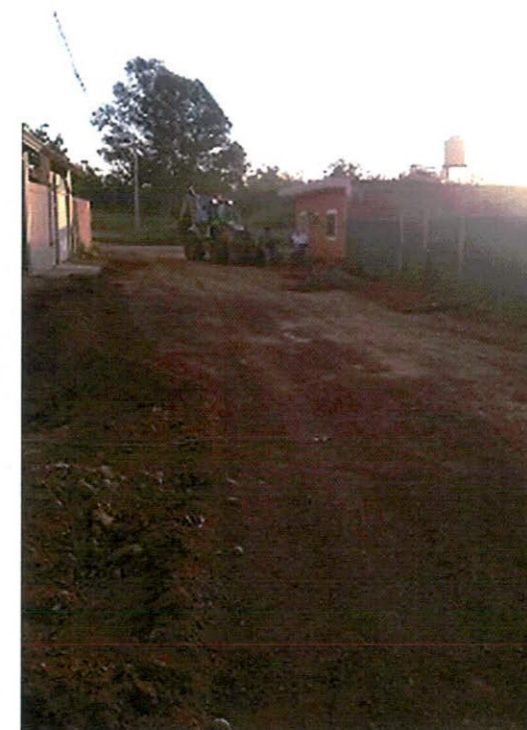

**COL. CERRO DE LAS ROSAS Y MIRADOR**

**RICARDO FLORES MAGON ENTRE 5 DE FEBRERO Y UNIDOS VENDEREMOS  
COL. ISABEL ALMANZA**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



**CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN**



**ENRIQUE CARROLA ANTUNA FRENTE A CURE**








**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**RED DE ALCANTARILLADO**



MUNICIPIO DE  
**DURANGO**



**COL. LOS MIRELES**

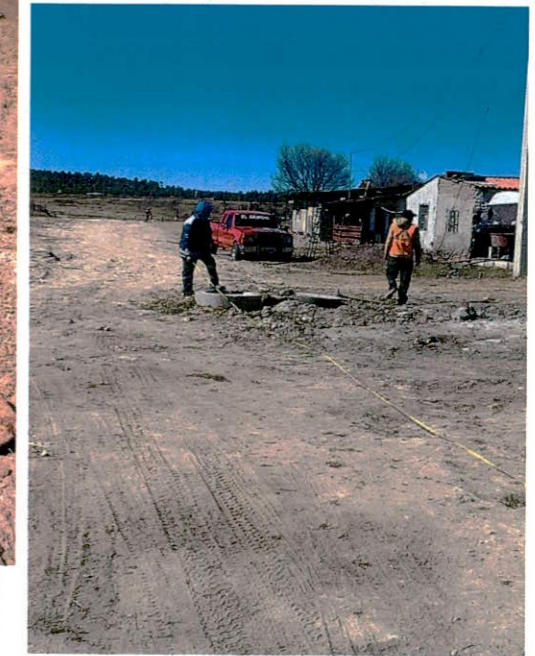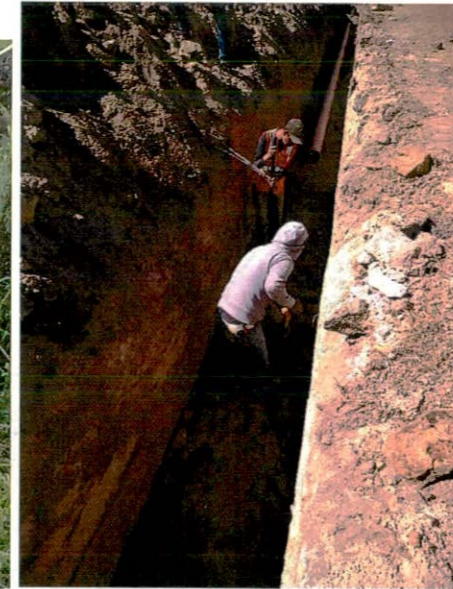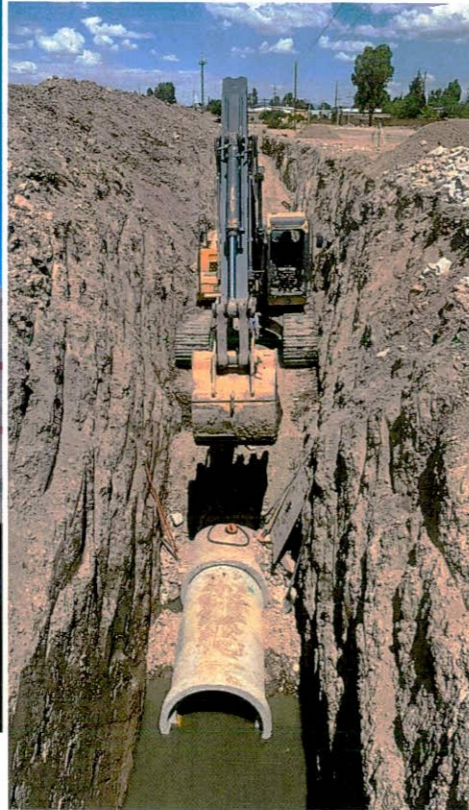


**POB. LLANO GRANDE**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

## FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 GUARNICIONES Y BANQUETAS

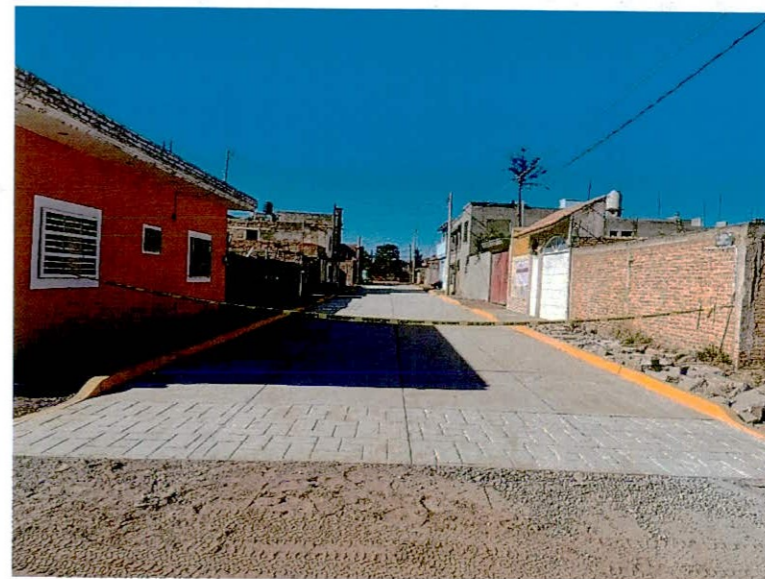

**RANCHO GRANDE ENTRE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROL. AVE. LAS ROSAS  
COL. MASIE**






**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

**ALUMBRADO PÚBLICO**

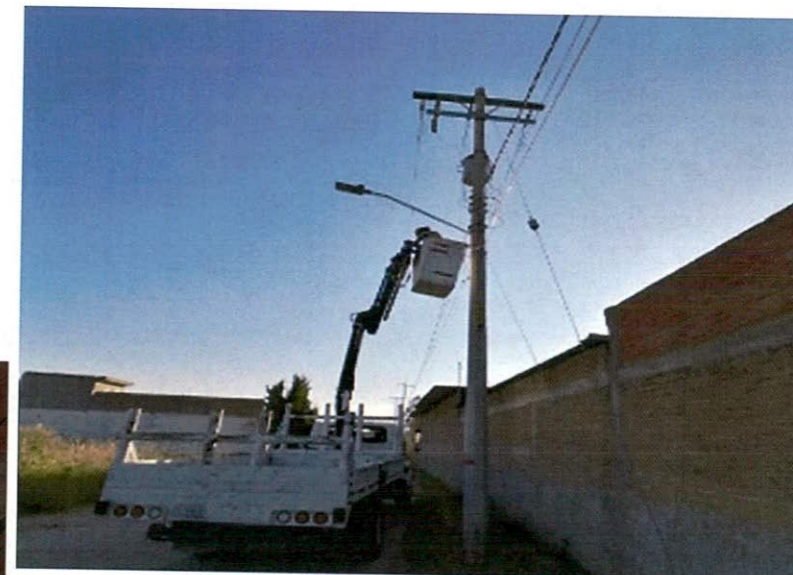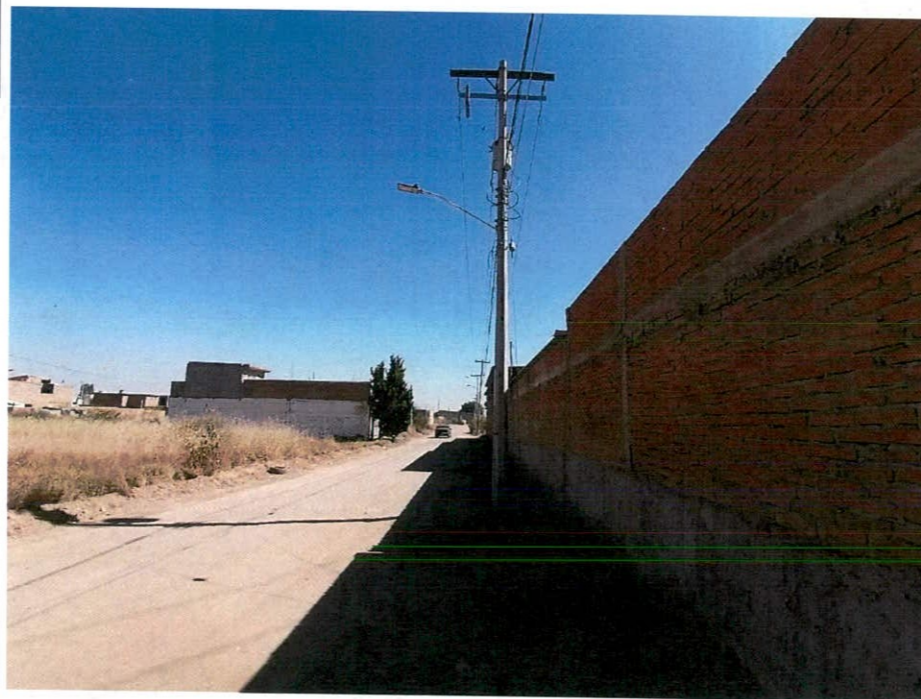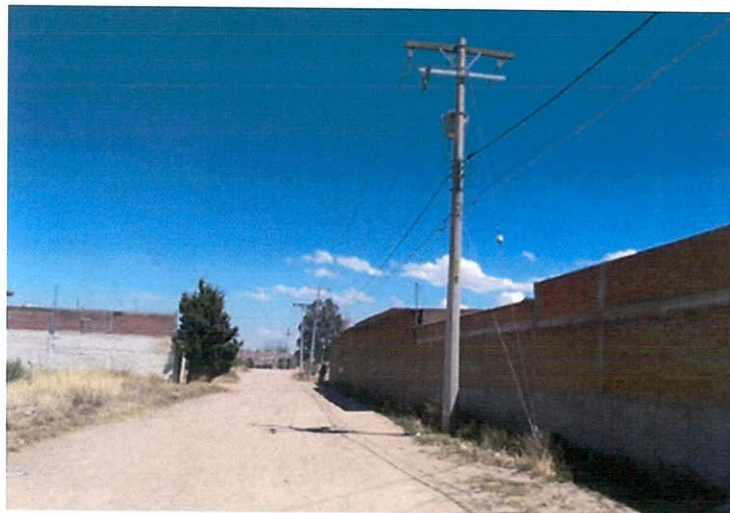


**COL. VALLE VERDE SUR**



**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**PAVIMENTACIÓN DE CALLES**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

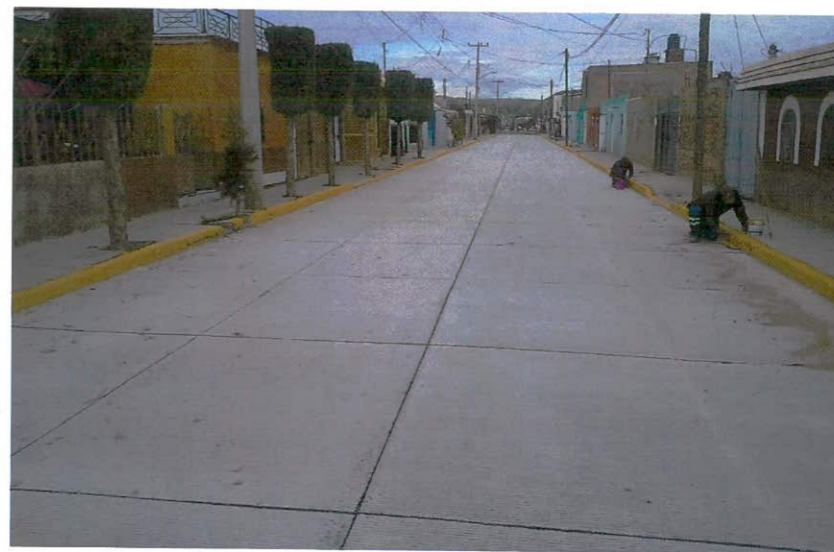


**MANZANERA DEL CAMPO ENTRE EDUARDO HERNÁNDEZ Y JOAQUÍN G. MARTÍNEZ**  
**COL. HÉCTOR MAYAGOYTIA**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**ESPACIO MULTIDEPORTIVO**  
**"COSTURERO"**



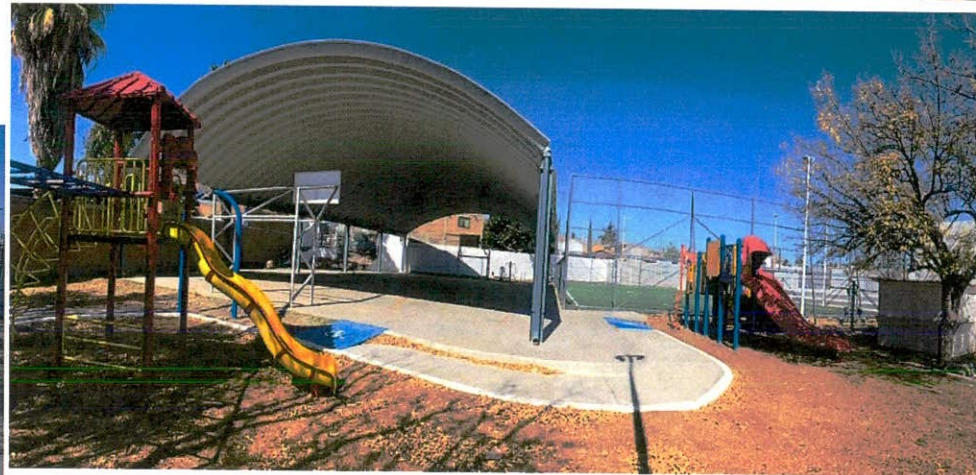


**COL. BENJAMIN MÉNDEZ**



# FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

## ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

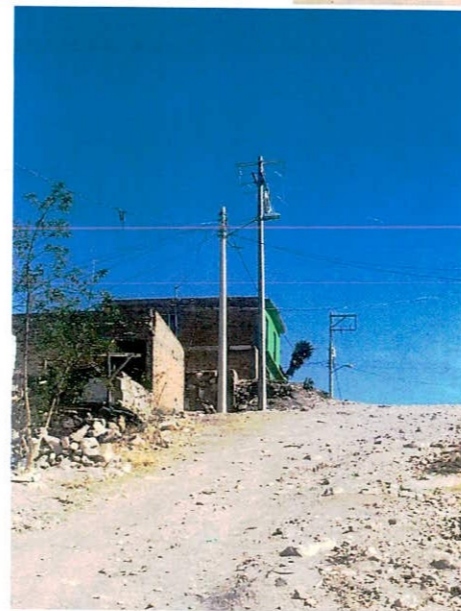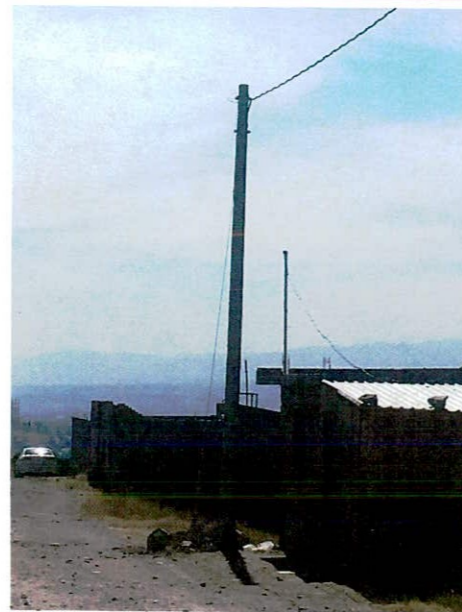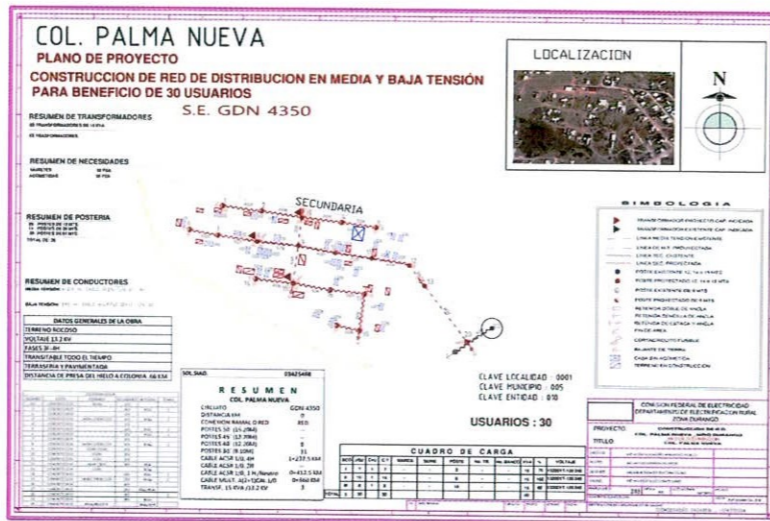

**Ampliación de Red Eléctrica  
COL. PALMA NUEVA**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

***“Cuarto Dormitorio”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO




**CONSTRUCCIÓN DE 354 OBRAS**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

***“Cuarto para Baño Completo”***

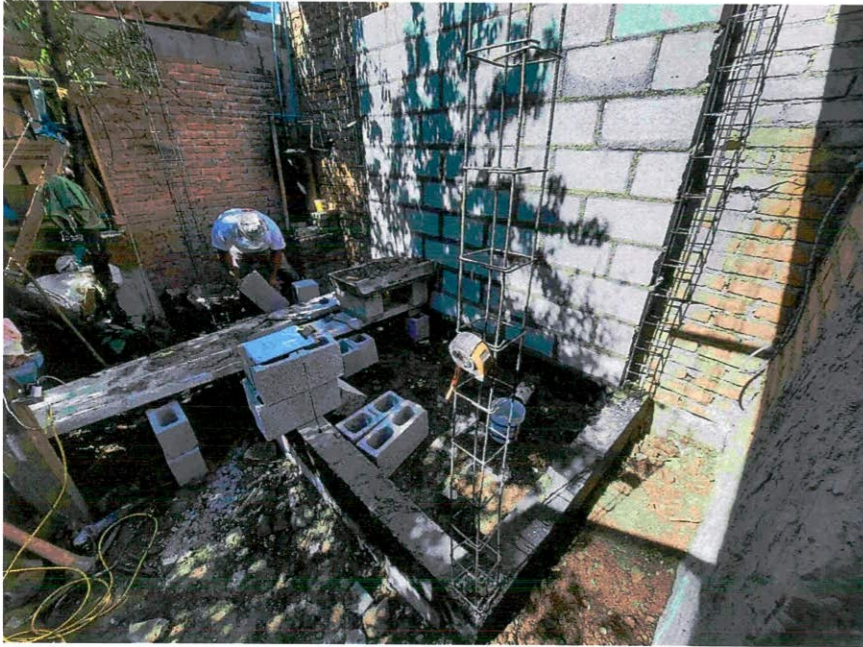

**CONSTRUCCIÓN DE 44 OBRAS**






**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

***“Techo Firme”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO

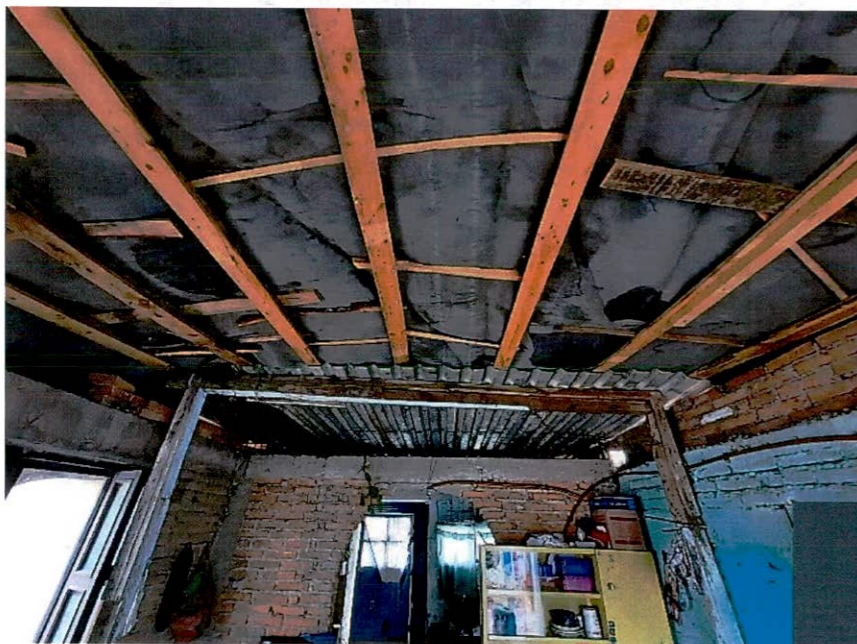

**CONSTRUCCIÓN DE 98 OBRAS**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

***“Techo Firme (Lámina)”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO



**INSTALACIÓN DE 37 ACCIONES**





**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

***“Piso Firme”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO

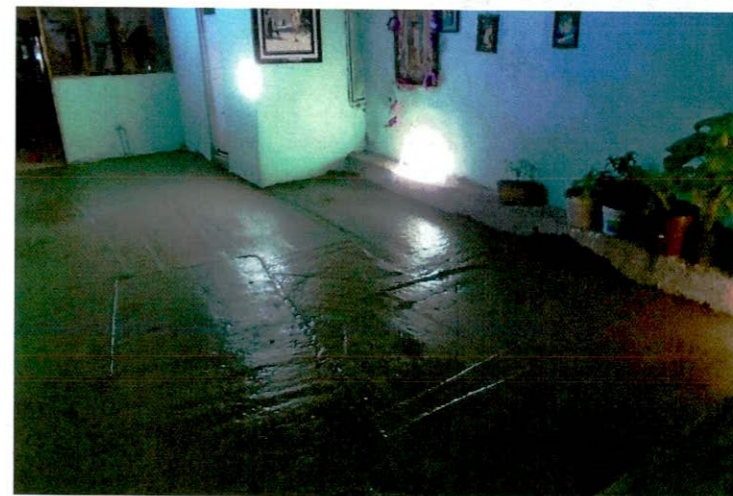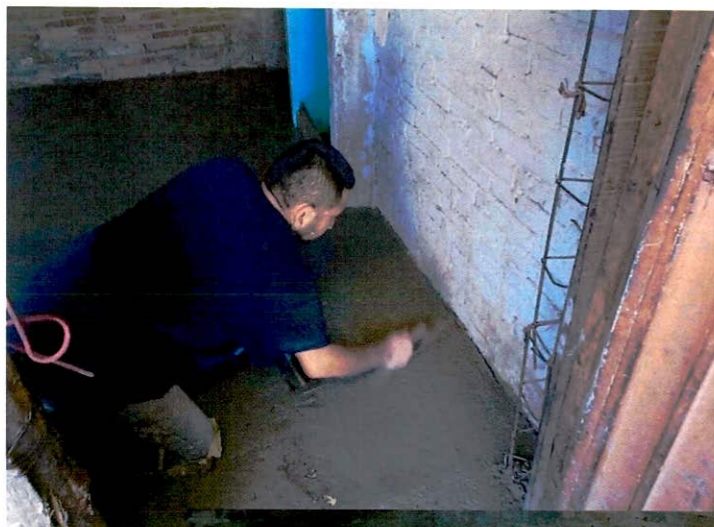

**CONSTRUCCIÓN DE 10, 245.88 M<sup>2</sup>**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

***“Calentadores Solares”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO



**INSTALACIÓN DE 339 ACCIONES**




FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

*“Construcción de Aula”*




MUNICIPIO DE  
DURANGO

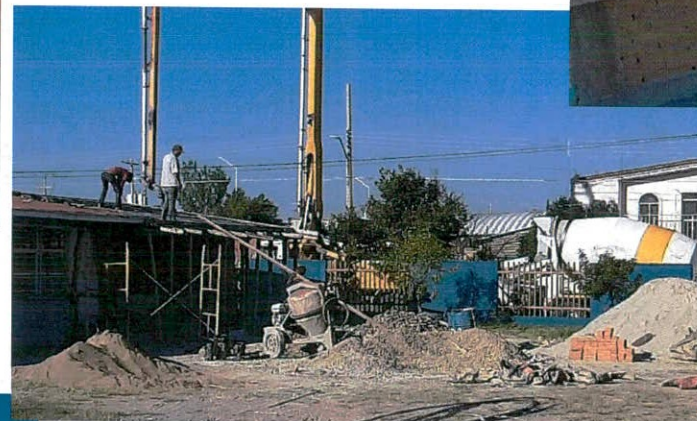

**ESC. PRIM. "12 DE OCTUBRE"  
POB. CRISTOBAL COLON**



**ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA"  
COL. JARDINES DE CANCÚN**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**

***“Construcción de Cancha de Usos Múltiples”***



**ESC. PRIM. “NELLIE CAMPOBELLO”**  
**FRACC. SANTA AMELIA**




**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



**INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**

***“Construcción de Bardas Perimetrales”***

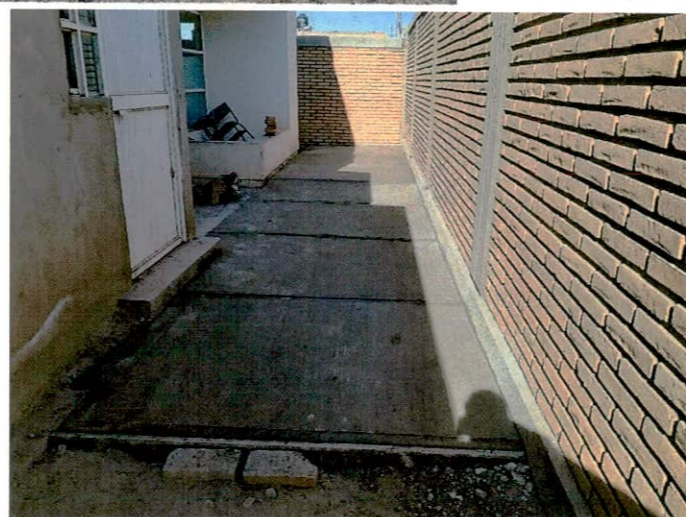



**ESC. PRIM "HÉROES DE LA REVOLUCIÓN"**  
**COL. LEGISLADORES**



FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

*“Instalación de Bebederos”*

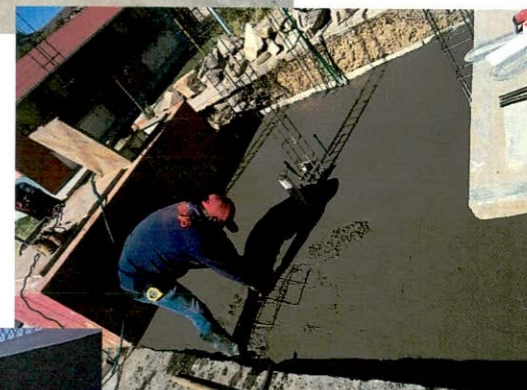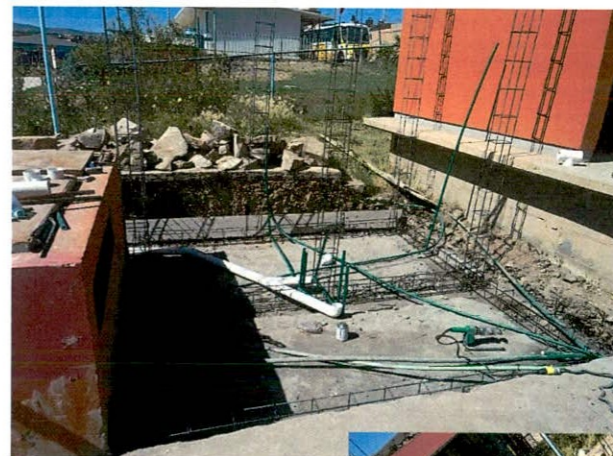

ESC. PRIM. “BICENTENARIO DE LA “INDEPENDENCIA  
COL. IGNACIO ZARAGOZA

J. N. “MARÍA LUISA ROSS LANDA”  
COL. LEGISLADORES







**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**


***“Construcción de Comedor”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO

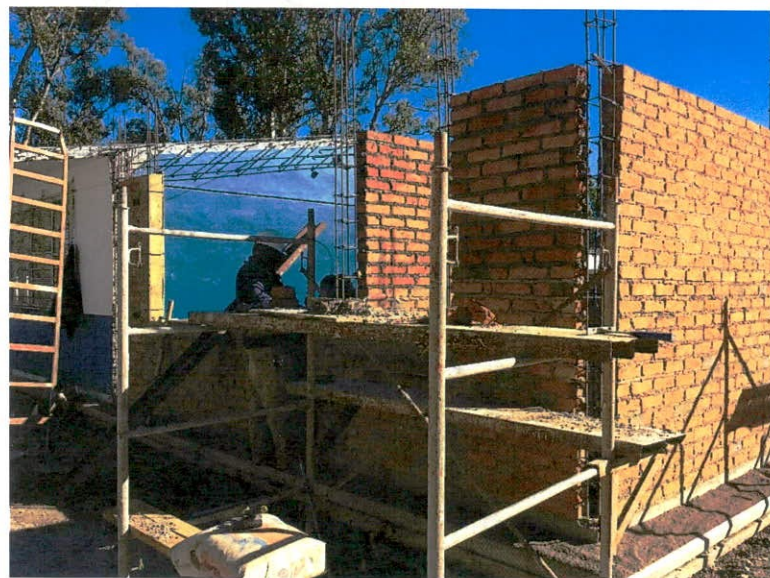

**ESC. PRIM. "LÁZARO CARDENAS"  
COL. LÓPEZ PORTILLO**

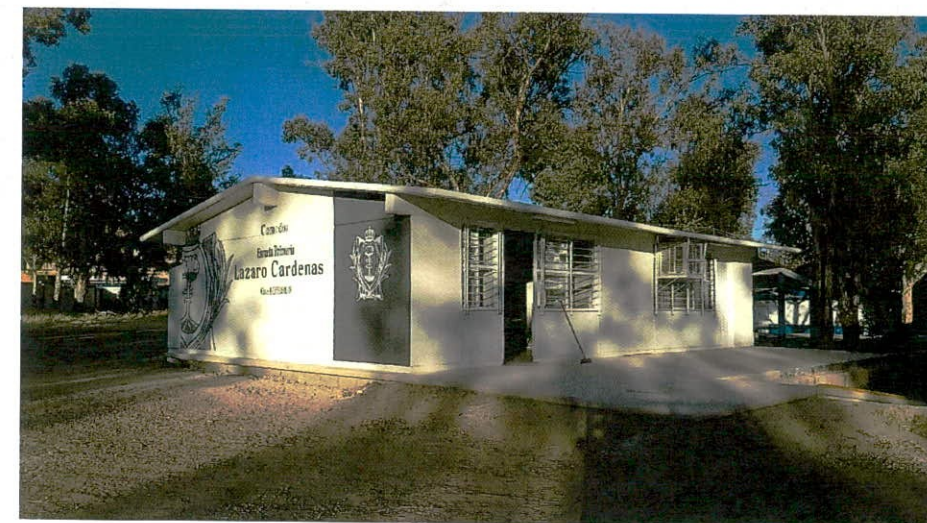




FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

*“Equipamiento de Comedor”*

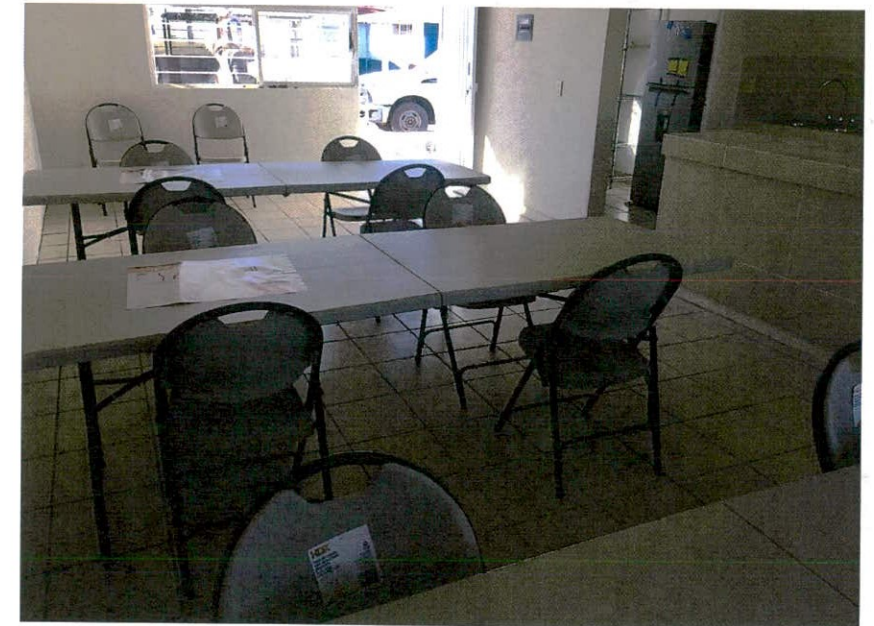

ESC. PRIM. "LÁZARO CARDENAS"  
COL. LOPEZ PORTILLO



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**

***“Línea de Conducción”***





**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**

***“Equipamiento de Pozo”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO



**POB. BOCA DEL MEZQUITAL**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**

***“Tanques de Almacenamiento”***



**POB. EMPALME PURISIMA**



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**


***“Bordos de Abrevadero”***



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO**



**REHABILITACIÓN DE BORDO**

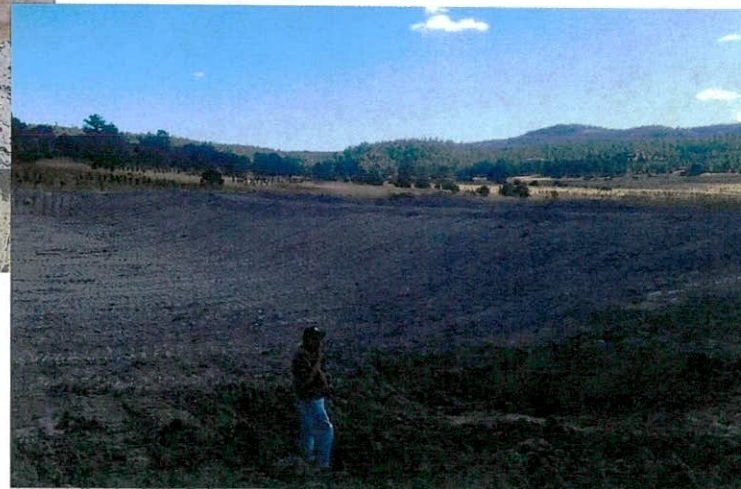




**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**

***“Rehabilitación de Presa”***

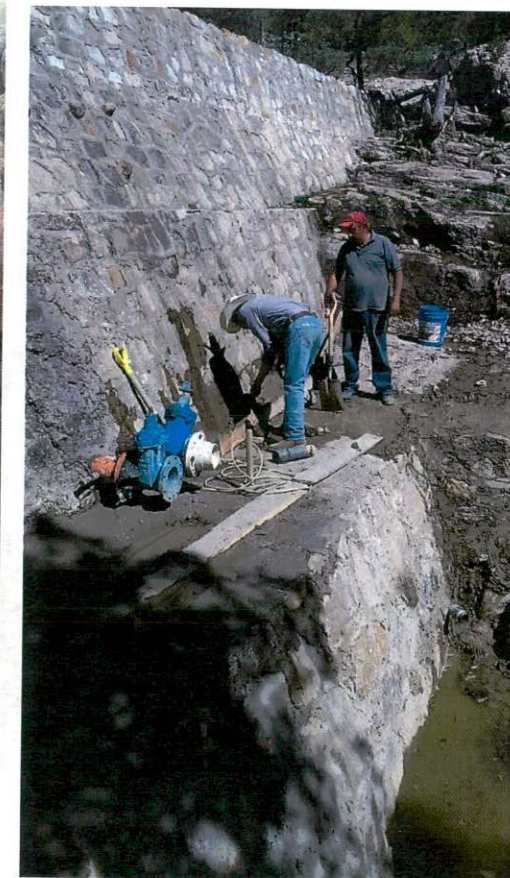



**FISM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**



**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**  
***“Rehabilitación de Caminos Saca cosechas”***



**POB. RODRÍGUEZ PUEBLA**








**FISM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**CAMINOS RURALES**  
***“Rastreo de Caminos”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO

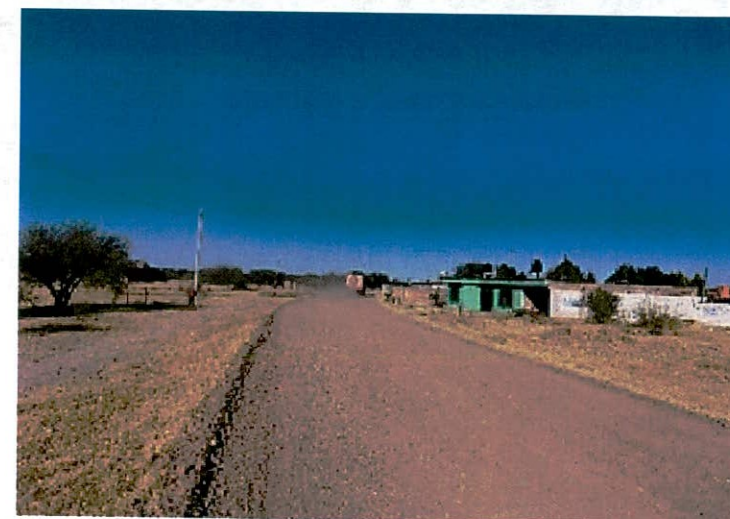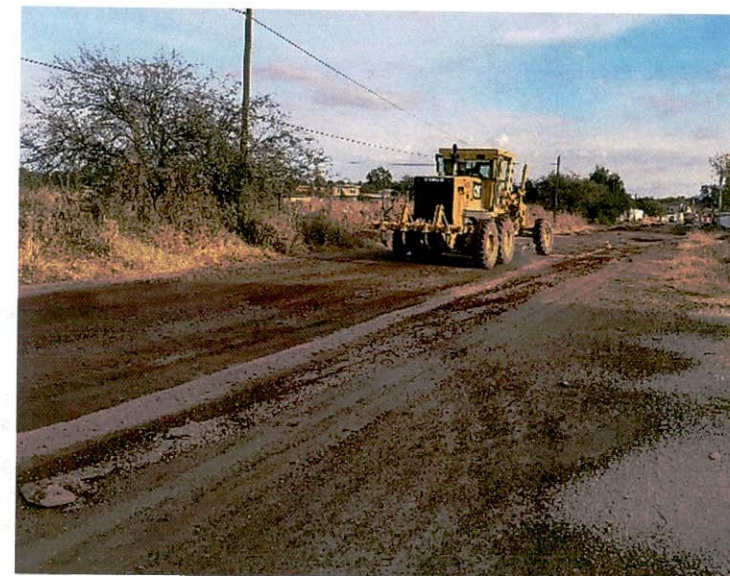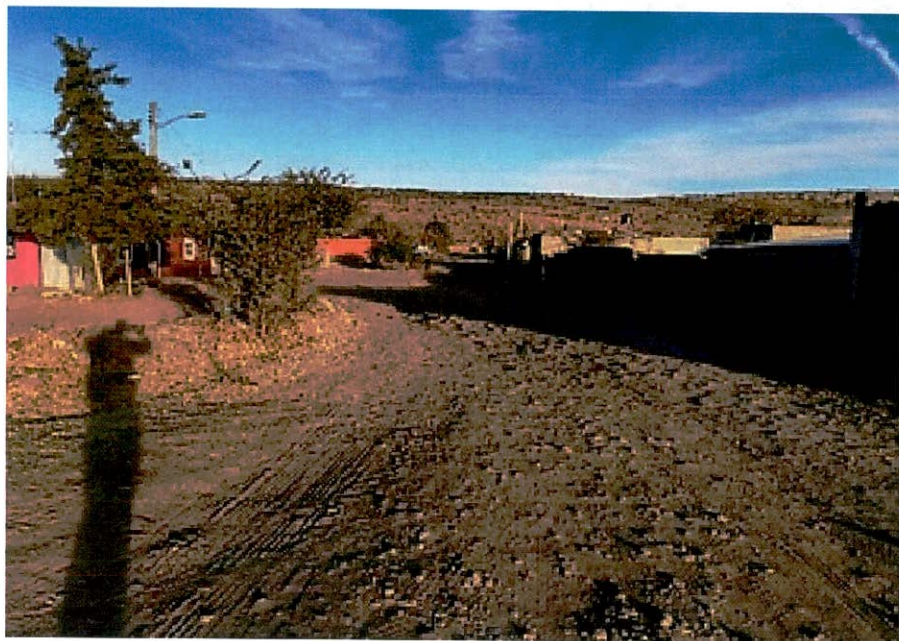


**BELISARIO DOMINGUEZ - FRANCISCO VILLA VIEJO - POBLADO FRANCISCO VILLA NUEVO**  
**POB. BELISARIO DOMINGUEZ**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

# PNM - 2020






**PNM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

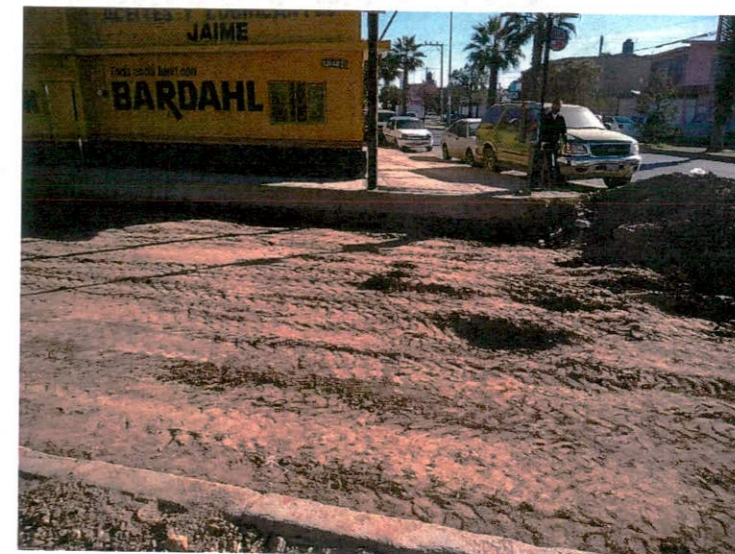


**GLORIA MARÍN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON PAV. HID.)  
COL. VALLE DEL GUADIANA**



**PNM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**


**ALCANTARILLADO**

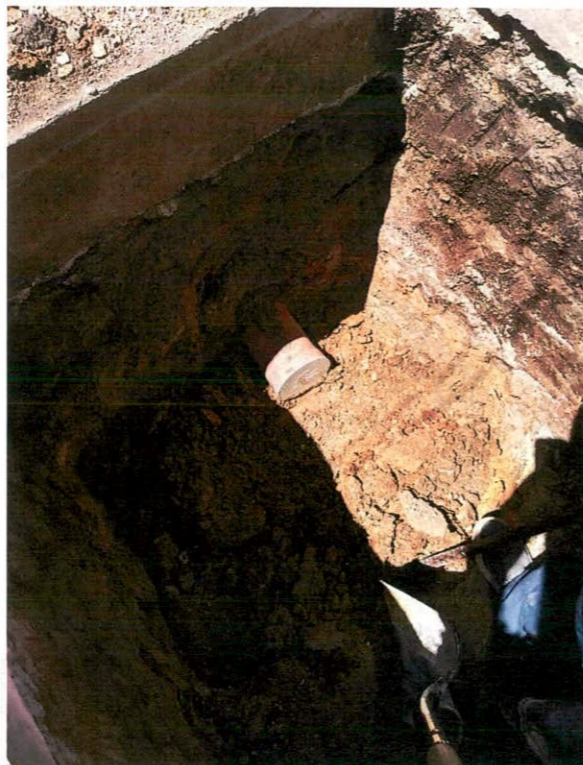

**GLORIA MARÍN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON PAV. HID.)  
COL. VALLE DEL GUADIANA**



**PNM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**GUARNICIONES Y BANQUETAS**


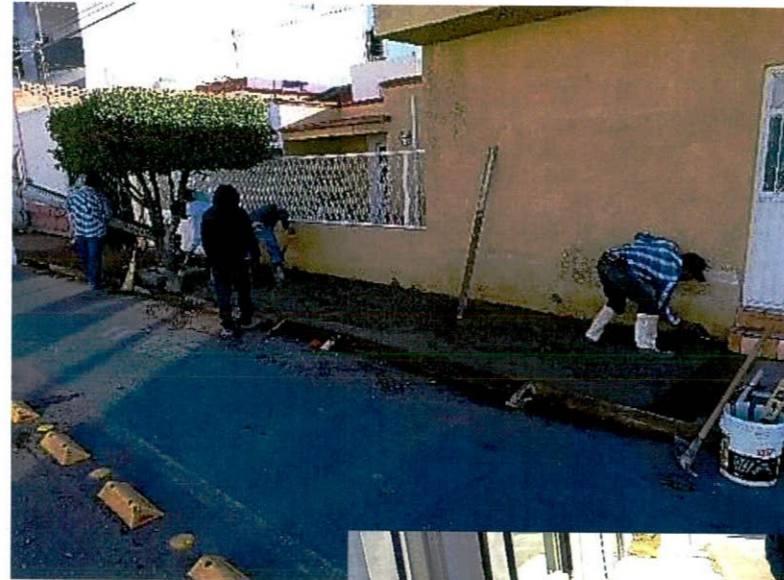


**BANQUETAS EN LA CALLE LAUREANO RONCAL**



MUNICIPIO DE  
DURANGO

**PNM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**PAVIMENTACIÓN DE CALLES**

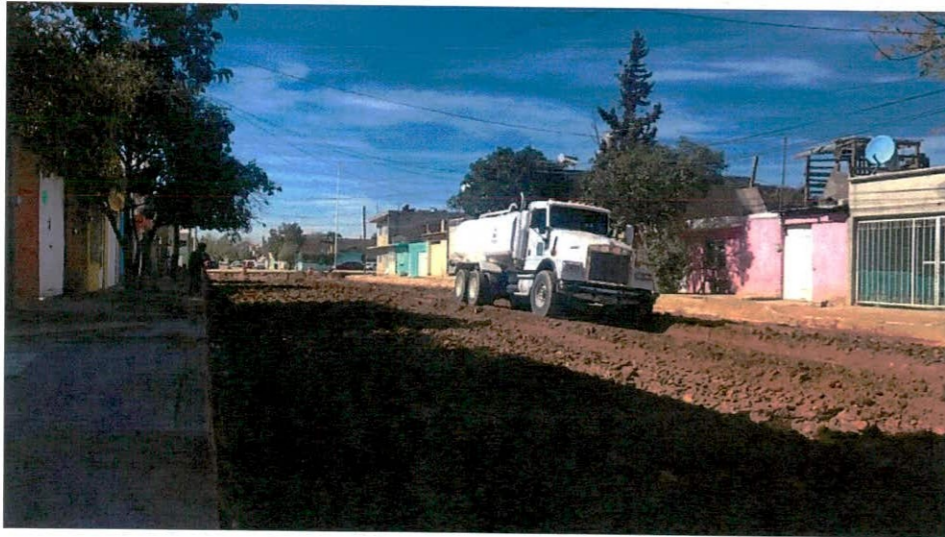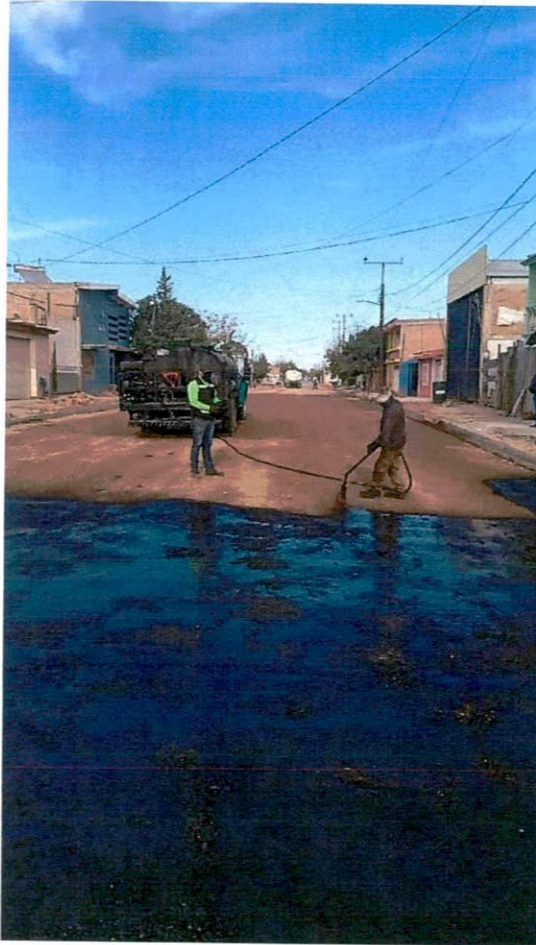

**DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II**  
**COL. JOSE ANGEL LEAL**



**PNM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**MANTENIMIENTO VIAL**



MUNICIPIO DE  
DURANGO



**TIRO DE SLURRY**



**PNM**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**  
**MANTENIMIENTO VIAL**



MUNICIPIO DE  
DURANGO




**BACHEO**





# "EL DURANGUEÑO"

## PNM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

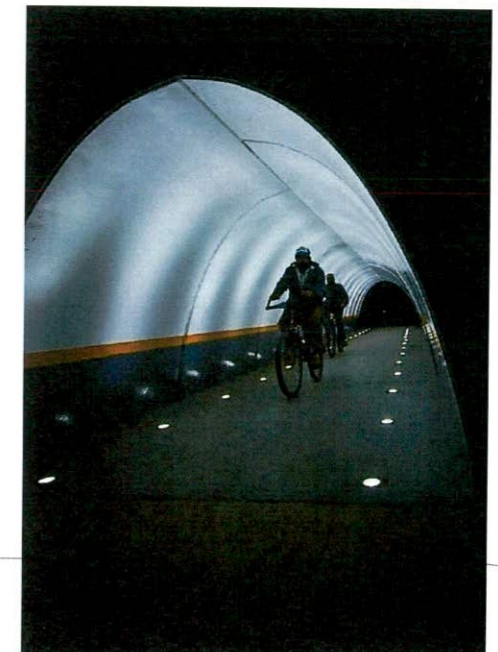

CONSTRUCCIÓN DE TUNEL PEATONAL



**PNM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**



***“Equipo de Nivelación”***



***“Producción de Biofertilizante”***



***“Cultivos Estratégicos”***



**MÓDULO DE RIEGO GUADALUPE  
VICTORIA**

**POB. PILAR DE ZARAGOZA**

**POB. BELISARIO  
DOMINGUEZ**



PNM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



*“Semilla de Maíz”*



*“Suplemento Alimenticio”*




*“Semilla de Avena”*



ZONA SIERRA



ZONA RURAL

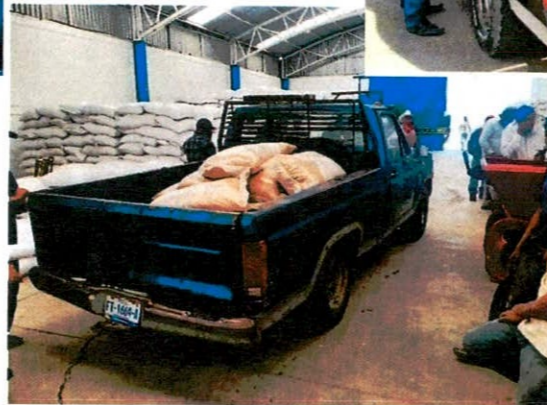

ZONA SIERRA




**PNM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**


**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**



***“Aves de Traspatio”***



***“Inseminación Artificial”***

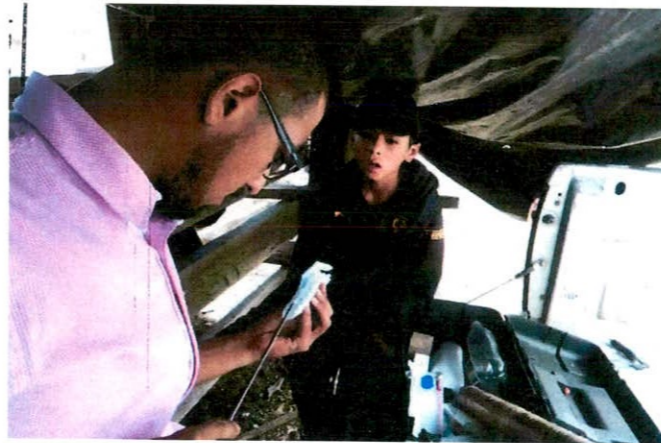

**ZONA RURAL**



**PNM  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**

***“Proyectos Panadería”***



MUNICIPIO DE  
DURANGO



**POB. RIO ESCONDIDO**



**POB. EL ARENAL**

