


MUNICIPIO DE DURANGO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2021

TOMO II

Índice Temático


Cierre de Programa Normal Municipal “ Continuidad 2019”

Cierre de Programa Normal Municipal “ Continuidad 2020”

Cierre del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2021

Cierre de Programa Normal Municipal 2021

Anexo Fotográfico



Cierre de Programa Normal Municipal “ Continuidad 2019”



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Inversión Autorizada	Modificado			Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
				Ampliación	Cancelación	Modificado Final									
SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	26,103.24	90,000.00	78,450.59	-	8,701.08	69,749.51	69,749.51	69,749.51	100.00	100.00	3	3	0	0	
SO.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	-	255,135.00	255,135.00	-	-	255,135.00	-	-	0.00	80.00	1	0	1	0	
OBRA DIVERSA	1,026,701.65	3,495,609.00	2,421,601.91	-	12,865.48	2,408,736.43	2,408,736.43	2,408,736.43	100.00	100.00	2	2	0	0	
TOTAL	1,052,804.89	3,840,744.00	2,755,187.50	-	21,566.56	2,733,620.94	2,478,485.94	2,478,485.94	66.67	93.33	6	5	1	0	

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida (COF)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recurso	Anticipo	Presupuesto	Inversión Autorizada	Modificado			Pagado	# De Cuenta según Registros Contables	Cantidad	Unidad de Medida	Observaciones	
															Ampliación	Cancelación	Modificado Final						
S190023 PR	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE SAN JAVIER	POB. SANTA CRUZ	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ED	2019	8,701.08	30,000.00	25,776.35	-	-	25,776.35	25,776.35	1-123590006-999999-00-1050101-2501-000-K19006001-6191-2-151219-S1190023-0000000-619006	1.00	OBRA	10	
S190024 CP	REHABILITACION DE COMEDOR E.P. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, CLAVE 100PR0082D	COL. IGNACIO ZARAGOZA	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ED	2019	8,701.08	30,000.00	26,897.90	-	8,701.08	18,196.82	18,196.82	1-123590006-999999-00-1050101-2501-000-K19006001-6191-2-151219-S1190024-0000000-619006	1.00	OBRA	284	
S190027 CP	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM. ORESTES PEREVA, CLAVE: 10EPR0481Z	COL. FOS LA VIRGEN	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ED	2019	8,701.08	30,000.00	25,776.34	-	-	25,776.34	25,776.34	1-123590006-999999-00-1050101-2501-000-K19006001-6191-2-151219-S1190027-0000000-619006	1.00	OBRA	167	

SUMA DE HOJA	26,103.24	90,000.00	78,450.59	-	-	8,701.08	69,749.51	69,749.51
SUBTOTAL	26,103.24	90,000.00	78,450.59	-	-	8,701.08	69,749.51	69,749.51
TOTAL	26,103.24	90,000.00	78,450.59	-	-	8,701.08	69,749.51	69,749.51

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. Y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALIN DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. Y M.I. MARTHA JUITH AYILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL

FORMULO

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Inversión Autorizada	Modificado			Devengado	Pagado	# De Cuentas Según Registros Contables	Cantidad	Unidad de Medida	Población	Observaciones
															Ampliación	Cancelación	Modificado Final							
SD.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
SO190001 PR	CLINICA DE ADICIONES (IIa. ETAPA)	POB. PLAN DE AYALA	N/A	N/A	6121	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	OP	2019		255,135.00	255,135.00			255,135.00			1-1235020006-999999-00-1050101-2202-000-K19007001-6121-2-151219-SO190001-0000000-000000	1.00	OBRA	25,500	PARA EFECTO DE LA COLUMNA "MODIFICADO FINAL", EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELÓ EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/06/2021 POR LA CANTIDAD DE: \$255,135.00, MISMA QUE SE REASIGNARÁ EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022.

SUMA DE HOJA	-	255,135.00	255,135.00	-	-	255,135.00	-	-
SUBTOTAL	-	255,135.00	255,135.00	-	-	255,135.00	-	-
TOTAL	26,103.24	345,135.00	333,585.59	-	8,701.08	324,884.51	69,749.51	69,749.51

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Inversión Autorizada	Modificado			Devengado	Pagado	# De Cuentas Según Registros Contables	Cantidad	Unidad de Medida	Población	Observaciones
															Ampliación	Cancelación	Modificado Final							
	OBRA DIVERSA																							
OD190032 CP	CASA REGIDORES EN VICTORIA DE DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	OP	2019	38,120.91	135,151.00	49,724.65	-	8,081.33	41,643.32	41,643.32	41,643.32	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K19011006-6191-2-151219-OD190032-0000000-619003	1.00	OBRA	60	
OD190033 CP	CONSTRUCCIÓN DE TUNEL PEATONAL "EL DURANGUEÑO" EN BLVD. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	OP	2019	988,580.74	3,360,458.00	2,371,877.26	-	4,784.15	2,367,093.11	2,367,093.11	2,367,093.11	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K19011002-6191-2-151219-OD190033-0000000-619003	1.00	OBRA	456,500	

SUMA DE HOJA	1,026,701.65	3,495,609.00	2,421,601.91	-	12,865.48	2,408,736.43	2,408,736.43	2,408,736.43
SUBTOTAL	1,026,701.65	3,495,609.00	2,421,601.91	-	12,865.48	2,408,736.43	2,408,736.43	2,408,736.43
TOTAL	1,052,804.89	3,840,744.00	2,755,187.50	-	21,566.56	2,733,620.94	2,478,485.94	2,478,485.94

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



Cierre de Programa Normal Municipal “ Continuidad 2020”





MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	233,726.52	755,511.77	595,733.81	-	-	595,733.81	595,733.81	595,733.81	595,733.81	100.00	100.00	5.00	5.00	-	-	
SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE	499,114.27	-	1,360,322.94	-	-	1,360,322.94	1,360,322.94	1,360,322.93	1,360,322.93	100.00	100.00	5.00	5.00	-	-	
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,254,045.92	11,219,898.56	11,120,186.82	-	6,666,720.16	4,453,466.66	4,453,466.66	4,453,466.67	4,453,466.67	100.00	100.00	9.00	9.00	-	-	
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	196,690.79	3,652,155.89	483,421.84	-	10,129.93	473,291.91	473,291.91	473,291.90	473,291.90	100.00	100.00	3.00	3.00	-	-	
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES	1,057,355.13	7,567,742.67	10,636,764.98	-	6,656,590.23	3,980,174.75	3,980,174.75	3,980,174.77	3,980,174.77	100.00	100.00	6.00	6.00	-	-	
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	100.00	1.00	1.00	-	-	
ESPACIOS PÚBLICOS	-	1,274,562.59	603,723.72	-	-	603,723.72	603,723.72	603,723.72	603,723.72	100.00	100.00	1.00	1.00	-	-	
BACHEO	-	9,000,000.00	7,203,223.78	-	691.86	7,202,531.92	7,202,531.92	7,202,531.92	7,202,531.92	100.00	100.00	3.00	3.00	-	-	
FRESADOS	1,398,962.96	-	4,794,578.23	-	221,135.63	4,573,442.60	4,573,442.60	4,573,442.61	4,573,442.61	100.00	100.00	4.00	4.00	-	-	
OBRAS DIVERSAS	-	-	399,269.91	-	-	399,269.91	399,269.91	399,269.91	399,269.91	100.00	100.00	1.00	1.00	-	-	
TOTAL	3,385,849.67	22,249,972.92	26,247,039.21	-	6,888,547.65	19,358,491.56	19,358,491.56	19,358,491.57	19,358,491.57	100.00	100.00	29.00	29.00	-	-	

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																										
SC200006 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	42,807.04	62,638.68	123,752.51	-	-	123,752.51	123,752.51	123,752.51	123,752.51	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-151220-SC200006-0000000-614006	73.2	M.L.	96		
SC200006 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	6,092.94	20,879.56	17,614.31	-	-	17,614.31	17,614.31	17,614.31	17,614.31	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-140220-SC200006-0000000-614006					
SC200009 CP	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	19,289.64	82,232.73	63,830.11	-	-	63,830.11	63,830.11	63,830.11	63,830.11	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-151220-SC200009-0000000-614006	63	M.L.	122		
SC200009 CP	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	7,932.54	27,410.91	26,249.08	-	-	26,249.08	26,249.08	26,249.08	26,249.08	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05002003-6141-2-140220-SC200009-0000000-614006					
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	78,956.16	-	-	-	-	-	-	-	-		91.5	M.L.	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	26,318.72	-	-	-	-	-	-	-	-					
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	48,125.41	-	-	-	-	-	-	-	-		16	TOMA	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	16,041.80	-	-	-	-	-	-	-	-					
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	41,150.17	-	-	-	-	-	-	-	-		14	TOMA	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	13,716.72	-	-	-	-	-	-	-	-					
SC200015 CP	AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUITE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	29,592.18	50,570.32	28,016.75	-	-	28,016.75	28,016.75	28,016.75	28,016.75	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05002002-6141-2-151220-SC200015-0000000-614006	64.2	M.L.	55		
SC200015 CP	AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUITE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	4,921.68	16,856.77	4,659.66	-	-	4,659.66	4,659.66	4,659.66	4,659.66	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05002002-6141-2-140220-SC200015-0000000-614006					

SUMA DE HOJA	110,636.02	484,897.95	264,122.42	-	-	264,122.42	264,122.42	264,122.42	264,122.42
SUBTOTAL	110,636.02	484,897.95	264,122.42	-	-	264,122.42	264,122.42	264,122.42	264,122.42
TOTAL	110,636.02	484,897.95	264,122.42	-	-	264,122.42	264,122.42	264,122.42	264,122.42

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																										
SC200016 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	48,044.91	69,067.97	140,569.63	-	-	140,569.63	140,569.63	140,569.63	140,569.63	1-1235040006-999999-00-1050101 2203-000-K05002003-6141-2- 151220-SC200016-0000000- 614006	107.6	M.L.	45		
SC200016 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	5,805.02	23,022.66	16,984.31	-	-	16,984.31	16,984.31	16,984.31	16,984.31	1-1235040006-999999-00-1050101 2203-000-K05002003-6141-2- 140220-SC200016-0000000- 614006					
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	31,388.57	-	-	-	-	-	-	-	-		9	TOMA	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	10,462.86	-	-	-	-	-	-	-	-					
SC200019 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD. DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	59,304.55	102,503.83	149,080.21	-	-	149,080.21	149,080.21	149,080.21	149,080.21	1-1235040006-999999-00-1050101 2203-000-K05002003-6141-2- 151220-SC200019-0000000- 614006	170	M.L.	30		
SC200019 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD. DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	9,936.02	34,167.94	24,977.24	-	-	24,977.24	24,977.24	24,977.24	24,977.24	1-1235040006-999999-00-1050101 2203-000-K05002003-6141-2- 140220-SC200019-0000000- 614006					
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40.7	M.L.	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58	M.L.	N/A	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

SUMA DE HOJA	123,090.50	270,613.82	331,611.39	-	-	331,611.39	331,611.39	331,611.39	331,611.39
SUBTOTAL	233,726.52	755,511.77	595,733.81	-	-	595,733.81	595,733.81	595,733.81	595,733.81
TOTAL	233,726.52	755,511.77	595,733.81	-	-	595,733.81	595,733.81	595,733.81	595,733.81

FORMULÓ _____ FORMULÓ _____ AUTORIZÓ _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE																										
01.- REHABILITACIÓN																										
SD200041 CP	ALCANTARILLADO EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	45,490.29	-	99,704.87	-	-	99,704.87	99,704.87	99,704.87	99,704.87	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-005003001-6141-2-151220-SD200041-0000000-614007	69.5	ML	55		
SD200041 CP	ALCANTARILLADO EN LA CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	15,163.43	-	33,234.96	-	-	33,234.96	33,234.96	33,234.96	33,234.96	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-005003001-6141-2-140220-SD200041-0000000-614007					
SD200042 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	78,749.81	-	260,427.00	-	-	260,427.00	260,427.00	250,426.99	250,426.99	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-005003003-6141-2-151220-SD200042-0000000-614007	75.2	ML	98		
SD200042 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	26,249.94	-	86,808.99	-	-	86,808.99	86,808.99	86,809.00	86,809.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-005003003-6141-2-140220-SD200042-0000000-614007					
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		50.2	ML	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SD200044 CP	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	51,898.87	-	172,976.12	-	-	172,976.12	172,976.12	172,976.12	172,976.12	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-005003001-6141-2-151220-SD200044-0000000-614007	72	ML	122		
SD200044 CP	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROF. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	17,299.62	-	57,658.71	-	-	57,658.71	57,658.71	57,658.71	57,658.71	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-005003001-6141-2-140220-SD200044-0000000-614007					
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		151.2	ML	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97.2	ML	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		91.6	ML	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

SUMA DE HOJA	234,851.95	-	710,810.64	-	-	710,810.64	710,810.64	710,810.63	710,810.63
SUBTOTAL	234,851.95	-	710,810.64	-	-	710,810.64	710,810.64	710,810.63	710,810.63
TOTAL	468,578.47	755,511.77	1,306,544.45	-	-	1,306,544.45	1,306,544.44	1,306,544.44	1,306,544.44

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE																										
01.- REHABILITACIÓN																										
SD200038 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	87,975.02	-	213,513.51	-	-	213,513.51	213,513.51	213,513.51	213,513.51	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-151220-SD200038-0000000-614007	125.5	ML	45		
SD200038 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	29,325.01	-	71,171.17	-	-	71,171.17	71,171.17	71,171.17	71,171.17	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-140220-SD200038-0000000-614007					
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		97.5	ML	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
SD200047 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL. JOSÉ ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	110,221.72	-	273,620.71	-	-	273,620.71	273,620.71	273,620.71	273,620.71	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-151220-SD200047-0000000-614007	154	ML	214		
SD200047 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD DE LAS ROSAS	COL. JOSÉ ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	36,740.57	-	91,206.91	-	-	91,206.91	91,206.91	91,206.91	91,206.91	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05003001-6141-2-140220-SD200047-0000000-614007					
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		77.2	ML	N/A	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	AYS	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

SUMA DE HOJA	264,262.32	-	649,512.30	-	-	649,512.30	649,512.30	649,512.30	649,512.30
SUBTOTAL	499,114.27	-	1,360,322.94	-	-	1,360,322.94	1,360,322.93	1,360,322.93	1,360,322.93
TOTAL	732,840.79	755,511.77	1,956,056.75	-	-	1,956,056.75	1,956,056.75	1,956,056.74	1,956,056.74

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



DURANGO

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Gubernativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS																										
SE200001 CP	BANQUETAS EN LA CALLE LAUREANO RONCAL	ZONA CENTRO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	162,001.56	3,339,691.01	388,133.56	-	10,129.93	378,003.63	378,003.63	378,003.63	378,003.63	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05004001-8141-2-151220-SE200001-0000000-614001	737.79	M ²	125,500		
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	10,982.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.9	M. L.	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	3,294.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	95,832.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.19	M. L.	N/A	
N/A	22 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	28,749.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	33,265.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.15	M. L.	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	11,268.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SE200005 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	17,047.29	70,455.80	56,824.29	-	-	56,824.29	56,824.29	56,824.29	56,824.29	56,824.29	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05004001-8141-2-151220-SE200005-0000000-614001	185.21	M. L.	45	
SE200005 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	6,203.24	21,136.74	20,677.47	-	-	20,677.47	20,677.47	20,677.47	20,677.47	20,677.47	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05004001-8141-2-140220-SE200005-0000000-614001	-	-	-	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	22,902.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.27	M. L.	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	6,870.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SE200007 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD. DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	10,874.77	5,756.40	16,909.64	-	-	16,909.64	16,909.64	16,909.64	16,909.64	16,909.64	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05004001-8141-2-151220-SE200007-0000000-614001	43.15	M. L.	46	
SE200007 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD. DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	563.93	1,950.00	876.88	-	-	876.88	876.88	876.87	876.87	876.87	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05004001-8141-2-140220-SE200007-0000000-614001	-	-	-	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	M. L.	N/A	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SUMA DE HOJA	196,690.79	3,652,155.89	483,421.84	-	10,129.93	473,291.91	473,291.91	473,291.90	473,291.90
SUBTOTAL	196,690.79	3,652,155.89	483,421.84	-	10,129.93	473,291.91	473,291.91	473,291.90	473,291.90
TOTAL	929,531.58	4,407,667.66	2,439,478.59	-	10,129.93	2,429,348.66	2,429,348.66	2,429,348.64	2,429,348.64

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



DURANGO

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	F de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
	SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																									
SE200008 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	156,415.87	608,406.37	532,432.14	-	-	532,432.14	532,432.14	532,432.15	532,432.15	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-005004005-61411-2-151220-SE200008-0000000-614002	704.99	M ²	98		
SE200008 CP	PRIVADA 2 ENTRE PREDIOS LAS MESAS Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	37,383.99	143,112.97	127,253.32	-	-	127,253.32	127,253.32	127,253.32	127,253.32	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-005004005-61411-2-140220-SE200008-0000000-614002		M ²			
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	226,029.20	-	-	-	-	-	-	-	-		283.6	M ²	N/A	
N/A	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	76,288.40	-	-	-	-	-	-	-	-			M ²		
SE200010 CP	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROFR. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	205,231.92	778,977.36	700,310.21	-	-	700,310.21	700,310.21	700,310.21	700,310.21	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-005004005-61411-2-151220-SE200010-0000000-614002	876.16	M ²	122		
SE200010 CP	SILICIO ENTRE JOSE SACRAMENTO GALLEGOS Y PROL. PINO SUAREZ (O PROFR. JOSE GARCIA S.)	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	43,082.56	155,084.48	147,010.06	-	-	147,010.06	147,010.06	147,010.06	147,010.06	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-005004005-61411-2-140220-SE200010-0000000-614002		M ²			
SE200011 CP	PAVIMENTACIÓN CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON EL PAV. HD)	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	295,963.83	247,795.60	-	-	247,795.60	247,795.60	247,795.60	247,795.60	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-005004005-61411-2-151220-SE200011-0000000-614002	302.62	M ²	43		
SE200011 CP	PAVIMENTACIÓN CALLE GLORIA MARIN ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y JUAN TORRES (O HASTA TOPAR CON EL PAV. HD)	COL. VALLE DEL GUADIANA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	30,477.35	26,163.06	-	-	26,163.06	26,163.06	26,163.06	26,163.06	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-005004005-61411-2-140220-SE200011-0000000-614002		M ²			
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	780,051.70	-	-	-	-	-	-	-	-		902.69	M ²	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	182,215.85	-	-	-	-	-	-	-	-			M ²		
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	536,288.56	-	-	-	-	-	-	-	-		620.57	M ²	N/A	
N/A	21 DE MARZO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	125,239.06	-	-	-	-	-	-	-	-			M ²		
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	693,108.85	-	-	-	-	-	-	-	-		779.85	M ²	N/A	
N/A	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	137,996.05	-	-	-	-	-	-	-	-			M ²		

SUMA DE HOJA	442,114.34	4,769,252.02	1,780,964.39	-	-	1,780,964.39	1,780,964.39	1,780,964.40	1,780,964.40
SUBTOTAL	442,114.34	4,769,252.02	1,780,964.39	-	-	1,780,964.39	1,780,964.39	1,780,964.40	1,780,964.40
TOTAL	1,371,645.92	9,176,919.68	4,220,442.98	-	-	10,129.93	4,210,313.05	4,210,313.04	4,210,313.04

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



DURANGO

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																										
SE200016 CP	PAVIMENTACIÓN CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	86,688.12	339,443.79	239,843.24	-	-	239,843.24	239,843.24	239,843.24	239,843.24	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151220-SE200016-0000000-614002	454.1	M ²	55		
SE200016 CP	PAVIMENTACIÓN CALLE PINO REAL ENTRE PINO CAHUTE Y PRIV. PINO BLANCO	COL. LOS SAUCES	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	20,718.79	79,845.99	57,323.46	-	-	57,323.46	57,323.46	57,323.46	57,323.46	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-140220-SE200016-0000000-614002					
SE200017 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	75,994.71	258,267.85	259,737.99	-	-	259,737.99	259,737.99	259,738.00	259,738.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151220-SE200017-0000000-614002	407.25	M ²	45		
SE200017 CP	ANDADOR ALFREDO HERRERA ENTRE PROLONGACION PINO SUAREZ Y MARIA DE LA LUZ PAYNS	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	24,354.84	87,169.45	83,241.01	-	-	83,241.01	83,241.01	83,241.01	83,241.01	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-140220-SE200017-0000000-614002					
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	314,166.53	-	-	-	-	-	-	-	-		389.57	M ²	N/A	
N/A	SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTSE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	101,113.09	-	-	-	-	-	-	-	-					
SE200020 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD. DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	365,391.20	1,456,804.00	1,396,013.28	-	-	1,396,013.28	1,396,013.28	1,396,013.28	1,396,013.28	1-1235040002-999999-00-1050101-2202-000-K05004005-6141-2-151220-SE200020-0000000-614002	1,757.79	M ²	214		
SE200020 CP	DOROTEO ARANGO 100 ENTRE GUANACEVI Y JUAN PABLO II O BLVD. DE LAS ROSAS	COL. JOSE ANGEL LEAL	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	42,093.13	161,677.95	161,051.38	-	-	161,051.38	161,051.38	161,051.38	161,051.38	1-1235040002-999999-00-1050101-2202-000-K05004005-6141-2-140220-SE200020-0000000-614002					
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		347.96	M ²	N/A	
N/A	PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	5,377.373.18	-	-	5,377.373.18	-	-	-	-		N/A	N/A	N/A	
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	1,279,217.05	-	-	1,279,217.05	-	-	-	-					

SUMA DE HOJA	615,240.79	2,798,490.65	8,855,800.59	-	6,656,590.23	2,199,210.36	2,199,210.36	2,199,210.37	2,199,210.37
SUBTOTAL	1,057,355.13	7,567,742.67	10,636,764.98	-	6,656,590.23	3,980,174.75	3,980,174.75	3,980,174.77	3,980,174.77
TOTAL	1,986,896.71	11,975,410.33	13,076,243.57	-	6,666,720.16	6,409,523.41	6,409,523.41	6,409,523.41	6,409,523.41

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C. P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



DURANGO

**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
SD200060 PR	DESASOLVE DE DREN	POB CINCO DE MAYO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020		170,000.00				170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	1-1235040007-999999-00-1140101-2103-000-414003001-6141-2-151220-SD2000060-0000000-614007	1.00	OBRA	15	
N/A	OBRA POR DEFINIR	ZONA RURAL	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020											N/A	N/A	N/A	

SUMA DE HOJA	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
SUBTOTAL	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
TOTAL	1,986,886.71	11,975,410.33	13,246,243.57	-	-	6,666,720.16	6,579,523.41	6,579,523.41	6,579,523.41

FORMULÓ FORMULÓ AUTORIZÓ Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.

C. VALENTE PALOMARES DELFIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
	ESPACIOS PÚBLICOS																								
	PARQUES																								
OD200006 CP	FUENTE DE LOS DELFINES (2da ETAPA)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	OP	2020	-	1,274,562.59	603,723.72	-	-	603,723.72	603,723.72	603,723.72	603,723.72	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-4050-12006-6191-2-151220-00200006-0000000-619003	1	OBRAS	654,875	

SUMA DE HOJA	-	1,274,562.59	603,723.72	-	-	603,723.72	603,723.72	603,723.72	603,723.72
SUBTOTAL	-	1,274,562.59	603,723.72	-	-	603,723.72	603,723.72	603,723.72	603,723.72
TOTAL	1,986,886.71	13,249,972.92	13,849,967.29	-	6,666,720.16	7,183,247.13	7,183,247.13	7,183,247.13	7,183,247.13

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
BACHEO																									
SE200058 CP	MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO)	CD VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	2411 2431 6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	AD	URB	2020	-	7,000,000.00	5,394,648.99	-	691.86	5,393,957.13	5,393,957.13	5,393,957.13	5,393,957.13	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200058-0000000- 241001 1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200058-0000000- 241003 1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200058-0000000- 241006 1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200058-0000000- 241008 1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2431-2-151220-SE-200058-0000000- 243001 Y-1-123500002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-6191-2-151220-SE-200058-0000000- 619001	70,068.54	M²	256,500	
SE200043 CP	MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE SLURRY - SEAL	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	2411 2421 6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	AD	URB	2020	-	2,000,000.00	8,645.28	-	-	8,645.28	8,645.28	8,645.28	8,645.28	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200043-0000000- 241003 1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200043-0000000- 241006 Y-1-123500002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2421-2-151220-SE-200043-0000000- 242001 Y-1-123500002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-6191-2-151220-SE-200043-0000000- 619002	29,150.35	M²	256,500	
SE200066 CP	MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	2411 6191	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	AD	URB	2020	-	-	1,799,929.51	-	-	1,799,929.51	1,799,929.51	1,799,929.51	1,799,929.51	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200066-0000000- 241003 1-123504002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-2411-2-151220-SE-200066-0000000- 241006 Y-1-123500002-999999-00-1050101-2201-000- K05004005-6191-2-151220-SE-200066-0000000- 619002	12,097.86	M²	256,500	

SUMA DE HOJA	-	9,000,000.00	7,203,223.78	-	691.86	7,202,531.92	7,202,531.92	7,202,531.92	7,202,531.92
SUBTOTAL	-	9,000,000.00	7,203,223.78	-	691.86	7,202,531.92	7,202,531.92	7,202,531.92	7,202,531.92
TOTAL	1,986,886.71	22,249,972.92	21,053,191.07	-	6,667,412.02	14,385,779.05	14,385,779.05	14,385,779.05	14,385,779.05

FORMULÓ _____ FORMULÓ _____ AUTORIZÓ _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
FRESADOS																									
SE200063 CP	FRESADO CIRCUITO INTERIOR ENTRE IXTLIXOCHITL Y NAZAS	CD. VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	401,918.20	-	1,309,012.50	-	-	1,309,012.50	1,309,012.50	1,309,012.50	1,309,012.50	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200063-0000000-614002	6,376.27	M ²	25,500	
SE200063 CP	FRESADO CIRCUITO INTERIOR ENTRE IXTLIXOCHITL Y NAZAS	CD. VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	60,056.74	-	195,599.57	-	-	195,599.57	195,599.57	195,599.57	195,599.57	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200063-0000000-614002				
SE200064 CP	FRESADO DE CRUCERO 5 DE FEBRERO Y CALLE NAZAS, COLS. GUILLERMINA Y BUROCRATA	CD. VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	216,476.74	-	694,974.02	-	-	694,974.02	694,974.02	694,974.02	694,974.02	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200064-0000000-614002	3,255.12	M ²	22,500	
SE200064 CP	FRESADO DE CRUCERO 5 DE FEBRERO Y CALLE NAZAS, COLS. GUILLERMINA Y BUROCRATA	CD. VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	32,347.10	-	103,846.69	-	-	103,846.69	103,846.69	103,846.69	103,846.69	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200064-0000000-614002				
SE200065 CP	FRESADO DE LA AVE. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ENTRE ANTONIO NORMAN FUENTES HASTA TOPAR CON PAV. DE CONCRETO HID. COLS. GENARO VAZQUEZ, VALLE DEL GUADIANA Y JARDINES DE CANCUN	CD. VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	238,553.10	-	788,004.24	-	-	788,004.24	788,004.24	788,004.24	788,004.24	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200065-0000000-614002	2,293.84	M ²	15,600	
SE200065 CP	FRESADO DE LA AVE. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ENTRE ANTONIO NORMAN FUENTES HASTA TOPAR CON PAV. DE CONCRETO HID. COLS. GENARO VAZQUEZ, VALLE DEL GUADIANA Y JARDINES DE CANCUN	CD. VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	35,645.86	-	117,747.76	-	-	117,747.76	117,747.76	117,747.76	117,747.76	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200065-0000000-614002				
SE200071 CP	FRESADO EN 5 DE FEBRERO ENTRE FSTSE Y JESUS ARRITOLA EN COL. ZONA CENTRO. BUROCRATA Y GUILLERMINA	ZONA CENTRO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	361,101.86	-	1,190,042.10	-	-	1,190,042.10	1,190,042.10	1,190,042.11	1,190,042.11	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200071-0000000-614002	6,025.27	M ²	256,500	
SE200071 CP	FRESADO EN 5 DE FEBRERO ENTRE FSTSE Y JESUS ARRITOLA EN COL. ZONA CENTRO. BUROCRATA Y GUILLERMINA	ZONA CENTRO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	52,863.36	-	174,215.72	-	-	174,215.72	174,215.72	174,215.72	174,215.72	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05004005-6141-2-151320-SE200071-0000000-614002				
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	FEDERAL	FOTEASE	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2020	-	-	221,135.63	-	221,135.63	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	

SUMA DE HOJA	1,398,962.96	-	4,794,578.23	-	221,135.63	4,573,442.60	4,573,442.60	4,573,442.61	4,573,442.61
SUBTOTAL	1,398,962.96	-	4,794,578.23	-	221,135.63	4,573,442.60	4,573,442.60	4,573,442.61	4,573,442.61
TOTAL	3,885,849.67	22,249,972.92	25,847,769.30	-	6,888,547.65	18,959,221.65	18,959,221.65	18,959,221.66	18,959,221.66

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
CONTROLORA MUNICIPAL



DURANGO

**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuentas Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
OBRAS DIVERSAS																									
0200007 CP	TUNEL PEATONAL "EL DURANGUEÑO" AMPLIACION DE INVERSION	BLVD ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO CRUCE AV DE LA NORMAL, VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6191	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	URB	2020			399,269.91			399,269.91	399,269.91	399,269.91	399,269.91	1-1235900003-999999-00-1060101-2202-000-405004004-6191-0-151220-02200007-0000000-619003	1	OBRA	456,500	

SUMA DE HOJA	-	-	399,269.91	-	-	399,269.91	399,269.91	399,269.91	399,269.91
SUBTOTAL	-	-	399,269.91	-	-	399,269.91	399,269.91	399,269.91	399,269.91
TOTAL	3,385,849.67	22,249,972.92	26,247,039.21	-	-	6,888,547.65	19,358,491.56	19,358,491.56	19,358,491.57

FORMULÓ

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	167,100.00	1,616,666.67	1,681,600.00	-	336,675.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	100.00	100.00	9.00	9.00	-	-	
TOTAL	167,100.00	1,616,666.67	1,681,600.00	-	336,675.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	100.00	100.00	9.00	9.00	-	-	

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convencio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
TG- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																										
TG20009 PR	AVES DE TRASPATIO ZONA RURAL	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	112,500.00	600,000.00	375,000.00	-	336,675.00	38,325.00	38,325.00	38,325.00	38,325.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200009-0000000-431001	1,000	PAQUETE	500		
TG200021 PR	SEMILLA DE AVENA	ZONA SIERRA	N/A	N/A	6321	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	750,000.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1-1237020001-999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-2-151220-TG200021-0000000-0000	50.00	TONELADA	100	ESTE PROYECTO QUEDO REGISTRADO COMO DEVENGADO AL 31/12/2020 Y SE PAGO EL DIA 06/ENE/2021
TG200051 PR	CULTIVOS ESTRATEGICOS (AGAVE)	POB UNIDOS VENCEREMOS	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	-	112,600.00	-	-	-	112,600.00	112,600.00	112,600.00	112,600.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200051-0000000-431001	4	HECTAREAS	5	
N/A	PROYECTOS PRODUCTIVOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	286,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	PROYECTO	N/A	
TG200057 PR	PROYECTO PRODUCCIÓN DE MIEL	POB MORCILLO	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200057-0000000-431001	1.00	PROYECTO	5	
TG200054 PR	PROYECTO DE BIO FERTILIZANTE	POB MORCILLO	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	-	182,000.00	-	-	-	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200054-0000000-431001	1.00	PROYECTO	5	
TG200055 PR	PROYECTO DE BIO FERTILIZANTE	POB JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	54,600.00	-	182,000.00	-	-	-	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200055-0000000-431001	1.00	PROYECTO	5	
TG200069 PR	INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	POB IGNACIO ZARAGOZA	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200069-0000000-431001	100.00	CABEZA	10	
TG200056 PR	SEMENTALES	POB SAN BENITO	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200056-0000000-431001	20.00	CABEZA	20	
TG200070 PR	TALABARERÍA	POB LA CASITA	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2020	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14009001-4311-1-151220-TG200070-0000000-431001	1.00	PROYECTO	5	

SUMA DE HOJA	167,100.00	1,616,666.67	1,681,600.00	-	336,675.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00
SUBTOTAL	167,100.00	1,616,666.67	1,681,600.00	-	336,675.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00
TOTAL	167,100.00	1,616,666.67	1,681,600.00	-	336,675.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00	1,344,925.00

FORMULÓ _____ FORMULÓ _____ AUTORIZÓ _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

C. VALENTE PALOMARES DELFIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL

Cierre del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2021



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	862,268.45	4,686,955.84	8,552,532.16	129,109.92	954,420.43	7,727,221.65	7,727,221.65	7,727,222.10	7,295,625.94	94.41	100.00	18	18	-	-	
SD.- ALCANTARILLADO	2,122,977.68	4,700,780.24	11,003,037.66	426,984.75	875,650.27	10,554,372.14	10,554,372.14	10,554,372.12	9,409,304.54	89.15	100.00	19	19	-	-	
POZOS DE ABSORCIÓN	466,304.68	2,143,536.00	1,609,422.48	-	55,073.57	1,554,348.91	1,554,348.91	1,554,348.93	1,083,614.98	69.72	100.00	7	7	-	-	
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	11,268,305.76	45,231,264.09	37,039,973.30	867,199.27	3,147,032.38	34,760,140.19	34,760,140.19	34,760,139.92	22,107,898.97	71.12	100.00	46.00	46.00	-	-	
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	764,132.13	3,741,156.00	2,248,241.14	-	81,829.83	2,166,411.31	2,166,411.31	2,166,411.30	1,662,295.15	76.73	100.00	13	13	-	-	
04.- ALUMBRADO PÚBLICO	290,335.18	877,500.00	990,200.04	-	-	990,200.04	990,200.04	990,200.04	990,200.04	100.00	100.00	1	1	-	-	
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES	4,591,420.11	22,212,608.09	15,461,888.54	58,573.34	2,725,957.43	12,794,504.45	12,794,504.45	12,794,504.14	7,832,042.28	61.21	100.00	14	14	-	-	
07.- VIALIDADES URBANAS	1,055,262.02	5,000,000.00	3,608,418.00	547,757.87	51,161.54	4,105,014.33	4,105,014.33	4,105,014.34	2,199,312.18	53.58	100.00	3	3	-	-	
08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,567,156.32	13,400,000.00	14,731,225.58	260,868.06	288,083.58	14,704,010.06	14,704,010.06	14,704,010.10	9,424,049.32	64.09	100.00	15	15	-	-	
SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	271,916.82	521,000.00	492,721.00	51,111.55	-	543,832.55	543,832.55	543,832.70	271,916.82	0.00	100.00	1	1	-	-	
SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,549,363.61	19,027,870.00	19,021,716.33	3,098,727.20	328.20	22,120,115.33	22,120,115.33	22,120,115.35	20,570,751.74	93.00	100.00	17	17	-	-	
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	362,405.69	5,615,000.00	5,597,172.40	109,101.48	98,275.62	5,607,998.26	5,607,998.26	5,607,996.53	4,633,994.31	82.63	100.00	54	54	-	-	
UB.- CAMINOS RURALES	92,996.68	1,316,490.00	314,064.56	-	4,075.61	309,988.95	309,988.95	309,988.95	308,857.11	99.63	100.00	2	2	-	-	
U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION	-	2,129,586.92	2,096,287.07	408,083.56	-	2,504,370.63	2,504,370.63	2,504,370.63	2,000,852.93	79.89	100.00	2	2	-	-	
TOTAL	16,996,539.38	85,372,483.09	85,726,926.96	5,090,317.73	5,134,856.08	85,682,388.61	85,682,388.61	85,682,387.23	67,682,817.34	74.16	100.00	166	166	-	-	

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																										
SC210017 CP	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE LA VIRGEN A BOSTER AL CALDES, CON TUBERIA PVC DE 6026 DE 6" DE DIAMETRO	COL AL CALDES Y GOBERNADORES	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	3,594,816.84	3,594,816.84	12,789.18	-	3,607,606.02	3,607,606.02	3,607,606.02	3,607,606.02	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03102003-6131-2-250321-SC210017-0000000-613001	1,404.20	ML	2,550		
RED DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																										
SC210018 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 49 Tomas domiciliarias en calle 5 de Mayo	COL MIGUEL DE LA MADRID	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	598,142.00	598,142.00	-	-	598,142.00	598,142.00	598,142.00	598,142.00	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03102001-6131-2-250321-SC210018-0000000-613001	427.00	ML	1,200		
SC210019 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 3" DE DIAM. Y 20 Tomas domiciliarias en calle YUCATAN	COL MEXICO	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	119,389.00	119,389.00	-	-	119,389.00	119,389.00	119,389.00	119,389.00	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03102003-6131-2-250321-SC210019-0000000-613001	159.00	ML	956		
SC210020 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 3" DE DIAM. Y 57 Tomas domiciliarias en LA PRIV ACEREROS	COL ACEREROS	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	374,608.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00	ML	N/A	
SC210053 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 3" DE DIAM. Y 38 Tomas domiciliarias en LA CALLE ALBERTO MAYA	COL CERRO DE GUADALUPE	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	-	374,608.00	-	-	374,608.00	374,608.00	374,608.00	374,608.00	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03102003-6131-2-250321-SC210053-0000000-613001	311.00	ML	560		
EQUIPAMIENTO DE POZOS																										
SC210063 PR	EQUIPAMIENTO DE POZO	POB MORCILLO	DIRECTA	PE	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	-	711,530.61	-	-	711,530.61	711,530.61	711,531.00	711,531.00	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03102003-6131-2-250321-SC210063-0000000-613001	1.00	EQUIPO	20		
SC210064 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO	POB. LA FERRERIA (4 DE OCTUBRE)	DIRECTA	PE	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	APO	2021	-	-	366,983.40	-	366,983.40	-	-	-	-	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03102003-6131-2-250321-SC210064-0000000-613001	1.00	EQUIPO	20		

SUMA DE HOJA	-	4,686,955.84	5,765,469.85	12,789.18	366,983.40	5,411,275.63	5,411,275.63	5,411,276.02	5,411,276.02
SUBTOTAL	-	4,686,955.84	5,765,469.85	12,789.18	366,983.40	5,411,275.63	5,411,275.63	5,411,276.02	5,411,276.02
TOTAL	-	4,686,955.84	5,765,469.85	12,789.18	366,983.40	5,411,275.63	5,411,275.63	5,411,276.02	5,411,276.02

FORMULO

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. RODOLFO CORRUEJO CARRILLO
DIRECTOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Main data table with columns: Número de Proyecto, Nombre del Proyecto, Localidad, Incidencia, Criterio de Beneficio, Partida Generica (COG), Tipo de Recurso, (Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico, Institución Ejecutora, Tipo de Ejecución, Tipo de Proyecto, Ciclo Recurso, Anticipo, Presupuesto, Presupuesto Modificado a Noviembre, Ampliación, Cancelación, Presupuesto Modificado a Diciembre, Inversión Autorizada, Devengado, Pagado, # de Cuenta según Registros Contables, Metas (Cantidad, Unidad de Medida), Población, Observaciones.

SUMMARY TABLE with columns: SUMA DE HOJA, SUBTOTAL, TOTAL and rows for various financial metrics.

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUIJARES CASAVANTES DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARBAY AVITIA SINDCO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenir Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SD - ALCANTARILLADO																										
SD210007 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO, CON 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE YUCATAN	COL MEXICO	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	352,953.00	352,953.00	-	-	352,953.00	352,953.00	352,953.00	352,953.00	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103002-6131-2-250321-SD210007-0000000-613002	156.30	M. L.	956		
SD210008 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO, CON 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS CALLES BAJIO Y MIRADOR	COL PALMA ALTA	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	840,345.43	840,345.43	-	2,042.57	838,302.86	838,302.86	838,302.86	838,302.86	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103002-6131-2-250321-SD210008-0000000-613002	574.09	M. L.	850		
SD210009 CP	REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO Y CONSTRUCCION DE LINEA MADRINA EN CALLE CEDROS, CON TUBERIA PVC DE 12" Y 8" DE DIAMETRO PRIMERA ETAPA	COL LOS SAUCES	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	1,420,847.92	1,420,847.92	-	990.69	1,419,857.23	1,419,857.23	1,419,857.23	1,419,857.23	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103002-6131-2-250321-SD210009-0000000-613002	395.05	M. L.	2,650		
SD210010 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 57 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV ACEREROS	COL ACEREROS	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	642,713.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103002-6131-2-250321-SD210010-0000000-613002	207.30	M. L.	N/A	
SD210011 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 2a ETAPA	COL MANUEL ALVAREZ	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	1,443,920.89	1,443,920.89	-	9,756.00	1,434,164.89	1,434,164.89	1,434,164.89	1,434,164.89	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103002-6131-2-250321-SD210011-0000000-613002	979.40	M. L.	1,002		
SD210025 CP	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 49 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES FRESAS, MELON Y SANDÍA	COL LAS HUERTAS (NORTE)	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	-	642,713.00	-	-	642,713.00	642,713.00	642,713.00	642,713.00	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103002-6131-2-250321-SD210025-0000000-613002	618.00	M. L.	560		
SD210028 PR	SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - POB 4 DE OCTUBRE (LA FERRERIA)	POB 4 DE OCTUBRE (LA FERRERIA)	DIRECTA	ZAP	6131	MUNICIPAL	FISM	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	CONTRATO	ALC	2021	-	-	-	366,983.40	-	366,983.40	366,983.40	366,983.40	366,983.40	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-403103003-6131-2-250321-SD210028-0000000-613002	1.00	EQUIPO			

SUMA DE HOJA	-	4,700,780.24	4,700,780.24	366,983.40	12,789.26	5,054,974.38	5,054,974.38	5,054,974.38	5,054,974.38	5,054,974.38
SUBTOTAL	-	4,700,780.24	4,700,780.24	366,983.40	12,789.26	5,054,974.38	5,054,974.38	5,054,974.38	5,054,974.38	5,054,974.38
TOTAL	862,268.45	9,387,736.08	13,253,312.40	496,093.32	967,209.69	12,782,196.03	12,782,196.03	12,782,196.48	12,350,600.32	

FORMULO

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. RODOLFO CORRUIEDO CARRILLO
DIRECTOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTROLORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
POZOS DE ABSORCIÓN																										
SC210004 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION FRACC. LAS ARBOLEDAS	FRACC. ARBOLEDAS	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	78,753.34	267,942.00	289,361.83	-	26,850.70	262,511.13	262,511.13	262,511.13	247,515.96	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210004-0000000-614006	1.00	POZO	1,570		
SC210008 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION BLVD. JOSE MARIA PATONI (CARLOS LUNA) 1	COL. CARLOS LUNA	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	51,440.95	267,942.00	176,613.94	-	5,144.13	171,469.81	171,469.81	171,469.81	51,440.95	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210008-0000000-614006	1.00	POZO	1,530		
SC210009 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION SEC. BENITO JUAREZ	ZONA CENTRO NORTE ORIENTE	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	60,125.43	267,942.00	204,506.67	-	4,088.54	200,418.13	200,418.13	200,418.13	60,125.43	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210009-0000000-614006	1.00	POZO	1,000		
SC210010 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION FRACC. LA FORESTAL	FRACC. LA FORESTAL	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	63,560.69	267,942.00	216,190.74	-	4,321.77	211,868.97	211,868.97	211,868.97	211,868.97	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210010-0000000-614006	1.00	POZO	3,930		
N/A	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION HOSPITAL VETERINARIO	FRACC. LOS REMEDIOS	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	-	267,942.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210014-0000000-614006	1.00	POZO	N/A	
SC210012 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PLAZA JUAN PABLO II	FRACC. JARDINES DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	83,750.24	267,942.00	284,750.79	-	5,583.35	279,167.44	279,167.44	279,167.44	83,750.24	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210012-0000000-614006	1.00	POZO	2,290		
SC210013 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION COL. JOSE ANGEL LEAL	COL. JOSÉ ÁNGEL LEAL	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	60,279.84	267,942.00	205,268.21	-	4,335.40	200,932.81	200,932.81	200,932.81	200,932.81	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210013-0000000-614006	1.00	POZO	5,500		
SC210014 CP	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION FRENTE A ESC. MEDICINA	COL. BARRIO DE ANALCO	DIRECTA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	DRE	2021	68,394.19	267,942.00	232,730.30	-	4,749.68	227,980.62	227,980.62	227,980.62	227,980.62	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102003-6141-2-250321-SC210014-0000000-614006	1.00	POZO	1,660		

SUMA DE HOJA	466,304.68	2,143,536.00	1,609,422.48	-	55,073.57	1,554,348.91	1,554,348.91	1,554,348.93	1,083,614.98
SUBTOTAL	466,304.68	2,143,536.00	1,609,422.48	-	55,073.57	1,554,348.91	1,554,348.91	1,554,348.93	1,083,614.98
TOTAL	3,451,550.81	11,531,272.08	21,164,992.30	556,094.67	1,885,144.27	19,835,942.70	19,835,942.70	19,835,943.15	17,788,545.46

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SE210052 CP	SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 04.- ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA MASIE	COL MASIE	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	290,335.18	877,500.00	990,200.04	-	-	990,200.04	990,200.04	990,200.04	990,200.04	1.1235040005-999999-00-1050101-2201-000-005104003-6141-2-2350271-SE210052-0000000414005	27	LUMINARIA	1,040	

SUMA DE HOJA	290,335.18	877,500.00	990,200.04	-	-	990,200.04	990,200.04	990,200.04	990,200.04
SUBTOTAL	290,335.18	877,500.00	990,200.04	-	-	990,200.04	990,200.04	990,200.04	990,200.04
TOTAL	4,506,018.12	16,149,928.08	24,403,433.48	556,094.67	1,966,974.10	22,992,554.05	22,992,554.05	22,992,554.49	20,441,040.65

FORMULÓ _____ FORMULO _____ AUTORIZO _____ Vo. Bo. 1,410,879.43 Vo. Bo. _____

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Segun Registros Contables	Metas		Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida		Población
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																									
SE210033 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MAJUL	COL FUNDO LEGAL EL SALTITO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	200,021.75	1,269,016.00	681,674.66	-	318.29	681,356.37	681,356.37	681,356.36	546,664.07	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210033-0000000-614002	713.52	M²	134	
SE210033 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MAJUL	COL FUNDO LEGAL EL SALTITO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	6,997.24	37,854.09	23,867.88	-	32.40	23,835.48	23,835.48	23,835.48	19,123.62	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-140321-SE210033-0000000-614002				
SE210034 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MILAN ENTRE CAPELLINI Y LISBOA	FRACC ROMA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	255,042.38	1,791,172.00	867,535.94	-	31,715.78	835,820.16	835,820.16	835,819.89	255,042.38	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210034-0000000-614002	1,053.63	M²	42	
SE210034 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MILAN ENTRE CAPELLINI Y LISBOA	FRACC ROMA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	38,649.90	238,026.00	131,451.33	-	4,788.58	126,662.75	126,662.75	126,662.71	38,649.90	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-140321-SE210034-0000000-614002				
SE210035 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRADA	COL AMPLIACION FUNDO LEGAL EL SALTITO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	361,462.44	2,392,258.00	1,228,588.24	-	135,829.13	1,092,759.11	1,092,759.11	1,092,759.11	361,462.44	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210035-0000000-614002	1,407.21	M²	57	
SE210035 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS ENTRE LOS ALAMOS Y CERRADA	COL AMPLIACION FUNDO LEGAL EL SALTITO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	45,635.70	251,925.00	155,152.69	-	17,188.62	137,964.07	137,964.07	137,964.07	45,635.70	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-140321-SE210035-0000000-614002				
SE210037 CP	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL	COL VALLE DEL GUADIANA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	78,624.13	547,434.00	267,366.83	-	5,286.40	262,080.43	262,080.43	262,080.44	262,080.44	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210037-0000000-614002	332.02	M²	71	
SE210037 CP	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANABEL ENTRE NAZAS Y PRIV ANABEL	COL VALLE DEL GUADIANA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	11,108.96	65,337.00	37,779.08	-	749.23	37,029.85	37,029.85	37,029.86	37,029.86	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-140321-SE210037-0000000-614002				
SE210038 CP	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA Y PUEBLO NUEVO	COL AMALIA SOLORZANO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	137,051.38	1,377,000.00	457,520.61	58,573.34	-	516,093.95	516,093.95	516,093.95	137,051.38	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210038-0000000-614002	462.15	M²	31	
SE210043 CP	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CIRCUITO BONAMPAX ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SANACTE	FRACC EL HUIZACHE I	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	172,326.86	1,592,982.00	586,500.66	-	15,197.68	571,302.98	571,302.98	571,302.98	300,917.64	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210043-0000000-614002	1,033.27	M²	84	
SE210044 CP	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN PRIV BIRON ENTRE JUAN E GARCIA A TOPAR	COL PREDIO LA LOSA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	209,096.80	2,158,904.00	711,623.22	-	93,627.75	617,995.47	617,995.47	617,995.48	351,384.77	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210044-0000000-614002	1,190.53	M²	35	
SE210046 CP	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN BENITO JUAREZ ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y FCO ZARCO	COL EL ALACRÁN	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	427,499.71	3,954,840.00	1,455,533.30	-	30,582.08	1,424,951.22	1,424,951.22	1,424,951.22	1,418,410.11	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210046-0000000-614002	2,589.94	M²	96	
SE210047 CP	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE RINCON DE LAS ROSAS ENTRE CALLE FCO ZARCO Y RINCON DE LOS LIRIOS	COL RINCONADA DE LAS FLORES	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	353,457.46	1,982,872.00	1,206,438.44	-	47,059.42	1,161,379.02	1,161,379.02	1,161,379.01	1,161,379.01	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210047-0000000-614002	2,002.94	M²	311	
SE210048 CP	PAVIMENTACION ASFALTICA EN GRAL MARIANO MONTERDE ENTRE CALLE 2 Y 3	FRACC LOS FUENTES	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	80,432.73	721,340.00	273,663.82	-	1,822.99	271,840.83	271,840.83	271,840.83	271,840.83	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-005104005-6141-2-250321-SE210048-0000000-614002	480.60	M²	66	
N/A	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE CALANDRIAS ENTRE GAVIOTA Y GAVIOTAS	FRACC SILVESTRE REVUELTAS	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	1,988,596.00	-	-	-	-	-	-	-	-		1,296.67	M²	N/A
N/A	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE CALANDRIAS ENTRE GAVIOTA Y GAVIOTAS	FRACC SILVESTRE REVUELTAS	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	218,104.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
N/A	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES A TOPAR	COL NIÑOS HEROES NORTE	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	1,624,946.00	-	-	-	-	-	-	-	-		955.85	M²	N/A

SUMA DE HOJA	2,377,407.44	22,212,608.09	8,086,696.70	58,573.34	384,198.35	7,761,071.69	7,761,071.69	7,761,071.39	5,206,672.15
SUBTOTAL	2,377,407.44	22,212,608.09	8,086,696.70	58,573.34	384,198.35	7,761,071.69	7,761,071.69	7,761,071.39	5,206,672.15
TOTAL	6,883,425.57	38,362,536.17	32,490,130.18	614,668.01	2,351,172.45	30,753,625.74	30,753,625.74	30,753,625.88	25,647,712.80

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	Metas		Población	Observaciones	
																					# de Cuenta Según Registros Contables	Cantidad			Unidad de Medida
SE - URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
06 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES																									
SE210054 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANABEL ENTRE PRIVADA ANABEL Y CALLE LUCIA MENDEZ	COL VALLE DEL GUADIANA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	119,966.14	-	401,957.11	-	2,003.30	399,953.81	399,953.81	399,953.80	399,953.80	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-255231-SE210054-0000000-614002	471.68	M'	51	
SE210054 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANABEL ENTRE PRIVADA ANABEL Y CALLE LUCIA MENDEZ	COL VALLE DEL GUADIANA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	9,462.71	-	31,686.33	-	143.96	31,542.37	31,542.37	31,542.37	31,542.37	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-140221-SE210054-0000000-614002				
SE210055 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE MANUEL BUENDIA Y CERRADA	COL JOSE REVUELTAS	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	292,782.40	-	996,248.11	-	1,289.32	994,958.79	994,958.79	994,958.79	396,178.86	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-255231-SE210055-0000000-614002	1,146.00	M'	98	
SE210055 CP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIDOS VENCEREMOS ENTRE MANUEL BUENDIA Y CERRADA	COL JOSE REVUELTAS	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	16,745.46	-	57,034.20	-	128.32	56,905.88	56,905.88	56,905.88	22,659.14	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-140221-SE210055-0000000-614002				
SE210074 CP	DOMINGO ARRETA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y DIEGO RIVERA	COL VILLA DE GUADALUPE	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	1,049,707.47	-	2,317,351.41	-	217,936.47	2,099,414.94	2,099,414.94	2,099,414.95	1,049,707.47	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-255231-SE210074-0000000-614002	2,512.00	M'	85	
SE210074 CP	DOMINGO ARRETA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y DIEGO RIVERA	COL VILLA DE GUADALUPE	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	136,402.67	-	301,037.88	-	28,232.54	272,805.34	272,805.34	272,805.33	136,402.67	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-140221-SE210074-0000000-614002				
SE210073 CP	JUAN ESCUTA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES HASTA TOPAR CON EL CERRO	COL NIÑOS HEROES	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	588,925.82	-	1,190,706.56	-	12,854.93	1,177,851.63	1,177,851.63	1,177,851.63	588,925.82	1-123504002-999999-00-1050101-2201-000-K09104005-6141-2-255231-SE210073-0000000-614002	422.00	M'	217	
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	-	2,070,069.13	-	2,070,069.13	-	-	-	-	-	N/A	M'	N/A	
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	-	9,101.11	-	9,101.11	-	-	-	-	-	N/A	M'	N/A	

SUMA DE HOJA	2,214,012.67	-	7,375,191.84	-	2,341,759.08	5,033,432.76	5,033,432.76	5,033,432.75	2,625,370.13
SUBTOTAL	4,591,420.11	22,212,608.09	15,461,888.54	58,573.34	2,725,957.43	12,794,504.45	12,794,504.45	12,794,504.14	7,832,042.28
TOTAL	9,097,438.24	34,362,536.17	39,865,322.02	614,668.01	4,692,931.53	35,787,058.50	35,787,058.50	35,787,058.63	28,273,082.93

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (DOG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
07.- VIALIDADES URBANAS																									
CICLO PISTA																									
SE210015 CP	CICLOPISTA "DOLORES DEL RIO" DE BLVD DOMINGO ARRIETA A C PROFESOR GUADALUPE RODRIGUEZ	COL CIÉNEGA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	407,580.23	3,800,000.00	1,387,456.00	467,741.08	-	1,855,197.08	1,855,197.08	1,855,197.08	978,483.26	1-1235040010-999999-00-1050101-2201-000-K05104006-6141-2-250321-SE210015-0000000-614010	0.83	KM	28,638	
SE210016 CP	CICLOPISTA "PROFESOR GUADALUPE G DE RODRIGUEZ" CONEXION DE CICLOVIA "DOLORES DEL RIO" A CICLOVIA "LAUREANO RONCAL"	COL CIÉNEGA	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	495,621.13	1,200,000.00	1,703,232.00	-	51,161.54	1,652,070.46	1,652,070.46	1,652,070.46	886,556.59	1-1235040010-999999-00-1050101-2201-000-K05104006-6141-2-250321-SE210016-0000000-614010	0.31	KM	28,638	
SE210072 CP	CICLOPISTA "LAUREANO RONCAL" ENTRE BOULEVARD "TELPE" "PESCADOR" Y EL BOULEVARD "GOMEZ MORIN"	ZONA CENTRO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	152,060.66	-	517,730.00	80,016.79	-	597,746.79	597,746.79	597,746.80	334,270.33	1-1235040010-999999-00-1050101-2201-000-K05104006-6141-2-250321-SE210072-0000000-614010	0.22	KM	28,638	

SUMA DE HOJA	1,055,262.02	5,000,000.00	3,608,418.00	547,757.87	51,161.54	4,105,014.33	4,105,014.33	4,105,014.34	2,199,312.18
SUBTOTAL	1,055,262.02	5,000,000.00	3,608,418.00	547,757.87	51,161.54	4,105,014.33	4,105,014.33	4,105,014.34	2,199,312.18
TOTAL	10,152,700.26	43,362,536.17	43,473,740.02	1,162,425.88	4,744,099.07	39,892,072.83	39,892,072.83	39,892,072.97	30,472,395.11

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARO. RODRIGO ALEJANDRO MIARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALIM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
CONSTRUCCION DE AULA																									
NIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL POBLADO UNIDOS VENCEREMOS	LOC. UNIDOS VENCEREMOS	DIRECTA	2RS	6191	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	IBE	2021	-	521,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	AULA	N/A	
CONSTRUCCION DE MODULO SANIRARIOS																									
SJ210001 PR	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO ETAPA 1 Y 2 (CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN) JARDÍN DE NIÑOS "PLUTARCO ELIAS CALLES" CCT 10K42237	LOC. UNIDOS VENCEREMOS	DIRECTA	2RS	6191	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	IBE	2021	271,916.82	-	492,721.00	51,111.55	-	543,832.55	543,832.55	543,832.70	271,916.82	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05107004-6191-2-250321-SJ210001-000000-619006	1	MÓDULO	23	

SUMA DE HOJA	271,916.82	521,000.00	492,721.00	51,111.55	-	543,832.55	543,832.55	543,832.70	271,916.82
SUBTOTAL	271,916.82	521,000.00	492,721.00	51,111.55	-	543,832.55	543,832.55	543,832.70	271,916.82
TOTAL	14,991,773.40	57,283,536.17	58,697,686.60	1,474,405.49	5,032,176.65	55,139,915.44	55,139,915.44	55,139,915.77	40,168,361.25

FORMULÓ _____ FORMULÓ _____ AUTORIZÓ _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																										
SH210010 CP	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	1,055,202.00	1,045,892.73	-	-	1,045,892.73	1,045,892.73	1,045,892.73	1,045,892.73	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210010-0000000-619007	595.00	M ²	151		
N/A	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MEDIANTE LAMINA GALVANIZADA	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	1,860,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210006-0000000-619007	40.00	TECHO FIRME	N/A	
SH210008 PR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA 1	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	929,908.43	-	-	929,908.43	929,908.43	929,908.43	929,908.43	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210008-0000000-619007	600.00	M ²	86		
SH210009 PR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA 2	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	929,908.43	-	-	929,908.43	929,908.43	929,908.43	929,908.43	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210009-0000000-619007	600.00	M ²	86		
N/A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210009-0000000-619007	50.00	CUARTOS DORMITORIO	N/A	
SH210005 PR	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL RURAL 1	ZONA RURAL	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,537,810.58	-	-	1,537,810.58	1,537,810.58	1,537,810.58	1,537,810.58	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210005-0000000-619007	19.00	ACCIÓN	82		
SH210006 PR	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL RURAL 2	ZONA SIERRA	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,519,942.31	-	-	1,519,942.31	1,519,942.31	1,519,942.31	1,519,942.31	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210006-0000000-619007	19.00	ACCIÓN	82		
SH210007 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	1,962,500.00	1,956,044.78	-	-	1,956,044.78	1,956,044.78	1,956,044.78	1,956,044.78	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210007-0000000-619007	25.00	OBRA	108		
SH210013 CP	CALENTADORES SOLARES	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	1,919,000.00	1,985,482.25	-	328.20	1,985,154.05	1,985,154.05	1,985,154.05	1,985,154.05	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210013-0000000-619007	210.00	CALENTADOR SOLAR	873		
N/A	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	6,736,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210004-0000000-619007	100.00	CUARTOS DORMITORIO	N/A	
SH210001 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 1	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,712,631.12	-	-	1,712,631.12	1,712,631.12	1,712,631.12	1,712,631.12	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210001-0000000-619007	22.00	ACCIÓN	95		
SH210002 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 2	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,694,224.05	-	-	1,694,224.05	1,694,224.05	1,694,224.05	1,694,224.05	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210002-0000000-619007	22.00	ACCIÓN	95		
SH210003 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 3	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,709,693.51	-	-	1,709,693.51	1,709,693.51	1,709,693.51	1,709,693.51	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210003-0000000-619007	22.00	ACCIÓN	95		
SH210004 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 4	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,559,933.66	-	-	1,559,933.66	1,559,933.66	1,559,933.66	1,559,933.66	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210004-0000000-619007	20.00	ACCIÓN	86		
N/A	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	2,444,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210004-0000000-619007	218.75	PISO FIRME	N/A	
SH210011 CP	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 1	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,220,344.37	-	-	1,220,344.37	1,220,344.37	1,220,344.37	1,220,344.37	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210011-0000000-619007	2,480.00	M ²	335		
SH210012 CP	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MEV	2021	-	-	1,219,900.11	-	-	1,219,900.11	1,219,900.11	1,219,900.11	1,219,900.11	1.1235600007-999999-01-1030101-2205-000-403106001-6191-2-250321-SH210012-0000000-619007	2,480.00	M ²	335		

SUMA DE HOJA	-	19,027,870.00	19,021,716.33	-	328.20	19,021,388.13	19,021,388.13	19,021,388.13	19,021,388.13	19,021,388.13
SUBTOTAL	-	19,027,870.00	19,021,716.33	-	328.20	19,021,388.13	19,021,388.13	19,021,388.13	19,021,388.13	19,021,388.13
TOTAL	14,991,773.40	76,311,406.17	77,719,402.93	1,474,405.49	5,032,504.85	74,161,303.57	74,161,303.57	74,161,303.90	59,189,749.34	

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. JOSE FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LIZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SH- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
SH210014 CP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	MEV	2021	420,644.01	-	-	841,288.00	-	841,288.00	841,288.00	841,288.02	420,644.01	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07106001-6191-2-250321-SH210014-0000000-619007	100.00	ACCION	320	
SH210015 CP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES 2021	VARIAS COLONIAS	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	MEV	2021	405,694.29	-	-	811,388.58	-	811,388.58	811,388.58	811,388.58	405,694.29	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07106001-6191-2-250321-SH210015-0000000-619007	13.00	ACCION	90	
SH210016 CP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2021	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	MEV	2021	423,258.50	-	-	846,517.00	-	846,517.00	846,517.00	846,517.00	423,258.50	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07106001-6191-2-250321-SH210016-0000000-619007	235.00	ACCION	705	
SH210017 CP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA 2021	VICTORIA DE DURANGO	DIRECTA	ZAP	6191	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONTRATO	MEV	2021	299,766.81	-	-	599,533.62	-	599,533.62	599,533.62	599,533.62	299,766.81	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07106001-6191-2-250321-SH210017-0000000-619007	171.00	ACCION	513	

SUMA DE HOJA	1,549,363.61	-	-	3,098,727.20	-	3,098,727.20	3,098,727.20	3,098,727.20	3,098,727.22	1,549,363.61
SUBTOTAL	1,549,363.61	19,027,870.00	19,021,716.33	3,098,727.20	328.20	22,120,115.33	22,120,115.33	22,120,115.35	20,570,751.74	
TOTAL	16,541,137.01	76,311,406.17	77,719,402.93	4,573,132.69	5,032,504.85	77,260,030.77	77,260,030.77	77,260,031.12	60,739,112.99	

FORMULÓ

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

 LIC. MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA
 DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

 C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

 M. A. P. LUZ MARIA GARBAY AVITIA
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AYLA LUCERO
 CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registro Contable	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																										
N/A	CONSTRUCCION DE BORDOS	ZONA RURAL	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	950 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	OBRA	N/A		
TG210009 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB SANTIAGO BAYACORA	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210009-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210011 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB GRAL CARLOS REAL	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210011-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210013 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA	DIRECTA	2RS	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210013-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210015 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210015-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210006 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB SAN VICENTE CHUPADEROS	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210006-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210007 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB OTINAPA	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210007-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210008 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB RÍO VERDE	DIRECTA	2RS	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210008-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210014 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB GRAL DOMINGO ARRIETA	DIRECTA	2RS	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	82,341.77	-	-	-	82,341.77	82,341.77	82,341.77	82,341.77	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210014-0000000-616001	1,950	M²	10	
TG210010 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB NAVAJAS	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210010-0000000-616001	2,250	M²	10	
TG210012 PR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB GRAL LÁZARO CÁRDENAS (GARABITO NUEVO)	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	95 000 00	-	-	-	95 000 00	95 000 00	95 000 00	95 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210012-0000000-616001	2,250	M²	10	
N/A	REHABILITACION DE BORDOS	ZONA RURAL	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	720 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	OBRA	N/A	
TG210016 PR	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB 16 DE SEPTIEMBRE	DIRECTA	2RS	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	80 000 00	-	-	-	80 000 00	80 000 00	80 000 00	80 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210016-0000000-616001	1	OBRA	10	
TG210017 PR	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB ANTONIO GAXIOLA	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	40 000 00	-	-	-	40 000 00	40 000 00	40 000 00	40 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210017-0000000-616001	1	OBRA	10	
TG210019 PR	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB EMPALME PURISIMA	DIRECTA	2RS	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	40 000 00	-	-	-	40 000 00	40 000 00	40 000 00	40 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210019-0000000-616001	1	OBRA	10	
TG210020 PR	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB IGNACIO ZARAGOZA	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	40 000 00	-	-	-	40 000 00	40 000 00	40 000 00	40 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210020-0000000-616001	1	OBRA	10	
TG210021 PR	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	POB RODRÍGUEZ PUEBLA	DIRECTA	PE	6161	MUNICIPAL	FISM	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	URB	2021	-	40 000 00	-	-	-	40 000 00	40 000 00	40 000 00	40 000 00	-	1 1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-6161-2-250321-TG210021-0000000-616001	1	OBRA	10	

SUMA DE HOJA	-	1,670,000.00	1,177,341.77	-	-	-	-	1,177,341.77	1,177,341.77	1,177,341.77	852,341.77
SUBTOTAL	-	1,670,000.00	1,177,341.77	-	-	-	-	1,177,341.77	1,177,341.77	1,177,341.77	852,341.77
TOTAL	16,541,137.01	77,981,406.17	78,896,744.70	4,573,132.89	5,092,504.85	78,437,372.54	78,437,372.54	78,437,372.89	78,437,372.89	61,591,454.76	

FORMULO

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

C. VALENTE PALOMARES DELFIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
U9- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION																									
DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
U9210002 CP	PRODIM	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	5111 5151 3341	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRATO	OP	2021	-	845,612.37	1,157,852.57	-	-	1,157,852.57	1,157,852.57	1,157,852.57	1,157,852.57	1-124101001-999999-00-1030101-2202-000-K03110001-5111-2-250321-1-09210002-0000000-511001-1-1241030001-999999-00-1030101-2202-000-K03110001-5151-2-250321-1-09210002-0000000-515001-1-5133040003-999999-00-1030101-2202-000-K03110001-3341-1-250321-1-09210002-0000000-334003	1	INFORME	122	
U9210001 CP	GASTOS INDIRECTOS	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	2911 3391 3551 5231	MUNICIPAL	FISM	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRATO	OP	2021	-	1,283,974.55	938,434.50	408,083.56	-	1,346,518.06	1,346,518.06	1,346,518.06	843,000.36	1-1242030001-999999-00-1030101-2202-000-K03110002-5231-2-250321-1-09210001-0000000-523001-1-5129010001-999999-00-1030101-2202-000-K03110002-2911-1-250321-1-09210001-0000000-291001-1-5133090204-999999-00-1030101-2202-000-K03110002-3391-1-250321-1-09210001-0000000-339004-1-5135050001-999999-00-1030101-2202-000-K03110002-3551-1-250321-1-09210001-0000000-355001	1	INFORME	10	

SUMA DE HOJA	-	2,129,586.92	2,096,287.07	408,083.56	-	2,504,370.63	2,504,370.63	2,504,370.63	2,000,852.93
SUBTOTAL	-	2,129,586.92	2,096,287.07	408,083.56	-	2,504,370.63	2,504,370.63	2,504,370.63	2,000,852.93
TOTAL	16,996,539.38	85,372,483.09	85,726,926.96	5,090,317.73	5,134,856.08	85,682,388.61	85,682,388.61	85,682,387.23	67,682,817.34

FORMULÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

C. P. y M. I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C. P. y M. I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL

Cierre de Programa Normal Municipal 2021



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	204,327.25	588,296.97	554,271.56	-	1,462.61	552,808.95	552,808.95	248,995.58	64,667.59	11.70	48.33	6.00	2.00	3.00	1.00	
SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE	762,798.39	2,047,481.26	2,279,917.12	-	3,098.47	2,276,818.65	2,276,818.65	1,010,275.57	99,704.52	4.38	65.00	6.00	2.00	3.00	1.00	
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,064,857.78	5,740,346.33	180,558,038.92	36,286,075.42	697,875.71	216,146,238.63	216,146,237.64	212,098,836.76	82,727,673.08	14.88	50.83	26.00	4.00	1.00	21.00	
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	145,366.98	181,154.91	380,698.92	-	-	380,698.92	380,698.92	145,366.98	-	0.00	20.00	5.00	1.00	-	4.00	
04.- ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	174,843,991.44	35,928,008.56	-	210,772,000.00	210,772,000.00	210,772,000.00	82,559,962.02	39.17	100.00	2.00	2.00	-	-	
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES	919,490.80	3,501,617.42	3,275,774.56	-	205,692.82	3,070,081.74	3,070,080.75	1,181,469.78	167,711.06	5.46	32.50	6.00	1.00	1.00	4.00	
RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	-	2,057,574.00	2,057,574.00	358,066.86	492,182.89	1,923,457.97	1,923,457.97	-	-	0.00	0.00	13.00	-	-	13.00	
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL (MTTO VIAL)	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1,138,353.30	1,138,353.30	11.38	53.00	1.00	-	1.00	-	
TOTAL	2,031,983.42	18,376,124.56	193,392,227.60	36,286,075.42	702,436.79	228,975,866.23	228,975,865.24	214,496,461.21	84,030,398.49	10.30	45.55	39.00	8.00	8.00	23.00	

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																									
SC210001 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	86,644.50	201,744.01	178,527.09	-	-	178,527.09	178,527.09	86,644.50	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-151221-SC210001-0000000-614006	148.00	ML	126	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELÓ EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$91,882.59 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$11,348.53, MISMA QUE SE REASIGNARÁ EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022	
SC210001 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	12,775.46	26,319.00	26,319.00	-	-	26,319.00	26,319.00	12,775.46	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210001-0000000-614006	18.00	TOMA	86		
SC210002 CP	21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	15,305.43	50,195.14	52,300.85	-	-	52,300.85	52,300.85	15,305.43	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210002-0000000-614006	16.00	TOMA	70		
SC210002 CP	21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	4,693.83	16,042.00	16,042.00	-	-	16,042.00	16,042.00	4,693.83	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210002-0000000-614006	72.30	ML	54		
SC210003 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	48,880.39	47,880.39	47,880.39	-	-	47,880.39	47,880.39	-	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-151221-SC210003-0000000-614006	40.70	ML	40		
SC210003 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	13,717.00	13,717.00	13,717.00	-	-	13,717.00	13,717.00	-	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210003-0000000-614006	60.00	ML	49		
SC210005 CP	SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	37,092.24	81,228.99	76,058.66	-	-	76,058.66	76,058.66	37,092.24	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-151221-SC210005-0000000-614006	49	ML	49		
SC210005 CP	SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	5,101.18	10,463.00	10,463.00	-	-	10,463.00	10,463.00	5,101.18	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210005-0000000-614006	49	ML	49		
SC210006 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	-	41,038.59	32,451.41	-	1,027.24	31,424.17	31,424.17	31,424.17	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-151221-SC210006-0000000-614006	40.70	ML	40		
SC210006 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	13,679.53	13,679.53	13,679.53	-	435.37	13,244.16	13,244.16	13,244.16	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210006-0000000-614006	49	ML	49		
SC210007 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	32,202.54	64,117.05	65,460.28	-	-	65,460.28	65,460.28	32,202.54	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-151221-SC210007-0000000-614006	49	ML	49		
SC210007 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	APO	2021	10,512.07	21,372.35	21,372.35	-	-	21,372.35	21,372.35	10,512.07	1.1235040006-999999-00-1050101-2203-000-405102001-6141-2-140221-SC210007-0000000-614006	49	ML	49		

SUMA DE HOJA	204,327.25	588,296.97	554,271.56	-	1,462.61	552,808.95	552,808.95	248,995.58	64,667.59
SUBTOTAL	204,327.25	588,296.97	554,271.56	-	1,462.61	552,808.95	552,808.95	248,995.58	64,667.59
TOTAL	204,327.25	588,296.97	554,271.56	-	1,462.61	552,808.95	552,808.95	248,995.58	64,667.59

FORMULO _____ FORMULO _____ AUTORIZO _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

ARG. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (000)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SD.- ALCANTARILLADO Y DRENAJE																									
01.- REHABILITACIÓN																									
SD210002 CP	21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	74,748.48	251,122.46	250,665.77			250,665.77	250,665.77	74,748.48	74,748.48	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210002-0000000-614007	97.20	ML	86	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$175,917.29 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS 58,751.42, MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SD210002 CP	21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	24,956.04	83,707.46	83,707.46			83,707.46	83,707.46	24,956.04	24,956.04	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210002-0000000-614007				
SD210001 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	350,381.03	552,209.72	741,716.81			741,716.81	741,716.81	350,381.03		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210001-0000000-614007	295.40	ML	126	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$391,335.77 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS 97,130.63, MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SD210001 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	86,939.28	184,069.91	184,069.91			184,069.91	184,069.91	86,939.28		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210001-0000000-614007				
SD210003 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021		232,760.45	215,206.28			215,206.28	215,206.28			1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210003-0000000-614007	91.60	ML	109	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$215,206.28 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$77,586.82, MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SD210003 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021		77,586.82	77,586.82			77,586.82	77,586.82			1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210003-0000000-614007				
SD210004 CP	SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	94,264.91	223,857.20	197,882.31			197,882.31	197,882.31	94,264.91		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210004-0000000-614007	97.50	ML	54	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$103,617.40 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$39,023.93, MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SD210004 CP	SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	35,505.07	74,529.00	74,529.00			74,529.00	74,529.00	35,505.07		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210004-0000000-614007				
SD210005 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021		130,050.16	207,225.60		2,561.97	204,663.63	204,663.63	204,663.63		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210005-0000000-614007	96.00	ML	39	
SD210005 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021		43,350.05	43,350.05		536.50	42,813.55	42,813.55	42,813.55		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210005-0000000-614007				
SD210006 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	73,145.13	145,678.52	155,417.60			155,417.60	155,417.60	73,145.13		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210006-0000000-614007	58.00	ML	55	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$82,272.47 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$25,701.06, MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SD210006 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	ALC	2021	22,858.45	48,559.51	48,559.51			48,559.51	48,559.51	22,858.45		1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210006-0000000-614007				

SUMA DE HOJA	762,796.39	2,047,481.26	2,279,917.12	-	3,096.47	2,276,818.65	2,276,818.65	1,010,275.57	99,704.52
SUBTOTAL	762,796.39	2,047,481.26	2,279,917.12	-	3,096.47	2,276,818.65	2,276,818.65	1,010,275.57	99,704.52
TOTAL	967,125.64	2,635,778.23	2,834,188.68	-	4,561.08	2,829,627.60	2,829,627.60	1,259,271.15	164,372.31

FORMULO

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MILARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIYAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Gasearia (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS																									
SE210018 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	116,192.10	71,132.46	238,560.69	-	-	238,560.69	238,560.69	116,192.10	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-151221-SE210018-0000000-614001	252.19	M.L.	126	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$122,368.58 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$14,740.28. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210018 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	14,009.72	28,750.00	28,750.00	-	-	28,750.00	28,750.00	14,009.72	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-140221-SE210018-0000000-614001				
SE210019 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	28,773.86	28,773.86	-	-	28,773.86	28,773.86	-	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-151221-SE210019-0000000-614001	92.51	M.L.	45	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$28,773.86 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$11,269.00. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210019 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	11,269.00	11,269.00	-	-	11,269.00	11,269.00	-	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-140221-SE210019-0000000-614001				
SE210020 CP	SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	11,166.70	22,172.20	22,528.42	-	-	22,528.42	22,528.42	11,166.70	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-151221-SE210020-0000000-614001	67.92	M.L.	30	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$11,361.72 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$3,465.47. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210020 CP	SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	3,405.53	6,871.00	6,871.00	-	-	6,871.00	6,871.00	3,405.53	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-140221-SE210020-0000000-614001				
SE210021 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	8,189.60	39,450.72	-	-	39,450.72	39,450.72	-	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-151221-SE210021-0000000-614001	29.00	M.L.	14	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$39,450.72 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$3,295.00. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210021 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	3,295.00	3,295.00	-	-	3,295.00	3,295.00	-	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-140221-SE210021-0000000-614001				
SE210022 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	399.46	795.32	808.50	-	-	808.50	808.50	399.46	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-151221-SE210022-0000000-614001	3.00	M.L.	49	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/DIC/2021 POR LA CANTIDAD DE \$409.04 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$198.26. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210022 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	193.47	391.73	391.73	-	-	391.73	391.73	193.47	-	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K025104001-6141-2-140221-SE210022-0000000-614001				

SUMA DE HOJA	145,366.98	181,154.91	380,698.92	-	-	380,698.92	380,698.92	145,366.98	-
SUBTOTAL	145,366.98	181,154.91	380,698.92	-	-	380,698.92	380,698.92	145,366.98	-
TOTAL	1,112,492.62	2,816,933.14	3,214,887.60	-	4,561.08	3,210,326.52	3,210,326.52	1,404,638.13	164,372.11

FORMULO FORMULO AUTORIZO Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVTIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUOTH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
	SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 04.- ALUMBRADO PÚBLICO																								
IP210007 CP	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (CONVENIO APP LUMINARIAS)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6131	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTRATO	URB	2020	-	-	174,843,991.44	6,313,454.12	-	181,157,445.56	181,157,445.56	181,157,445.56	82,559,962.02	1-1235030005-999999-00-1060101-2204 000-E06106003-6131-2-151220-IP210007 0000000-613005	35,883	LUMINARIA	463,830	
IP210007 CP	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (CONVENIO APP LUMINARIAS)	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6131	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTRATO	URB	2021	-	-	29,614,554.44	-	-	29,614,554.44	29,614,554.44	29,614,554.44	-	1-1235030005-999999-00-1060101-2204 000-E06106003-6131-2-151221-IP210007 0000000-613005	35,883	LUMINARIA	463,830	

SUMA DE HOJA	-	-	174,843,991.44	35,928,008.56	-	210,772,000.00	210,772,000.00	210,772,000.00	82,559,962.02
SUBTOTAL	-	-	174,843,991.44	35,928,008.56	-	210,772,000.00	210,772,000.00	210,772,000.00	82,559,962.02
TOTAL	1,112,492.62	2,816,933.14	178,058,879.04	35,928,008.56	4,561.08	213,982,326.52	213,982,326.52	212,176,638.13	82,774,334.13

FORMULÓ

FORMULO

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ING. GABRIEL MENDOZA AVILA
DIRECTOR MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Operativa (COO)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Segun Registros Contables	Metas		Publicación	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																										
SE210024 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	324,198.20	752,360.97	655,063.94	-	-	655,063.94	655,063.94	324,198.20	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-151221-SE210024-0000000-614002	902.64	M²	126	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/01/2021 POR LA CANTIDAD DE \$330,665.74 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$92,990.45. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022	
SE210024 PR	21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	90,165.55	182,216.00	182,216.00	-	-	182,216.00	182,216.00	90,165.55	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-140221-SE210024-0000000-614002					
SE210026 CP	21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	131,066.19	515,605.00	447,834.14	-	-	447,834.14	447,834.14	131,066.19	131,066.19	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-151221-SE210026-0000000-614002	620.57	M²	86	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/01/2021 POR LA CANTIDAD DE \$316,767.95 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$88,594.13. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210026 CP	21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	36,644.87	125,239.00	125,239.00	-	-	125,239.00	125,239.00	36,644.87	36,644.87	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-140221-SE210026-0000000-614002				
SE210027 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	660,173.67	576,615.22	-	-	576,615.22	576,615.22	-	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-151221-SE210027-0000000-614002	779.65	M²	109	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/01/2021 POR LA CANTIDAD DE \$576,615.22 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$137,998.00. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210027 CP	VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	137,998.00	137,998.00	-	-	137,998.00	137,998.00	-	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-140221-SE210027-0000000-614002				
SE210029 CP	SEMARNA ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	128,269.72	301,908.00	259,851.97	-	-	259,851.97	259,851.97	128,269.72	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-151221-SE210029-0000000-614002	389.50	M²	54	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/01/2021 POR LA CANTIDAD DE \$131,582.25 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$51,502.59. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210029 CP	SEMARNA ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	49,907.41	101,113.00	101,113.00	-	-	101,113.00	101,113.00	49,907.41	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-140221-SE210029-0000000-614002				
SE210030 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	221,918.30	190,816.49	-	3,858.71	187,157.78	187,156.79	187,157.78	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-151221-SE210030-0000000-614002	283.60	M²	39	
SE210030 PR	FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	76,289.00	76,288.00	-	1,466.80	74,821.20	74,821.20	74,821.20	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-140221-SE210030-0000000-614002				
SE210032 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	115,097.85	337,499.00	232,874.01	-	-	232,874.01	232,874.01	115,097.85	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-151221-SE210032-0000000-614002	347.46	M²	49	PARA EFECTO DE LA COLUMNA " MODIFICADO A DICIEMBRE " EN ESTA OBRA POR CIERRE DE EJERCICIO CONTABLE SE CANCELO EL PRESUPUESTO NO DEVENGADO Y EJERCIDO AL 31/01/2021 POR LA CANTIDAD DE \$117,776.15 EN LO MUNICIPAL Y EN BENEFICIARIOS \$45,156.46. MISMA QUE SE REASIGNARA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SE210032 CP	CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	N/A	N/A	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	44,141.01	89,297.48	89,297.48	-	-	89,297.48	89,297.48	44,141.01	-	-	1-123504002-99999-00-1050101-2201-000-405104005-6141-2-140221-SE210032-0000000-614002				
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	-	166,159.65	-	-	166,159.65	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	
N/A	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	COMPLEMENTARIA	ZAP	6141	MEZCLA	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	-	-	34,407.66	-	-	34,407.66	-	-	-	-	-	N/A	M²	N/A	

SUMA DE HOJA	919,490.80	3,501,617.42	3,275,774.56	-	205,692.82	3,079,081.74	3,070,080.75	1,181,469.78	167,711.06
SUBTOTAL	919,490.80	3,501,617.42	3,275,774.56	-	205,692.82	3,079,081.74	3,070,080.75	1,181,469.78	167,711.06
TOTAL	2,031,983.42	6,318,550.56	181,334,653.60	35,928,008.56	210,253.90	217,052,408.26	217,052,407.27	213,358,107.91	82,892,045.19

FORMULO FORMULO AUTORIZO Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.

ARO. RODRIGO ALEJANDRO MILARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEN

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Main data table with columns: Número de Proyecto, Nombre del Proyecto, Localidad, Incidencia, Criterio de Beneficio, Partida Gubernativa (COB), Tipo de Recurso, (Plasamiento) Programa Fondo Convenio Específico, Institución Ejecutora, Tipo de Ejecución, Tipo de Proyecto, Ciclo Recurso, Anticipo, Presupuesto, Presupuesto Modificado a Noviembre, Ampliación, Cancelación, Presupuesto Modificado a Diciembre, Inversión Autorizada, Devengado, Pagado, # de Cuotas Según Registros Contables, Notas (Cantidad, Unidad de Medida), Población, Observaciones.

SUMMARY TABLE:
SUMA DE HOJA: 2,057,574.00, 2,057,574.00, 358,086.86, 492,182.80, 1,923,457.97, 1,923,457.97
SUBTOTAL: 2,057,574.00, 2,057,574.00, 358,086.86, 492,182.80, 1,923,457.97, 1,923,457.97
TOTAL: 2,051,983.42, 8,576,134.56, 183,392,227.60, 36,286,875.42, 782,436.79, 218,975,865.24, 218,975,865.24, 87,892,045.19

FORMULÓ

FORMULO

AUTORIZO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUB DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LIZ MARIA GARBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL (MTTO VIAL)																									
SE210071 CP	MANTENIMIENTO VIAL	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	6141	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACION DIRECTA	URB	2021		10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	1,138,353.30	1,138,353.30	1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2411-2-151221-SE210071-0000000-241001 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2411-2-151221-SE210071-0000000-241003 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2411-2-151221-SE210071-0000000-241005 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2411-2-151221-SE210071-0000000-241006 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2411-2-151221-SE210071-0000000-241007 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2411-2-151221-SE210071-0000000-241008 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2421-2-151221-SE210071-0000000-249001 1235040002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-2491-2-151221-SE210071-0000000-249001 Y 1 1235900002 999999-00-1050101-2201-000 K05104005-6181-2-151221-SE210071-0000000-618001	224,023.79	M²	256,500	

SUMA DE HOJA	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1,138,353.30	1,138,353.30
SUBTOTAL	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	1,138,353.30	1,138,353.30
TOTAL	2,031,983.42	18,376,124.56	193,392,227.60	36,286,075.42	702,436.79	228,975,866.23	228,975,865.24	214,496,461.21	84,030,398.49

FORMULÓ _____ FORMULO _____ AUTORIZÓ _____ Vo. Bo. 35,583,638.63 Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Obras Autorizadas	Obras Terminadas	Obras En Proceso	Obras No Iniciadas	Observaciones
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,060,000.00	417,500.00	13.92	52.50	10.00	5.00	1.00	4.00	
OBRA DIVERSA	31,425,471.17	63,359,600.00	63,359,600.00	-	508,657.66	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34	100.00	100.00	1.00	1.00	-	-	
TOTAL	31,425,471.17	66,359,600.00	66,359,600.00	-	508,657.66	65,850,942.34	65,850,942.34	63,910,942.34	63,268,442.34	56.96	76.25	11.00	6.00	1.00	4.00	

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuentas Según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones	
																						Cantidad	Unidad de Medida			
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																										
TG210001 PR	SEMILLA DE MAIZ	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	587,500.00	517,500.00	-	-	517,500.00	517,500.00	517,500.00	100,000.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-4311-1-151221-TG210001-0000000-431001	250.00	HAS	50		
TG210002 PR	SUPLEMENTO ALIMENTICIO	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	420,000.00	-	-	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14109002-4311-1-151221-TG210002-0000000-431001	60.00	TON	50		
TG210003 PR	SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-4311-1-151221-TG210003-0000000-431001	75.00	TON	100		
TG210005 PR	ANALISIS DE SUELOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	225,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	225,000.00	225,000.00	-	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-4311-1-151221-TG210005-0000000-431001	150.00	HAS	50		
TG210004 PR	BIO FERTILIZANTE	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	317,500.00	317,500.00	-	-	317,500.00	317,500.00	317,500.00	317,500.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14109001-4311-1-151221-TG210004-0000000-431001	150.00	PAQUETE	50		
N/A	PROYECTOS PRODUCTIVOS	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	PROYECTO	N/A	
TG210034 PR	PROYECTO DE PANADERIA	POB. NICOLÁS ROMERO	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	1.00	PROYECTO	5	
TG210035 PR	PROYECTO DE COCINA ECONOMICA	POB. CINCO DE FEBRERO	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	1.00	PROYECTO	5	
TG210036 PR	PROYECTO GANADERO	POB. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	1.00	PROYECTO	5	
TG210029 PR	AVES DE TRASPATIO	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	450,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14109002-4311-1-151221-TG210029-0000000-431001	1,000.00	PAQUETE	950		
TG 210033 PR	ADQUISICION DE SEMENTALES	ZONA RURAL	N/A	N/A	4311	MUNICIPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	DIRECCIÓN MUNICIAPL DE DESARROLLO RURAL	CONTRATO	OP	2021	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	20.00	VIENTRE	20	

SUMA DE HOJA	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,060,000.00	417,500.00
SUBTOTAL	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,060,000.00	417,500.00
TOTAL	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	1,060,000.00	417,500.00

FORMULO FORMULO AUTORIZO Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.

C. VALENTE PALOMARES DELFIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL



DURANGO

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS EJERCICIO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Presupuesto Modificado a Noviembre	Ampliación	Cancelación	Presupuesto Modificado a Diciembre	Inversión Autorizada	Devengado	Pagado	# de Cuenta según Registros Contables	Metas		Población	Observaciones
																						Cantidad	Unidad de Medida		
OD210001 CP	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	VICTORIA DE DURANGO	N/A	N/A	5631 5671 5691	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	URB	2021	31,425,471.17	63,359,600.00	63,359,600.00	-	508,657.66	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34	1-1246030001-899999-00-1050101-2202-000-E05101003-5631-00-1050101-2202-000-E05101003-5671-2-140121-00210001-0000000-567001 y 1-1246060002-899999-03-1050101-2202-000-E05101003-5691-2-140121-00210001-0000000-569002	1	LOTE	518,709	

SUMA DE HOJA	31,425,471.17	63,359,600.00	63,359,600.00	-	508,657.66	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34
SUBTOTAL	31,425,471.17	63,359,600.00	63,359,600.00	-	508,657.66	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34	62,850,942.34
TOTAL	31,425,471.17	66,359,600.00	66,359,600.00	-	508,657.66	65,850,942.34	65,850,942.34	63,910,942.34	63,268,442.34

FORMULÓ

FORMULO

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARO. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P. y M.I. ERIKA RUIZ HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HERIBERTO VILLARREAL FLORES
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. y M.I. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL

Anexo Fotográfico



FISM - 2021





FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE



REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO


COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO



AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. CERRO DE GUADALUPE



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

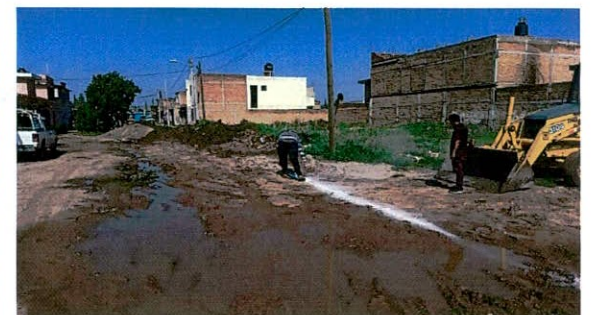


**AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE YUCATÁN
COL. MÉXICO**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**



CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

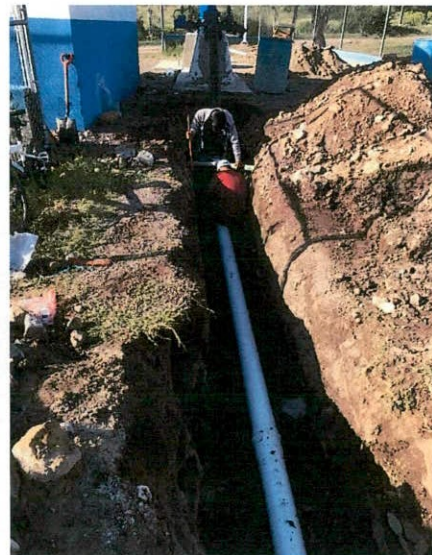

**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE LA VIRGEN A BOSTER ALCALDES
COL. ALCALDES**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ALCANTARILLADO





AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO "COL. LAS HUERTAS"



AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES BAJÍO Y MIRADOR COL. PALMA ALTA





FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ALCANTARILLADO

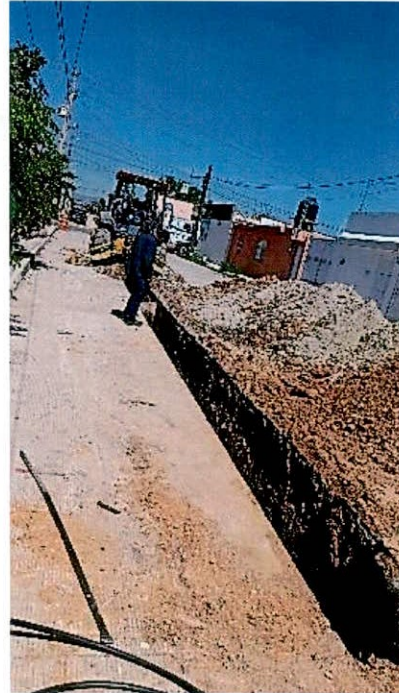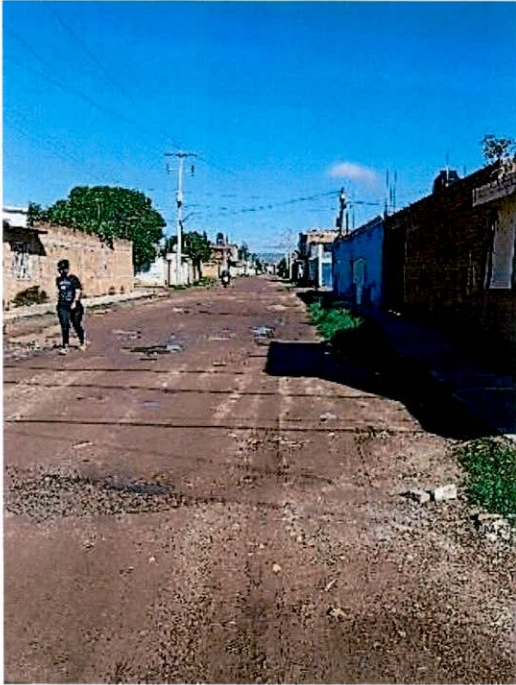

**REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLE LOS CEDROS
COL. LOS SAUCES**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ALCANTARILLADO

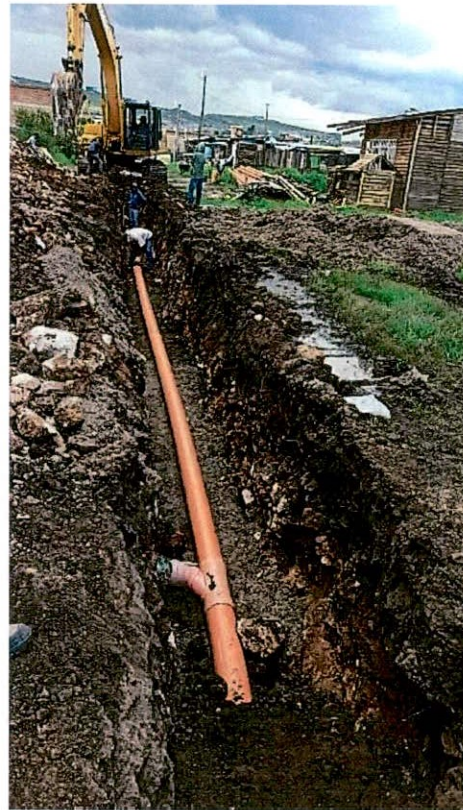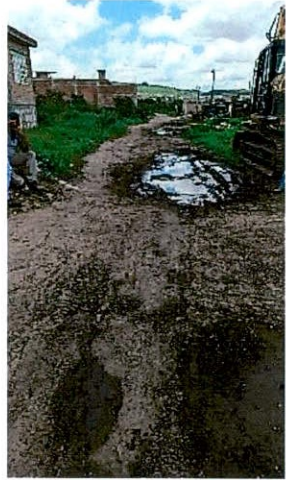

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2da ETAPA

COL. MANUELITO ÁLVAREZ

FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE
DURANGO



AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE YUCATÁN
COL. MÉXICO






FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
GUARNICIONES Y BANQUETAS



C. JAZMÍN DE C. URREA A C. LOS JARDINES, C. LOS JARDINES DE C. JAZMÍN A C. GARDENIA Y C. GARDENIA DE C. LOS JARDINES A C. URREA COL. CHAPULTEPEC

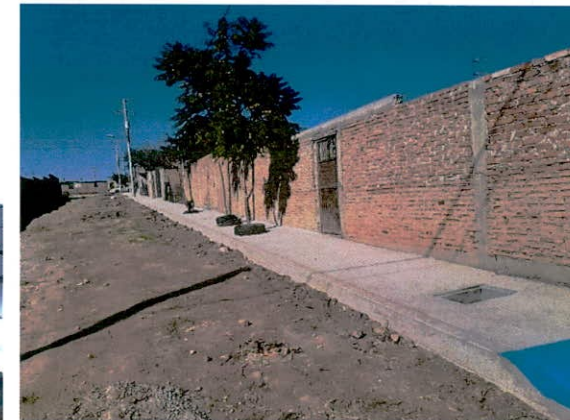


CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PASEO PUEBLO NUEVO, PASEO LOS ÁNGELES Y PASEO LLANO GRANDE COL. PASEO LAS PRADERAS



GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES COL. CÉSAR GUILLERMO MERAZ



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PAVIMENTACIÓN DE CALLES

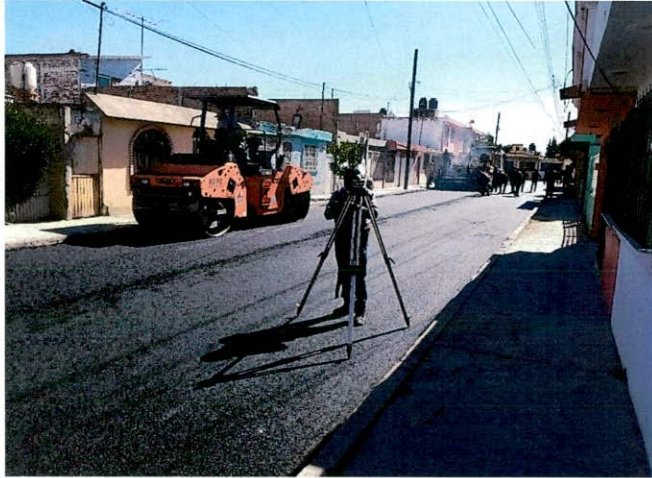


**CIRCUITO BONAMPAK ENTRE PALENQUE Y SANACTE
FRACC. HUIZACHE I**



**LOS PINOS ENTRE CALLE LOS
ALAMOS Y CERRADA
COL. AMPL. EL SALTITO**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PAVIMENTACIÓN DE CALLES

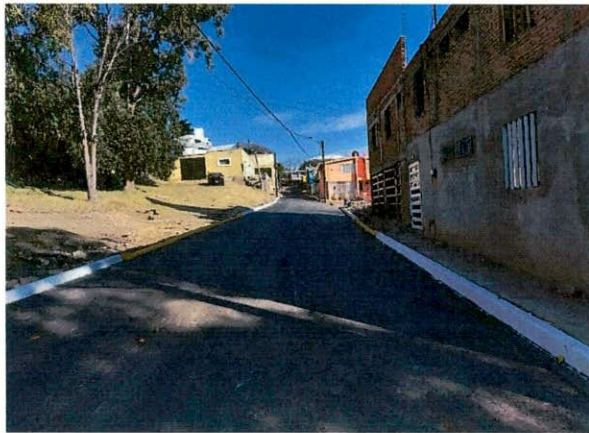


PRIVADA BIRÓN ENTRE JUAN E. GARCÍA HASTA TOPAR
COL. PREDIO LA LOZA



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PAVIMENTACIÓN DE CALLES



**MILÁN ENTRE CALLE CEPellini Y LISBOA
FRACC. ROMA**

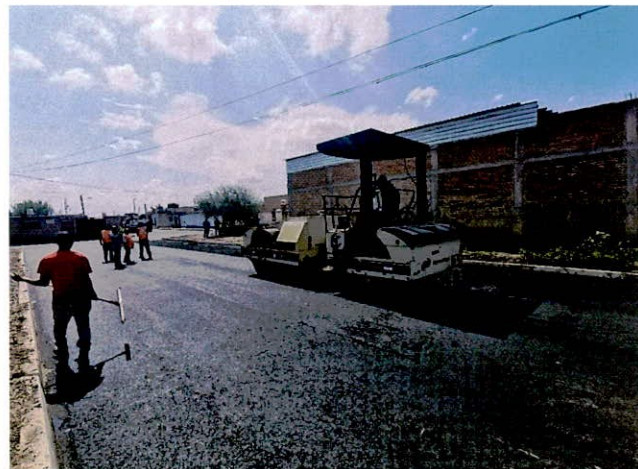

**RINCÓN DE LAS ROSAS ENTRE FRANCISCO ZARCO Y RINCÓN DE LOS LIRIOS
COL. RINCONADA LAS FLORES**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES



**CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA LAUREANO RONCAL
ENTRE BLVD. FELIPE PESCADOR Y EL BLVD. GÓMEZ MORÍN**

**CONSTRUCCIÓN DE CICLO PISTA "PROFR. GUADALUPE G. DE
RODRÍGUEZ", CONEXIÓN CICLO PISTA "DOLORES DEL RÍO" A CICLO
PISTA "LAUREANO RONCAL"
COL. CIÉNEGA**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS




REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL REFUGIO
COL. EL REFUGIO





FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS

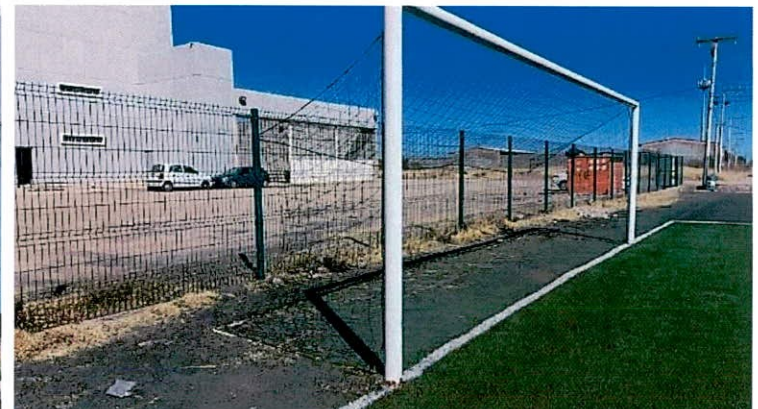

**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GÜERO DE LA PARRA
COL. VALLE FLORIDO**



**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ II**





FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS



**REHABILITACIÓN DE
ESPACIO
MULTIDEPORTIVO
COL. VALLE VERDE**

**REHABILITACIÓN DE
ESPACIO
MULTIDEPORTIVO
COL. CARLOS LUNA**

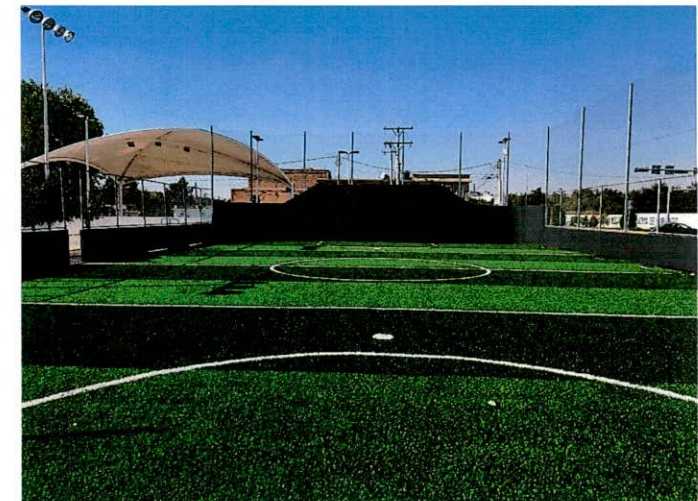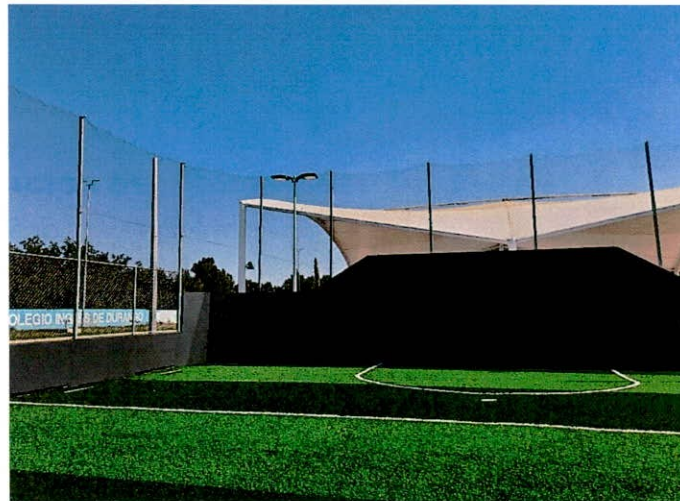



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS



REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
FRACC. VILLAS DEL GUADIANA II



REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
COL. LOMA BONITA II



REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
COL. LUZ DEL CARMEN



REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO
FRACC. CENTAURO DEL NORTE



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



**CUARTO DORMITORIO URBANO
COL. LUZ Y ESPERANZA**



**CUARTO DORMITORIO RURAL
POBLADO LA FERRERÍA**



**CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA BAÑO
POBLADO VILLA MONTEMORELOS**



**CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA BAÑO
COL. LUZ Y ESPERANZA**





FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA




**CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
COL. ALCALDESA**



**CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
COL. GOBERNADORES**



**CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME
POBLADO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA**

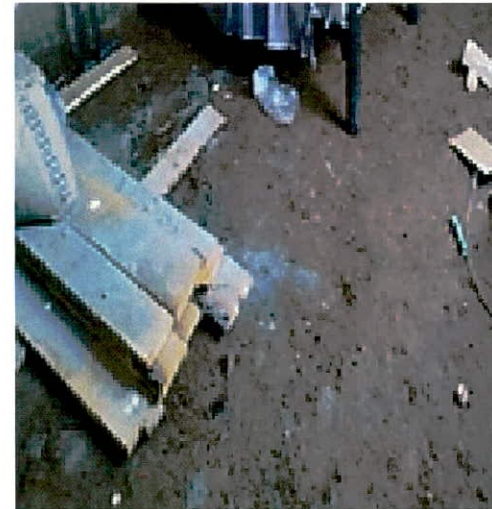

**CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME
POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES**






**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**




MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

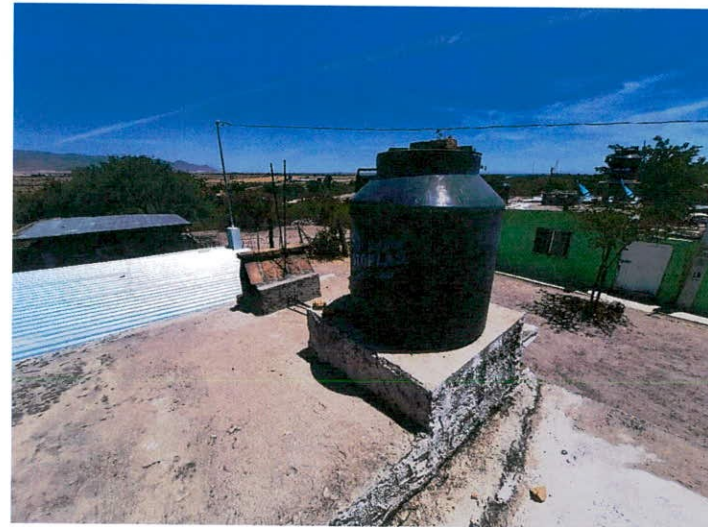

**INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES
FRACC. VALLE DE CRISTO**

**INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES
POBLADO MORCILLO**

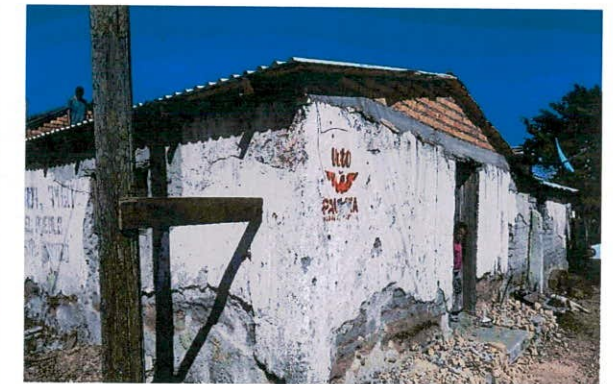

**CONSTRUCCIÓN TECHO LÁMINA
POBLADO SAN ISIDRO**


**CONSTRUCCIÓN TECHO LÁMINA
POBLADO BANDERAS DEL ÁGUILA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

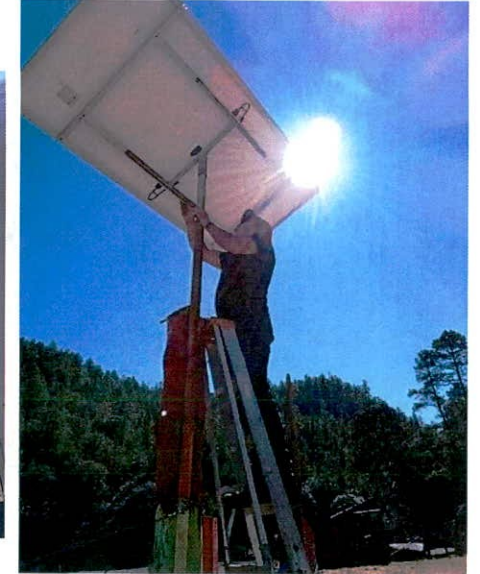

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PÁNELES SOLARES



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS



FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



MÓDULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA



BORDO DE ABREVEDERO POBLADO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA



EQUIPAMIENTO DE POZO POBLADO SANTA LUCÍA



LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO PILAR DE ZARAGOZA



LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO 27 DE NOVIEMBRE



EQUIPAMIENTO DE POZO POBLADO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA
POBLADO SAN BENITO**

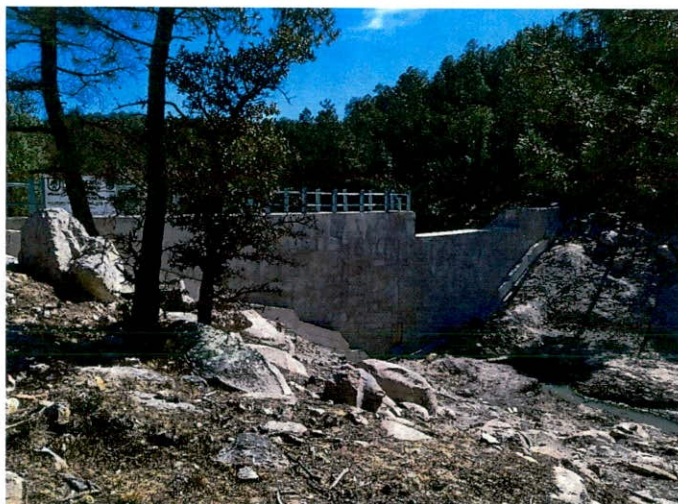

**REHABILITACIÓN DE PRESA
POBLADO OTINAPA - SAN CARLOS**



**REHABILITACIÓN DE BORDO
POBLADO LA LUZ**



**REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO
POBLADO 16 DE SEPTIEMBRE**



**TANQUE DE ALMACENAMIENTO
POBLADO SAN IGNACIO**



**TANQUE DE ALMACENAMIENTO
POBLADO NAVAJAS**





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

CAMINOS RURALES




MUNICIPIO DE
DURANGO

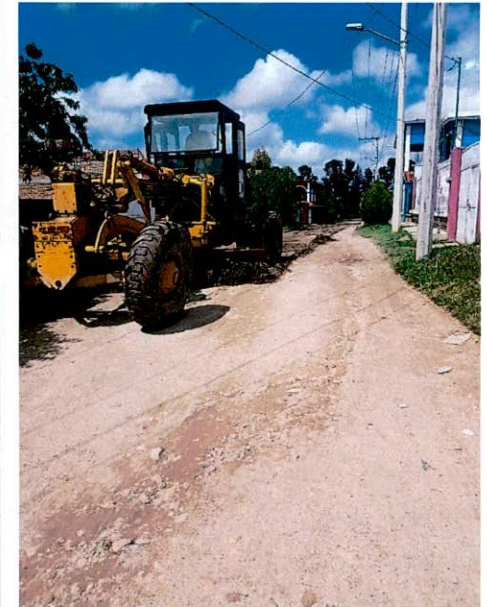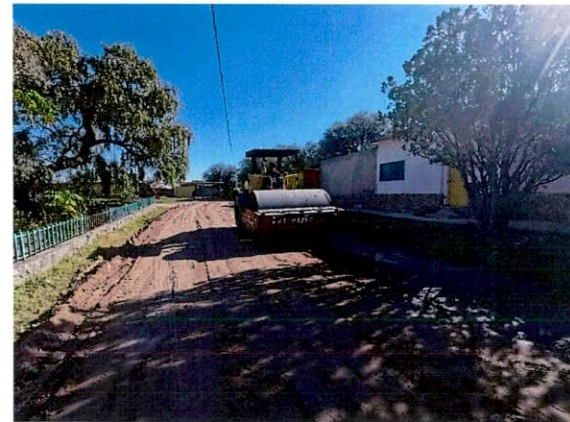

**RASTREO DE CALLES
POBLADO 15 DE SEPTIEMBRE**



PNM - 2021






PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
GUARNICIONES Y BANQUETAS



**21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II
POBLADO EL NAYAR**



**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PAVIMENTACIÓN DE CALLES**

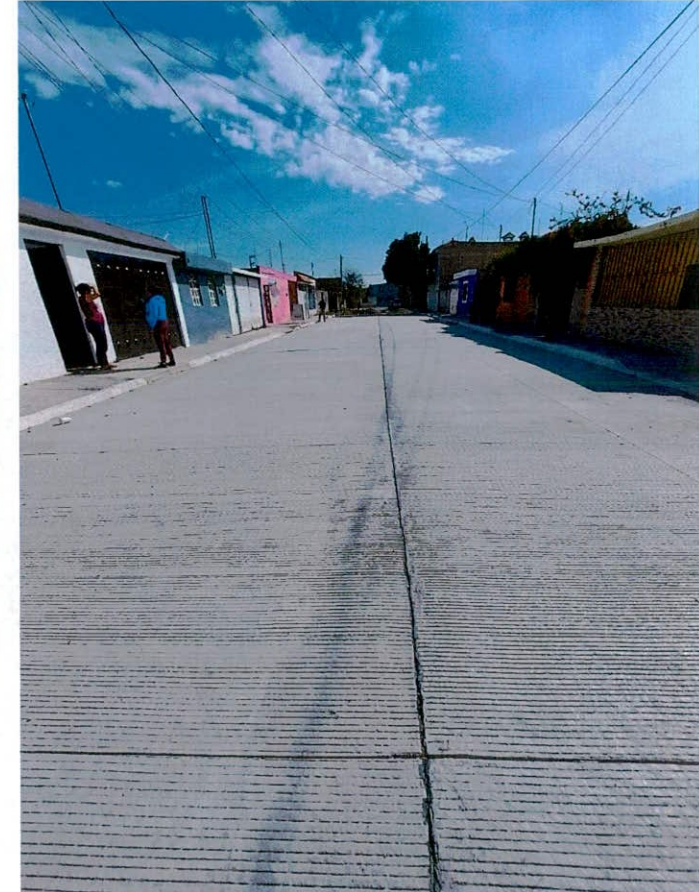

**21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II
POBLADO EL NAYAR**



PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
CONVENIO TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO



JARDINERÍA



CARPINTERÍA



PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
CONVENIO TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO



HERRERÍA



TALLERES Y PLÁTICAS



MUNICIPIO DE DURANGO

PNM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

FOMENTO ECONÓMICO SEMANA DEL EMPRENDEDOR

Foro de reactivación Económica de Durango Capital **EN NÚMEROS**

Estrategia impulsada por la dirección de Fomento Económico del Municipio de Durango, el Consejo para el Desarrollo de Durango (CODEDUR) y la Agencia de Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura en Durango (FIRA)

Más de 370 asistentes	10 Ponencias magistrales
94 consultorías crediticias	5 Entidades financieras presentes
87 asesorías informativas del INEGI	3 Desarrolladores de negocio
70 buscadores de empleo vinculados	10 Empresas locales
60 orientaciones de negocios con 3 productos latos para exportar	6 Empresas empleadoras
13 contratos de maquinaria y equipo	

Feria de Empleo
Exposición productos locales con sello de calidad



FORO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA



EXPO EMPRESARIAL

FERIA DEL EMPLEO

PREMIO EMPRENDEDOR



MUNICIPIO DE
DURANGO

**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**SEMILLA DE MAÍZ
ZONA RURAL**



**SUPLEMENTO ALIMENTICIO
ZONA RURAL**



**SEMILLA DE AVENA
ZONA SIERRA**



Latitud: 24°14'53"
Longitud: -105°2'7"
Elevación: 2419.0616 m
Precisión: 13.4 m
Tiempo: 04-08-2021 13:56
Nota: Muestreo de Suelos
Sebastián Valdez Gallegos
Loc. San Benito sup2 has p

**ANÁLISIS DE SUELOS
ZONA RURAL**



Latitud: 24°11'17"
Longitud: -105°23'1"
Elevación: 2380.2418 m
Precisión: 32.7 m
Tiempo: 04-07-2021 12:19
Nota: Muestreo de Suelo
Fidel González Hernández
Loc.: González Ortega sup



**BIOFERTILIZANTE
ZONA RURAL**
