

MUNICIPIO DE DURANGO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

TOMO II

CIERRE DE EJERCICIO 2023

ANEXO FOTOGRÁFICO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDR	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
8	SD220031 CP.- ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$71,565.90	\$71,565.90	\$71,565.90	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05204001-6141-2-151 222-SD220031-000000 0-614007	Terminada	100%	12	197	OBRA DE CONTINUIDAD
9	SE220052 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RÍO Y FLOR SILVETRE CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$65,445.32	\$65,445.32	\$65,445.32	1-1235040001-999999- 00-1050101-2201-000- K05204001-6141-2-151 222-SE220052-000000 0-614001	Terminada	100%	76	108	OBRA DE CONTINUIDAD
10	SE220074 CP.- GUARNICIONES EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementario	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$157,533.01	\$157,533.01	\$157,533.01	1-1235040001-999999- 00-1050101-2201-000- K05204001-6141-2-151 222-SE220074-000000 0-614001	Terminada	100%	23	197	OBRA DE CONTINUIDAD
11	SE220042 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RÍO Y FLOR SILVESTRE CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$46,991.59	\$46,991.59	\$46,991.59	1-1235040002-999999- 00-1050101-2201-000- K05204005-6141-2-110 222-SE220042-000000 0-614002	Terminada	100%	342	108	OBRA DE CONTINUIDAD
11	SE220042 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RÍO Y FLOR SILVESTRE CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$192,517.00	\$192,517.00	\$192,517.00	1-1235040002-999999- 00-1050101-2201-000- K05204005-6141-2-151 222-SE220042-000000 0-614002	Terminada	100%	342	108	OBRA DE CONTINUIDAD
12	SE220072 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$68,351.83	\$68,351.83	\$68,351.83	1-1235040002-999999- 00-1050101-2201-000- K05204005-6141-2-110 222-SE220072-000000 0-614002	Terminada	100%	1,741	197	OBRA DE CONTINUIDAD
12	SE220072 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$1,238,566.55	\$1,238,566.55	\$1,238,566.55	1-1235040002-999999- 00-1050101-2201-000- K05204005-6141-2-151 222-SE220072-000000 0-614002	Terminada	100%	1,741	197	OBRA DE CONTINUIDAD
13	SE220078 CP.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CONTINUIDAD	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-4250000000-999999- 00-1050101-2201-000- K05204005-6141-2-151 222-SE220078-000000 0-614002	Cancelada	0%	164,178	256,500	OBRA DE CONTINUIDAD
14	OD220004 CP.- REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO CONTINUIDAD	ZONA CENTRO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$0.00	\$375,182.79	\$375,182.79	\$375,182.79	1-1235000003-999999- 00-1050101-2202-000- K05012009-6191-2-151 222-OD220004-000000 0-619003	Terminada	100%	1	256,500	OBRA DE CONTINUIDAD
15	SC220015 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LOPEZ TARSO CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$626,697.25	\$626,697.25	\$626,697.25	1-1235040005-999999- 00-1050101-2203-000- K05202001-6141-2-151 222-SC220015-000000 0-614004	Terminada	100%	244	258	OBRA DE CONTINUIDAD
16	SE220013 CP.- GUARNICIONES EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$2,102.53	\$2,102.53	\$2,102.53	1-1235040001-999999- 00-1050101-2201-000- K05204001-6141-2-151 222-SE220013-000000	Terminada	100%	5	197	OBRA DE CONTINUIDAD

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO CONTINUIDAD														0-614001					
17	SE220007 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO CONTINUIDAD	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$2,135,367.00	\$2,135,367.00	\$2,135,367.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220007-0000000-0-614002	Terminada	100%	2,060	258	OBRA DE CONTINUIDAD
18	QD220001 CP.- REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN CONTINUIDAD	Col. Zona Centro	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$0.00	\$18,262.37	\$18,262.37	\$18,262.37	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05212003-6181-2-151222-OD220001-0000000-0-619903	Terminada	100%	1	40,000	OBRA DE CONTINUIDAD
19	QD220002 CP.- REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LA CATEDRAL DE DURANGO CONTINUIDAD	ZONA CENTRO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$0.00	\$109,391.84	\$109,391.84	\$109,391.84	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05212003-6181-2-151222-OD220002-0000000-0-619903	Terminada	100%	1	40,000	OBRA DE CONTINUIDAD
20	SE220080 CP.- MANTENIMIENTO VIAL III CONTINUIDAD	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2411-2-151222-SE220080-0000000-0-241006; 1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2411-2-151222-SE220080-0000000-241008; 1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2411-2-151222-SE220080-0000000-241008; 1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-3981-2-151222-SE220080-0000000-399001	Cancelada	0%	22,041	256,500	OBRA DE CONTINUIDAD
21	SE210020 CP.- GUARNICIONES CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA CONTINUIDAD	FRACC. FSTE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$3,405.53	\$3,405.53	\$3,405.53	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-140221-SE210020-0000000-0-614001	Terminada	100%	68	30	OBRA DE CONTINUIDAD
21	SE210020 CP.- GUARNICIONES CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA CONTINUIDAD	FRACC. FSTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$11,166.70	\$11,166.70	\$11,166.70	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-151221-SE210020-0000000-0-614001	Terminada	100%	68	30	OBRA DE CONTINUIDAD
22	SE210029 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA CONTINUIDAD	FRACC. FSTE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$23,255.10	\$23,255.10	\$23,255.10	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-140221-SE210029-0000000-0-614002	Terminada	100%	390	54	OBRA DE CONTINUIDAD
22	SE210029 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA CONTINUIDAD	FRACC. FSTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$59,769.16	\$59,769.16	\$59,769.16	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151221-SE210029-0000000-0-614002	Terminada	100%	390	54	OBRA DE CONTINUIDAD
23	SE210061 CP.- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES CONTINUIDAD	COL. RINCÓN DEL LOSO	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$30,560.63	\$30,560.63	\$30,560.63	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151221-SE210061-0000000-0-614011	Terminada	100%	10,438	301	OBRA DE CONTINUIDAD
28	OBRA POR DEFINIR FISM 2023	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$27,709.62	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	0	
29	OBRA POR DEFINIR PNM	VICTORIA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$2,151,988.41	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	0	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials and marks scattered across the bottom.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	2023	DE DURANGO				FEDERALES														
31	OBRA POR DEFINIR RAMO 23 (REPUVE) 2023	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	Rendimientos Financieros REPUVE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$24,628.88	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	0	
32	OBRA POR DEFINIR ANTICIPO FISM 2023	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Bancarios FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	0	
33	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	9000	FISM	No aplica	No aplica	2023	\$0.00	\$21,960,078.79	\$21,960,078.79	\$21,960,078.79	\$21,960,078.79	1-12131020512-999999-00-1030101-4101-000-M03302001-9111-3-25 0323-00000000-000000 0-911012	Terminado	100%	0	0	
34	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	9000	FISM	No aplica	No aplica	2023	\$0.00	\$5,087,906.51	\$5,087,906.51	\$5,087,906.51	\$5,087,906.51	1-5411010012-999999-00-1030101-4101-000-M03302001-9211-1-25 0323-00000000-000000 0-921012	Terminada	100%	0	0	
35	SC230026 CP.- PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$42,054.45	\$152,285.32	\$150,633.34	\$150,633.34	\$150,633.34	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230026-000000 0-614006	Terminada	100%	80	271	
36	SC230027 CP.- PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$39,268.91	\$142,356.27	\$136,823.75	\$136,823.75	\$136,823.75	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230027-000000 0-614006	Terminada	100%	78	272	
37	SC230032 CP.- CALLE CALANDRIAS ENTRE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO JILGUEROS	FRACC. SILVESTRE REVUELTAS	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$109,672.20	\$373,227.32	\$334,082.64	\$334,082.64	\$334,082.64	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230032-000000 0-614006	Terminada	100%	179	173	
38	SC230035 CP.- CALLE 15 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERAZ Y 18 DE MAYO	COL. AMP. MIGUEL DE LA MADRID	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$98,595.50	\$334,268.21	\$294,965.78	\$294,965.78	\$294,965.78	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230035-000000 0-614006	Terminada	100%	155	175	
39	SC230034 CP.- CALLE ROSAS ENTRE ROCÍOS Y LILAS	COL. AMPLIACIÓN LAS PALMAS	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$9,823.80	\$33,202.51	\$33,775.78	\$33,775.78	\$33,775.78	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230034-000000 0-614006	Terminada	100%	15	66	
40	SC230029 CP.- CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$58,877.86	\$215,711.62	\$188,121.60	\$188,121.60	\$188,121.60	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230029-000000 0-614006	Terminada	100%	112	542	
41	SC230028 CP.- CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS	COL. MÉXICO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$21,711.60	\$76,458.01	\$55,315.94	\$55,315.94	\$55,315.94	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230028-000000 0-614006	Terminada	100%	15	183	
42	SC230033 CP.- CALLE GUILLERMO RÍOS ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADANA	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$146,984.49	\$595,739.25	\$464,652.62	\$464,652.62	\$464,652.62	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250 323-SC230033-000000 0-614006	Terminada	100%	255	275	
43	SC230030 CP.- CALLE PASEO DE LAS ARBOLEAS ENTRE REAL	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$199,984.21	\$744,308.46	\$670,862.30	\$571,052.30	\$561,030.43	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250	En proceso	100%	357		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES														323-SC230030-000000-0-614006					
44	SC230031 PR.- CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO Y CANAL DEL POBLADO	LOC. IGNACIO LOPEZ RAYÓN	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$340,243.17	\$1,148,827.38	\$850,342.84	\$850,342.84	\$850,342.84	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250-323-SC230031-000000-0-614006	Terminada	100%	882	711	
45	SC230038 CP.- CALLE COAHUILA ENTRE MEXICO Y 10 DE FEBRERO	COL. MEXICO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$36,604.62	\$122,458.56	\$122,015.40	\$122,015.40	\$122,015.40	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-250-323-SC230038-000000-0-614006	Terminada	100%	25	134	
46	SC230004 CP.- CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISION DURANGO Y MARIANO ARRIETA	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	Directa	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$132,966.70	\$443,061.90	\$422,880.72	\$422,880.72	\$422,880.72	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230004-000000-0-614006	Terminada	100%	194	265	
47	SC230003 CP.- CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	Directa	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$42,832.70	\$153,311.39	\$117,063.95	\$117,063.95	\$117,063.95	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230003-000000-0-614006	Terminada	100%	55	274	
48	SC230006 CP.- CALLE DALIA ENTRE JAZMIN Y CLAVEL	COL. AMPLIACIÓN PRI	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$218,456.38	\$737,676.18	\$654,221.09	\$654,221.09	\$654,221.09	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230006-000000-0-614006	Terminada	100%	450	449	
49	SC230007 CP.- CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 10 DE MAYO Y ARROYO SECO	COL. CONST. ITUJICÓN	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$73,707.03	\$247,084.36	\$242,963.83	\$242,963.83	\$242,963.83	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230007-000000-0-614006	Terminada	100%	49	323	
50	SC230005 CP.- CALLE FELIPE ANCELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESAREO RODRIGUEZ	COL. JOSÉ ÁNGEL LEAL	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$62,304.70	\$212,194.42	\$209,677.05	\$209,677.05	\$209,677.05	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230005-000000-0-614006	Terminada	100%	111	167	
51	SC230001 CP.- CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	COL. JOSÉ REVUELTAS	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$123,210.58	\$411,113.58	\$410,588.22	\$410,588.22	\$410,588.22	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230001-000000-0-614006	Terminada	100%	201	273	
52	SC230009 CP.- AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PROLONGACIÓN TENAZCAL	COL. JUAN SALAZAR	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$172,073.96	\$599,830.45	\$539,311.36	\$539,311.36	\$539,311.36	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230009-000000-0-614006	Terminada	100%	40	391	
53	SC230008 CP.- CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA	COL. SAN CARLOS	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$63,319.48	\$211,654.37	\$192,087.21	\$192,087.21	\$192,087.21	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230008-000000-0-614006	Terminada	100%	40	281	
54	SC230010 CP.- AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRAN	COL. SAN JOSÉ III	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$66,031.44	\$220,883.23	\$203,901.49	\$203,901.49	\$203,901.49	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230010-000000-0-614006	Terminada	100%	44	1,044	
55	SC230062 CP.- CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$12,031.04	\$43,358.28	\$36,052.30	\$36,052.30	\$36,052.30	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230062-000000-0-614006	Terminada	100%	7	31	

pe.


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)


N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
56	SD230019 CP.- PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$145,710.51	\$611,775.59	\$341,832.37	\$341,832.37	\$341,832.37	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230019-000000-0-614007	Terminada	100%	80	271	
57	SD230020 CP.- PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$35,253.46	\$126,129.70	\$126,129.70	\$126,126.70	\$126,126.70	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230020-000000-0-614007	Terminada	100%	78	272	
57	SD230020 CP.- PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$75,571.62	\$0.00	\$183,930.23	\$183,930.23	\$183,930.23	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230020-000000-0-614007	Terminada	100%	78	272	
58	SD230025 CP.- CALLE CALANDRIAS ENTRE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO JILGÜEROS	FRACC. SILVESTRE REVUELTAS	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$236,732.81	\$815,130.72	\$729,076.30	\$729,076.30	\$729,076.30	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230025-000000-0-614007	Terminada	100%	125	178	
59	SD230028 CP.- CALLE 15 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSE RAMÓN HERNÁNDEZ MERÁZ Y 18 DE MAYO	COL. AMP. MIGUEL DE LA MADRID	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$198,388.17	\$684,209.89	\$650,676.02	\$650,676.02	\$650,676.02	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230028-000000-0-614007	Terminada	100%	168	175	
60	SD230027 CP.- CALLE ROSAS ENTRE ROCÍOS Y LILAS	COL. AMPLIACIÓN LAS PALMAS	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$60,684.50	\$278,016.52	\$289,047.11	\$289,047.11	\$289,047.11	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230027-000000-0-614007	Terminada	100%	94	56	
61	SD230022 CP.- CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$145,176.97	\$523,951.05	\$435,463.63	\$435,463.63	\$435,463.63	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230022-000000-0-614007	Terminada	100%	103	542	
62	SD230021 CP.- CALLE CHRUHAHA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS	COL. MÉXICO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$85,594.20	\$315,401.74	\$284,984.43	\$284,984.43	\$284,984.43	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230021-000000-0-614007	Terminada	100%	90	183	
63	SD230026 CP.- CALLE GUILLERMO RIOS ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	Pob. extrema	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$355,954.39	\$1,226,614.47	\$1,128,201.59	\$1,128,201.59	\$1,128,201.59	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230026-000000-0-614007	Terminada	100%	255	275	
64	SD230023 CP.- CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$125,473.57	\$426,747.35	\$426,747.35	\$426,747.35	\$416,159.96	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230023-000000-0-614007	En proceso	100%	65	444	
64	SD230023 CP.- CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$159,564.07	\$0.00	\$409,422.72	\$409,422.72	\$399,265.15	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230023-000000-0-614007	En proceso	100%	65	444	
65	SD230024 PR.- CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO Y CANAL DEL POBLADO	LOC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Directa	Pob. extrema	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$223,567.20	\$760,434.72	\$667,878.97	\$667,878.97	\$667,878.97	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230024-000000-0-614007	Terminada	100%	54	711	
66	SD230021 CP.- CALLE COAHUILA ENTRE MÉXICO Y 10 DE FEBRERO	COL. MÉXICO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$177,638.81	\$607,043.44	\$556,730.02	\$556,730.02	\$556,730.02	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-250-323-SD230021-000000-0-614007	Terminada	100%	115	134	

fa. 













AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

Nº	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
67	SD230001 CP.- CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	Directa	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$297,050.39	\$990,491.37	\$986,180.36	\$986,180.36	\$986,180.36	323-SD230031-000000-0-614007 1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230001-000000-0-614007	Terminada	100%	200	265	
68	SD230002 CP.- CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	Directa	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$87,097.04	\$345,962.27	\$290,038.34	\$290,038.34	\$290,038.34	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230002-000000-0-614007	Terminada	100%	71	274	
69	SD230006 CP.- CALLE DALIA ENTRE JAZMIN Y CLAVEL	COL. AMPLIACIÓN PRI	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$492,677.23	\$1,599,819.86	\$1,540,403.06	\$1,540,403.06	\$1,540,403.06	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230006-000000-0-614007	Terminada	100%	450	449	
70	SD230007 CP.- CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 10 DE MAYO Y ARROYO SECO	COL. CONSTITUCION	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$209,134.82	\$720,701.84	\$696,917.99	\$696,917.99	\$696,917.99	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230007-000000-0-614007	Terminada	100%	49	323	
71	SD230005 CP.- CALLE FELIPE ANGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESAREO RODRIGUEZ	COL. JOSÉ ÁNGEL LEAL	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$153,530.45	\$628,247.79	\$441,945.18	\$441,945.18	\$441,945.18	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230005-000000-0-614007	Terminada	100%	125	167	
72	SD230004 CP.- CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL. JOSÉ REVUELTAS	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$281,456.05	\$939,159.56	\$826,922.78	\$826,922.78	\$826,922.78	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230004-000000-0-614007	Terminada	100%	250	273	
73	SD230008 CP.- AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PROLONGACIÓN TEMAZCAL	COL. JUAN SALAZAR	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$181,404.94	\$625,524.63	\$606,947.64	\$606,947.64	\$606,947.64	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230008-000000-0-614007	Terminada	100%	55	391	
74	SD230009 CP.- CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA	COL. SAN CARLOS	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$290,072.59	\$1,003,656.96	\$884,927.06	\$884,927.06	\$884,927.06	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230009-000000-0-614007	Terminada	100%	158	281	
75	SD230010 CP.- AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTIN Y SAN JUAN DE LETRAN	COL. SAN JOSÉ III	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$65,825.76	\$193,332.00	\$174,918.96	\$174,918.96	\$174,918.96	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230010-000000-0-614007	Terminada	100%	13	1,044	
76	SD230003 CP.- CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$75,014.73	\$272,584.96	\$226,032.74	\$226,032.74	\$226,032.74	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230003-000000-0-614007	Terminada	100%	88	31	
77	SE230046 CP.- GUARNICIONES EN PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCOBIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$9,261.36	\$35,317.34	\$21,220.23	\$21,220.23	\$9,261.36	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230046-000000-0-614001	En proceso	100%	11	272	
78	SE230054 CP.- GUARNICIONES EN CALLE 16 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MENA Y 16 DE MAYO	COL. AMP. MIGUEL DE LA MADRID	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$68,217.58	\$219,616.90	\$194,058.60	\$194,058.60	\$58,217.58	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230054-000000-0-614001	En proceso	100%	404	175	

pe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
79	SE230053 CP.- GUARNICIONES EN CALLE ROSAS ENTRE ROCÍOS Y LILAS	COL. AMPLIACIÓN LAS PALMAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$21,848.83	\$75,085.37	\$311,197.93	\$311,197.93	\$65,483.74	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230053-000000-0-614001	En proceso	100%	128	56	
80	SE230048 CP.- GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES	COL. LOPEZ PORTILLO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$17,545.51	\$59,938.74	\$58,485.04	\$58,485.04	\$17,545.51	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230048-000000-0-614001	En proceso	100%	5	542	
81	SE230047 CP.- GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MEXICO Y ZACATECAS	COL. MEXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$86,306.71	\$294,854.55	\$277,530.00	\$277,530.00	\$277,530.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230047-000000-0-614001	Terminada	100%	195	183	
82	SE230051 CP.- GUARNICIONES EN CALLE GUILLERMO RIOS ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$6,890.41	\$22,982.33	\$22,969.02	\$22,969.02	\$6,890.41	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230051-000000-0-614001	En proceso	100%	41	275	
83	SE230049 CP.- GUARNICIONES EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLADAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$222,460.20	\$764,479.34	\$741,534.22	\$741,534.22	\$222,460.26	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230049-000000-0-614001	En proceso	100%	685	444	
84	SE230050 PR.- GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO Y CANAL DEL POBLADO	LOC. IGNACIO LOPEZ RAYON	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$229,610.77	\$777,836.01	\$720,203.64	\$720,203.64	\$720,203.64	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250-323-SE230050-000000-0-614001	Terminada	100%	1,426	711	
85	SE230052 CP.- GUARNICIONES EN CALLE DALIA ENTRE JAZMIN Y CLAVEL	COL. AMPLIACIÓN PRI	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$89,873.44	\$238,063.69	\$232,911.47	\$232,911.47	\$232,911.47	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230052-000000-0-614001	Terminada	100%	359	449	
86	SE230054 CP.- GUARNICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 10 DE MAYO Y ARROYO SECO	COL. CONSTITUCION	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$4,217.12	\$14,624.29	\$14,055.06	\$14,055.06	\$14,055.06	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230054-000000-0-614001	Terminada	100%	24	323	
87	SE230051 CP.- BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL. JOSE REVUELTAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$3,870.89	\$13,249.05	\$13,236.31	\$13,236.31	\$13,236.31	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230051-000000-0-614001	Terminada	100%	14	273	
88	SE230055 CP.- GUARNICIONES EN AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PROLONGACIÓN TEMAZCAL	COL. JUAN SALAZAR	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$138,862.60	\$478,486.44	\$462,875.34	\$462,875.34	\$462,875.34	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230055-000000-0-614001	Terminada	100%	820	391	
89	SE230056 CP.- GUARNICIONES EN CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA	COL. SAN CARLOS	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$8,209.89	\$21,115.65	\$20,584.54	\$20,584.54	\$20,584.54	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230056-000000-0-614001	Terminada	100%	36	281	
90	SE230057 CP.- GUARNICIONES EN AVENIDA SAN JOSE ENTRE SAN VALENTIN Y SAN JUAN DE LETRAN	COL. SAN JOSE III	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$109,447.18	\$372,279.76	\$364,823.95	\$364,823.95	\$364,823.95	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230057-000000-0-614001	Terminada	100%	828	1,044	
91	SE230062 CP.-	COL.	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno	Contrato	Urbanización	2023	\$4,192.71	\$14,984.37	\$12,457.12	\$12,457.12	\$12,457.12	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120-123-SE230062-000000-0-614001	Terminada	100%	25		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	GUARNICIONES EN CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES	UNIVERSAL				(Credito Banobras FISM)									00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-120123-SE230002-000000-0-614001					
92	SE230033 CP.- PAVIMENTO EN PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUAREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$27,045.12	\$0.00	\$90,150.41	\$90,150.41	\$90,150.41	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110223-SE230033-000000-0-614002	Terminada	100%	620	271	
92	SE230033 CP.- PAVIMENTO EN PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUAREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$219,942.30	\$764,836.15	\$733,141.00	\$733,141.00	\$733,141.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230033-000000-0-614002	Terminada	100%	620	271	
93	SE230034 CP.- PAVIMENTO EN PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUAREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$48,504.73	\$0.00	\$161,682.43	\$161,682.43	\$87,437.12	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110223-SE230034-000000-0-614002	En proceso	100%	596	272	
93	SE230034 CP.- PAVIMENTO EN PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUAREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$197,962.38	\$662,942.39	\$659,874.64	\$659,874.64	\$356,857.15	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230034-000000-0-614002	En proceso	100%	596	272	
94	SE230039 CP.- PAVIMENTO EN CALLE CALANDRIAS ENTRE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO JILGUEROS	FRACC. SILVESTRE REVUELTAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$71,442.29	\$0.00	\$238,140.95	\$238,140.95	\$238,140.95	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110223-SE230039-000000-0-614002	Terminada	100%	1,232	178	
94	SE230039 CP.- PAVIMENTO EN CALLE CALANDRIAS ENTRE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO JILGUEROS	FRACC. SILVESTRE REVUELTAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$419,221.79	\$1,441,309.26	\$1,384,072.63	\$1,384,072.63	\$1,384,072.63	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230039-000000-0-614002	Terminada	100%	1,232	178	
95	SE230042 CP.- PAVIMENTO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERÁZ Y 18 DE MAYO	COL. AMP. MIGUEL DE LA MADRID	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$920,328.38	\$3,142,771.53	\$3,067,574.62	\$3,067,574.62	\$1,713,927.84	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230042-000000-0-614002	En proceso	100%	2,174	175	
96	SE230041 CP.- PAVIMENTO EN CALLE ROSAS ENTRE RÓCIOS Y LILAS	COL. AMPLIACIÓN LAS PALMAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$433,271.42	\$1,493,248.89	\$1,202,394.64	\$1,202,394.64	\$1,030,168.33	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230041-000000-0-614002	En proceso	100%	713	56	
97	SE230035 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$37,428.78	\$0.00	\$124,746.68	\$124,746.68	\$69,516.55	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110223-SE230035-000000-0-614002	En proceso	100%	1,270	542	
97	SE230035 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$459,608.85	\$1,594,224.13	\$1,531,915.72	\$1,531,915.72	\$853,665.72	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230035-000000-0-614002	En proceso	100%	1,270	542	
98	SE230035 CP.- PAVIMENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MEXICO Y ZACATECAS	COL. MEXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$35,399.35	\$0.00	\$117,948.02	\$117,948.02	\$117,948.02	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110223-SE230035-000000-0-614002	Terminada	100%	685	183	
98	SE230035 CP.- PAVIMENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MEXICO Y ZACATECAS	COL. MEXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$235,800.02	\$819,345.76	\$785,868.18	\$785,868.18	\$785,868.18	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250323-SE230035-000000-0-614002	Terminada	100%	685	183	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

Nº	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
99	SE230040 CP.- PAVIMENTO EN CALLE GUILLERMO RIOS ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	Pobreza extrema	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$53,827.87	\$0.00	\$174,428.99	\$174,428.99	\$95,553.12	0-614002 1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230040-000000-0-614002	En proceso	100%	1,963	275	
99	SE230040 CP.- PAVIMENTO EN CALLE GUILLERMO RIOS ENTRE IGNACIO LOPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$724,031.58	\$2,524,340.25	\$2,346,221.08	\$2,346,221.08	\$1,285,272.31	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250-323-SE230040-000000-0-614002	En proceso	100%	1,963	275	
100	SE230037 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$87,248.44	\$0.00	\$290,826.14	\$290,826.14	\$87,248.44	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230037-000000-0-614002	En proceso	100%	2,425	444	
100	SE230037 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$869,423.09	\$3,017,599.42	\$2,898,076.96	\$2,898,076.95	\$869,423.09	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250-323-SE230037-000000-0-614002	En proceso	100%	2,425	444	
101	SE230038 PR.- PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO Y CANAL DEL POBLADO (PAVIMENTO ASFALTICO)	LOC. IGNACIO LOPEZ RAYON	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$812,751.89	\$2,784,752.57	\$2,801,935.86	\$2,801,935.86	\$2,801,935.86	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250-323-SE230038-000000-0-614002	Terminada	100%	5,390	711	
102	SE230045 CP.- PAVIMENTO EN CALLE COAHUILA ENTRE MEXICO Y 18 DE FEBRERO	COL. MEXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$26,562.00	\$0.00	\$88,026.38	\$88,026.38	\$88,026.38	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230045-000000-0-614002	Terminada	100%	715	134	
102	SE230045 CP.- PAVIMENTO EN CALLE COAHUILA ENTRE MEXICO Y 18 DE FEBRERO	COL. MEXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$250,125.46	\$851,857.75	\$828,915.02	\$828,915.02	\$828,915.02	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-250-323-SE230045-000000-0-614002	Terminada	100%	715	134	
103	SE230008 CP.- PAVIMENTO EN CALLE JOSE ARRIETA ENTRE AV. DIVISION DURANGO Y MARIANO ARRIETA	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	Complementaria	Pobreza extrema	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$92,877.82	\$0.00	\$306,802.50	\$306,802.50	\$306,802.50	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230008-000000-0-614002	Terminada	100%	1,972	265	
103	SE230008 CP.- PAVIMENTO EN CALLE JOSE ARRIETA ENTRE AV. DIVISION DURANGO Y MARIANO ARRIETA	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	Complementaria	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$709,869.12	\$2,366,970.50	\$2,344,904.51	\$2,344,904.51	\$2,344,904.51	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230008-000000-0-614002	Terminada	100%	1,972	265	
104	SE230009 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA.	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	Complementaria	Pobreza extrema	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$28,041.82	\$0.00	\$93,472.72	\$93,472.72	\$93,472.72	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230009-000000-0-614002	Terminada	100%	550	274	
104	SE230009 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA.	FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	Complementaria	Pobreza extrema	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$190,182.43	\$669,516.14	\$633,941.46	\$633,941.46	\$633,941.46	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230009-000000-0-614002	Terminada	100%	550	274	
105	SE230013 CP.- PAVIMENTO EN CALLE DALIA ENTRE JAZMIN Y CLAVEL	COL. AMPLIACION PRI	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$1,469,112.79	\$5,015,017.37	\$4,431,456.34	\$4,431,456.34	\$4,431,456.34	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230013-000000-0-614002	Terminada	100%	3,342	449	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
106	SE230014 CP - PAVIMENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 10 DE MAYO Y ARROYO SECO	COL CONSTITUCIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$125,245.75	\$0.00	\$417,485.82	\$417,485.82	\$417,485.82	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230014-000000-0-614002	Terminada	100%	1,627	323	
106	SE230014 CP - PAVIMENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 10 DE MAYO Y ARROYO SECO	COL CONSTITUCIÓN	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$521,017.13	\$1,809,115.35	\$1,736,723.77	\$1,736,723.77	\$1,736,723.77	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230014-000000-0-614002	Terminada	100%	1,627	323	
107	SE230012 CP - PAVIMENTO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESAREO RODRIGUEZ	COL JOSÉ ANGEL LEAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$27,690.42	\$0.00	\$92,201.41	\$92,201.41	\$92,201.41	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230012-000000-0-614002	Terminada	100%	920	167	
107	SE230012 CP - PAVIMENTO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESAREO RODRIGUEZ	COL JOSÉ ANGEL LEAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$337,734.85	\$1,173,017.96	\$1,125,782.83	\$1,125,782.83	\$1,125,782.83	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230012-000000-0-614002	Terminada	100%	920	167	
108	SE230010 CP - PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL JOSÉ REVUELTAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$56,453.52	\$0.00	\$188,278.40	\$188,278.40	\$188,278.40	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230010-000000-0-614002	Terminada	100%	1,974	273	
108	SE230010 CP - PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDIA	COL JOSÉ REVUELTAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$750,423.89	\$2,501,824.46	\$2,501,412.97	\$2,501,412.97	\$2,501,412.97	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230010-000000-0-614002	Terminada	100%	1,974	273	
109	SE230015 CP - PAVIMENTO EN AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PROLONGACIÓN TEMAZCAL	COL JUAN SALAZAR	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$1,660,583.89	\$5,745,800.07	\$5,010,643.05	\$5,010,643.05	\$5,010,643.05	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230015-000000-0-614002	Terminada	100%	3,709	391	
110	SE230016 CP - PAVIMENTO EN CALLE MIRASOL ENTRE ZAPIRO Y CAMINO A LA LOMA	COL SAN CARLOS	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$745,396.53	\$2,588,620.15	\$2,420,921.69	\$2,420,921.69	\$2,420,921.69	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230016-000000-0-614002	Terminada	100%	1,679	281	
111	SE230017 CP - PAVIMENTO EN AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN	COL SAN JOSÉ III	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$3,051,547.69	\$10,563,843.35	\$10,255,509.12	\$10,255,509.12	\$10,255,509.12	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230017-000000-0-614002	Terminada	100%	6,577	1,044	
112	SE230011 CP - PAVIMENTO EN CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL UNIVERSAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$10,305.74	\$0.00	\$35,057.63	\$35,057.63	\$35,057.63	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230011-000000-0-614002	Terminada	100%	518	31	
112	SE230011 CP - PAVIMENTO EN CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL UNIVERSAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$206,191.47	\$723,800.87	\$701,447.25	\$701,447.25	\$701,447.25	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230011-000000-0-614002	Terminada	100%	518	31	
113	SE230058 CP - REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO "JARDINES DE CANGUN"	COL JARDINES DE CANGUN	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$627,607.17	\$2,113,786.90	\$2,367,023.88	\$2,367,023.88	\$2,036,820.67	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-323-SE230055-000000-0-614004	En proceso	100%	1	4,260	
114	SE230059 CP - REHABILITACIÓN EN ESPACIO	COL ARTURO GARCÍA	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$755,091.50	\$2,049,056.34	\$2,005,071.65	\$2,005,071.65	\$1,545,741.30	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-323-SE230055-000000-0-614004	En proceso	100%	1	4,260	

pa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	MULTIDEPORATIVO "ARTURO GÁMIZ"														323-SE230059-000000-0-614004					
115	SE230060 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "ABRAHAM GONZÁLEZ"	LOC. ABRAHAM GONZÁLEZ	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$293,767.45	\$0.00	\$979,224.84	\$979,224.84	\$886,365.44	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230060-000000-0-614004	En proceso	100%	1	934	
115	SE230060 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "ABRAHAM GONZÁLEZ"	LOC. ABRAHAM GONZÁLEZ	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$293,767.45	\$1,000,000.00	\$979,224.84	\$979,224.84	\$886,365.43	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230060-000000-0-614004	En proceso	100%	1	934	
116	SE230062 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "SANTIAGO BAYACORA"	LOC. SANTIAGO BAYACORA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$296,249.55	\$0.00	\$987,498.48	\$987,498.48	\$296,249.55	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230062-000000-0-614004	En proceso	100%	1	1,418	
116	SE230062 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "SANTIAGO BAYACORA"	LOC. SANTIAGO BAYACORA	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$296,249.55	\$1,000,000.00	\$987,498.47	\$987,498.47	\$473,952.95	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230062-000000-0-614004	En proceso	100%	1	1,418	
117	SE230061 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "LLANO GRANDE"	LOC. LLANO GRANDE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$293,809.69	\$0.00	\$979,365.62	\$979,365.62	\$293,809.69	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230061-000000-0-614004	En proceso	100%	1	1,707	
117	SE230061 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "LLANO GRANDE"	LOC. LLANO GRANDE	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$293,809.69	\$1,000,000.00	\$979,365.63	\$979,365.63	\$484,873.56	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230061-000000-0-614004	En proceso	100%	1	1,707	
118	SE230063 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "MORCILLO"	LOC. MORCILLO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$296,965.32	\$0.00	\$989,551.04	\$989,551.04	\$559,768.95	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230063-000000-0-614004	En proceso	100%	1	1,143	
118	SE230063 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO "MORCILLO"	LOC. MORCILLO	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$296,965.32	\$1,000,000.00	\$989,551.05	\$989,551.05	\$559,768.96	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-250-723-SE230063-000000-0-614004	En proceso	100%	1	1,143	
119	SC230012 CP.- REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 586.40 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC RD.32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 63 TOMAS DOMICILIARIAS.	COL. PALMA ALTA	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$278,225.93	\$941,646.00	\$927,419.76	\$927,419.76	\$927,419.76	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120-123-SC230012-000000-0-613001	Terminada	100%	586	252	
120	SC230011 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON 1,472.90 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC RD.32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 58 TOMAS DOMICILIARIAS.	COL. PALMA NUEVA	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$423,809.07	\$1,417,364.00	\$1,412,696.93	\$1,412,696.93	\$1,412,696.93	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120-123-SC230011-000000-0-613001	Terminada	100%	1,472	232	
121	SC230016 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON 1,893.75 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC RD.32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 88 TOMAS	COL. BAJIO BORADO	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$522,297.76	\$1,748,292.00	\$1,740,592.53	\$1,740,992.53	\$1,740,992.53	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120-123-SC230016-000000-0-613001	Terminada	100%	1,893	352	

pa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
DOMICILIARIAS																				
122	SC230015 CP.- REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 185 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC RD-32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PASEO DE LA FLOR	COL. CAMPO ALEGRE	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$180,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120-123-SC230015-000000-0-613001	Cancelada	0%	185	40	
123	SC230013 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON 49.00 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC RD-32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE LEONA VICARIO	COL. MORGA	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$11,777.84	\$39,117.36	\$39,259.47	\$39,259.47	\$39,259.47	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120-123-SC230013-000000-0-613001	Terminada	100%	49	28	
124	SC230014 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON 399.00 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC RD-32.5 DE 3" DE DIÁMETRO Y 25 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE VALLE VERDE	COL. MANUEL ALVAREZ	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$83,800.86	\$296,726.79	\$279,336.17	\$279,336.17	\$279,336.17	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120-123-SC230014-000000-0-613001	Terminada	100%	399	52	
125	SC230042 CP.- CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO A 200 MTS. CON ADEME DE 12" DE DIÁMETRO ZONA ORIENTE	Frac. Unidad Habitacional Labor de Guadalupe	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$1,181,159.72	\$6,802,831.00	\$6,793,040.80	\$6,793,040.80	\$6,793,040.80	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-250-323-SC230042-000000-0-613001	Terminada	100%	2,500	16	
126	SD230033 CP.- Construcción de Subcolector Sanitario La Virgen con 274.00 metros lineales de tubería para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro en C. Dalia desde C. Cempulá a Av. Nelly Campobello	COL. LA VIRGEN	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$311,657.65	\$1,066,021.00	\$1,169,519.80	\$1,169,519.80	\$1,169,519.80	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-250-323-SD230033-000000-0-613002	Terminada	100%	274	2,340	
127	SD230034 CP.- Construcción de Subcolector Sanitario San Fernando con 374.99 metros lineales de tubería para Alcantarillado serie 20 de 18" de diámetro en Callejón de Sorvidumbre desde C. Talbarteros a C. Petronillo Hernández	FRACC. SAN FERNANDO	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$608,584.21	\$1,725,388.00	\$1,696,280.69	\$1,696,280.69	\$1,696,280.69	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-250-323-SD230034-000000-0-613002	Terminada	100%	375	3,240	
128	SD230035 CP.- Construcción de Subcolector Sanitario Xicotencatl con 893.00 metros de Tubería para Alcantarillado serie 20 de 18" de diámetro en C. Xicotencatl desde el Blvd. Politécnico a calle Juan Escutia	COL. EL REFUGIO	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$1,051,762.53	\$3,946,975.00	\$3,505,875.10	\$3,605,875.10	\$3,505,875.10	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-250-323-SD230035-000000-0-613002	Terminada	100%	893	2,976	
129	SD230036 CP.- Construcción de Colector Sanitario Poteros del Refugio con 859.99 metros lineales de tubería pvc serie 20 de 315 mm de diámetro por Avenida Primo de Verdud y Avenida las Granjas, tramo de calle Refugio	COL. PRIMERO DE MAYO	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$850,458.89	\$2,803,073.10	\$2,634,863.10	\$2,634,863.10	\$2,634,863.10	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-250-323-SD230036-000000-0-613002	Terminada	100%	810	2,142	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
130	SD230032 CP.- Rehabilitación del Colector Sanitario con 821.20 metros de tubería pvc de 18" de Diámetro en Avenida Mercurio	COL. 20 DE NOVIEMBRE	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$1,070,122.82	\$3,573,634.00	\$3,567,076.07	\$3,567,076.07	\$3,567,076.07	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302001-6131-2-250323-SD230032-000000-0-613002	Terminada	100%	821	3,052	
131	SD230012 CP.- Construcción de Sub Colector Sanitario con 317.22, 140.72, 367.70 y 483.16 metros lineales de tubería de 200 mm, 315 mm, 400 mm y 530 mm de diámetro y 14 descargas domiciliarias	COL. LIBERACION SOCIAL Y PEDRO AVILA NEVAREZ	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$1,452,002.34	\$3,847,019.20	\$3,907,571.19	\$3,907,571.19	\$3,907,571.19	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-120123-SD230012-000000-0-613002	Terminada	100%	1,307	200	
132	SD230038 CP.- Construcción de Colector Pluvial San Angel con 138.50 y 972.40 M de tubería PVC serie 20 de 8" y 18" de diámetro respectivamente en calle Anarómida y Calle El Pino	FRACC. SAN ANGEL	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	\$1,218,844.55	\$6,177,282.50	\$4,062,815.17	\$4,062,815.17	\$4,062,815.17	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-250323-SD230038-000000-0-613002	Terminada	100%	1,111	2,750	
133	SD230016 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 60.00 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE LEONA VICARIO	COL. MORGA	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$44,369.47	\$117,259.00	\$148,079.48	\$148,079.48	\$148,079.48	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-120123-SD230016-000000-0-613002	Terminada	100%	60	28	
134	SD230011 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 1123.44 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO Y 56 DESCARGAS DOMICILIARIAS	COL. BAJIO DORADO	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$618,639.99	\$2,063,606.00	\$2,062,133.29	\$2,062,133.29	\$2,062,133.29	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-120123-SD230011-000000-0-613002	Terminada	100%	1,123	224	
135	SD230014 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 711.45 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO Y 45 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLES DE LA COLONIA	COL. FOS LA VIRGEN II	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$0.00	\$2,188,593.81	\$2,180,925.48	\$2,180,925.48	\$2,180,925.48	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302003-6131-2-120123-SD230014-000000-0-613002	Terminada	100%	711	180	
136	SD230018 CP.- REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 742.26 Y 146.63 METROS LINEALES DE TUBERÍA Y PVC SERIE 20 DE 8" Y 12" DE DIAMETRO Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS	COL. MENDEZ ARCEO	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$844,726.14	\$2,825,000.00	\$2,815,753.79	\$2,815,753.79	\$2,815,753.79	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302001-6131-2-120123-SD230018-000000-0-613002	Terminada	100%	885	508	
137	SD230013 CP.- Rehabilitación de Red de Alcantarillado con 74 metros lineales de tubería para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro y 3 descargas domiciliarias en calle Granada	COL. ANTONIO RAMIREZ	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$42,174.61	\$174,722.00	\$149,619.70	\$149,619.70	\$149,619.70	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302001-6131-2-120123-SD230013-000000-0-613002	Terminada	100%	74	112	
138	SD230017 CP.- REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 77.19 METROS LINEALES DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SERIE	COL. ANARÓMIDA	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$64,106.00	\$203,056.30	\$189,009.31	\$199,009.31	\$199,009.31	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302001-6131-2-120123-SD230017-000000-0-613002	Terminada	100%	77	68	

ka.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)


N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
139	20 DE 8" DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TEXCOCO																			
139	SD230915 CP.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON 53.00 METROS LINEALES DE TUBERIA SERIE 20 DE 5" DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA CALLE FRANCISCO DE IBARRA	COL. GOBERNADORES	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Credito Bancarias FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$46,892.67	\$164,379.37	\$161,767.32	\$161,767.32	\$161,767.32	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302002-6131-2-120123-SD230915-0000000-613002	Terminada	100%	53	24	
140	SD230037 CP.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON 64 METROS LINEALES DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA DE LA COL. GOBERNADORES.	COL. GOBERNADORES	Directa	ZAP Urbana	513	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$73,292.15	\$217,323.09	\$244,306.26	\$244,306.26	\$244,306.26	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03302002-6131-2-250323-SD230037-0000000-613002	Terminada	100%	64	32	
141	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO URBANO	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISE	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	100	370	
141	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO URBANO	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$10,633,129.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	100	370	
142	SH230006 PR.- Construcción de Cuarto Dormitorio Rural	ZONA RURAL	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$721,606.73	\$2,406,600.00	\$2,405,355.75	\$2,405,355.75	\$2,405,355.75	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250323-SH230006-0000000-619007	Terminada	100%	18	72	
143	SH230007 CP.- Construcción de Cuarto para Baño	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$651,732.93	\$2,172,600.00	\$2,172,443.10	\$2,172,443.10	\$2,172,443.10	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250323-SH230007-0000000-619007	Terminada	100%	18	72	
144	SH230008 CP.- Construcción de Techo Firme	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$279,735.18	\$660,000.00	\$559,470.35	\$559,470.35	\$559,470.35	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250323-SH230008-0000000-619007	Terminada	100%	14	55	
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISE	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	489	972	
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$4,474,605.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	489	972	
146	SC230045 PR.- Construcción de Líneas de Conducción	LOC. COLONIA HIDALGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-06-1140101-2203-000-K114301003-6131-2-250323-SC230045-0000000-613001	En proceso	100%	700	90	
147	SC230054 PR.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	LOC. VALLE FLORIDO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$117,854.70	\$392,849.00	\$392,849.00	\$392,849.00	\$117,854.70	1-1235030001-999999-06-1140101-2203-000-K114301003-6131-2-250323-SC230054-0000000-613001	En proceso	100%	1,000	40	

pa. 











AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
148	SC230049 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN. POB. RIO VERDE	LOC. RIO VERDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$135,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$449,999.99	\$135,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230049-0000000-613001	En proceso	100%	1,000	60	
149	SC230046 PR.- LINEA DE CONDUCCIÓN. POB. LA BAYAS	LOC. LAS BAYAS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$123,592.50	\$220,000.00	\$411,975.00	\$411,975.00	\$123,592.50	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230046-0000000-613001	En proceso	100%	1,000	30	
150	SC230052 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOC. DOLORES HIDALGO	LOC. DOLORES HIDALGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230052-0000000-613001	En proceso	100%	1,000	75	
151	SC230053 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOC. GABINO SANTILLAN	LOC. GABINO SANTILLAN	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$153,000.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$510,000.00	\$153,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230053-0000000-613001	En proceso	100%	1,000	65	
152	SC230050 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN. POB. FRANCISCO MONTES DE OCA	LOC. FCO. MONTES DE OCA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$570,987.00	\$570,987.00	\$570,987.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230050-0000000-613001	En proceso	100%	1,000	85	
153	SC230021 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN	LOC. LOS LOBOS	Directa	Dos grados de rezago	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$34,758.65	\$115,862.19	\$115,862.19	\$115,862.19	\$115,862.19	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-120123-SC230021-0000000-613001	Terminada	100%	500	30	
154	SC230020 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN	LOC. EL CARRIZO	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$69,316.69	\$231,055.66	\$229,130.78	\$229,130.78	\$229,130.78	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-120123-SC230020-0000000-613001	Terminada	100%	810	45	
155	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. LLANO GRANDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$385,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	65	
156	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. NAVAJAS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	75	
157	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. HÉROE DE NACÓZARI	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	60	
158	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. ABRAHAM GONZÁLEZ	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	50	
159	SC230044 PR.- Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	LOC. LOS ARTICULOS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230044-0000000-613001	Cancelada	%	1	40	
160	SC230018 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. LA LUZ	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$238,322.00	\$238,322.00	\$238,322.00	\$238,322.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-120123-SC230018-0000000-613001	Terminada	100%	1	60	


AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)


N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
161	SC230017 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. EL NAYAR	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$185,368.00	\$185,368.00	\$185,368.00	\$185,368.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-120123-SC230017-0000000-613001	Terminada	100%	1	120	
162	SC230019 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. SAN JOSE DE ANIMAS	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$113,390.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-120123-SC230019-0000000-613001	Terminada	100%	1	60	
163	SC230024 PR.- REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	LOC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (GARABITOS VIFJO)	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$148,820.70	\$496,069.95	\$496,069.00	\$496,069.00	\$496,069.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-120123-SC230024-0000000-613001	Terminada	100%	1	70	
164	SC230039 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA	LOC. SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$105,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$105,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-250323-SC230039-0000000-613001	En proceso	100%	1	28	
165	SC230040 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA	LOC. OTINAPA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$105,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$105,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-250323-SC230040-0000000-613001	En proceso	100%	1	45	
166	SC230041 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA	LOC. UNIÓN DE RODRIGUEZ	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-250323-SC230041-0000000-613001	En proceso	100%	1	22	
167	SC230051 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. PRIMERO DE MAYO	LOC. PRIMERO DE MAYO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$192,542.85	\$250,069.59	\$641,809.59	\$641,809.57	\$192,542.85	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230051-0000000-613001	En proceso	100%	1	65	
168	SC230025 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	LOC. JESÚS GONZÁLEZ CRUEGA	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$18,847.14	\$62,823.87	\$62,823.87	\$62,823.87	\$62,823.87	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-120123-SC230025-0000000-613001	Terminada	100%	1	50	
169	SC230022 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	LOC. 20 DE NOVIEMBRE	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$95,450.34	\$95,450.35	\$95,450.35	\$95,450.34	\$95,450.34	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-120123-SC230022-0000000-613001	Terminada	100%	1	120	
170	SC230023 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	LOC. EL GARMEN Y ANEXOS	Directa	Pobreza extrema	613	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$25,725.07	\$85,750.25	\$85,750.25	\$85,750.25	\$85,750.25	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-120123-SC230023-0000000-613001	Terminada	100%	1	80	
171	SC230065 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. SALVADOR ALLENDE	LOC. SALVADOR ALLENDE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$78,456.30	\$170,000.00	\$261,521.00	\$261,521.00	\$78,456.30	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230065-0000000-613001	En proceso	100%	1	20	
172	SC230066 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. NAVAJAS	LOC. NAVAJAS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$55,833.90	\$170,000.00	\$186,113.99	\$186,113.00	\$55,833.90	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250323-SC230066-0000000-613001	En proceso	100%	1	40	
173	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE	LOC. BANDERAS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		En proceso	%	1	40	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
174	AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	DE AGUILA LOC. ABRAHAM GONZALEZ	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	50	
175	SC230067 PR.- CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE. POB. FRANCISCO MONTES DE OCA	LOC. FCO. MONTES DE OCA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$228,024.30	\$250,000.00	\$760,081.00	\$760,081.00	\$228,024.30	1-1235030001-999999-00-1140101-2202-000-K1430803-6161-2-250-323-TG230067-000000-0-616001	En proceso	100%	1	30	
176	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	LOC. TOMAS URBINA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	25	
177	TG230031 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. CORRAL DE BARRANCO	Complementaria	Dos grados de rezago	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$65,000.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230031-000000-0-616001	En proceso	100%	1	15	
178	TG230032 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. GRAL DOMINGO ARRIETA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	20	
179	TG230033 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. NAVAJAS	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	25	
180	TG230034 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. MI PATRIA ES PRIMERO	Complementario	Dos grados de rezago	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230034-000000-0-616001	Cancelada	%	1	20	
181	TG230035 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. EL CARRIZO	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	16	
182	TG230036 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. EL TUNAL	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$65,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230036-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	23	
183	TG230037 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. TOMAS URBINA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$65,000.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230037-000000-0-616001	En proceso	100%	1	20	
184	TG230038 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. ING. PASTOR ROAUX	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$65,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230038-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	15	
185	TG230039 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. SAN JOSE DE ANIMAS	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230039-000000-0-616001	Cancelada	0%	1	22	
186	TG230040 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO	LOC. SANTA LUCIA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	20	
187	Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	LOC. GRAL CARLOS REAL	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1		

la. 











AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
188	TG230042 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. EL DURAZNO	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$65,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230042-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	16	
189	TG230043 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. GRAL. LAZARO CÁRDENAS	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	23	
190	TG230044 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. LLANO GRANDE	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230044-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	20	
191	TG230045 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. OTINAPA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	20	
192	TG230046 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. VICENTE SUÁREZ	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230046-000000-0-616001	Cancelada	%	1	15	
193	TG230047 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. LOS Y ESQUEROS	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$65,000.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230047-000000-0-616001	En proceso	100%	1	10	
194	TG230048 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. PTE. SALVADOR ALLENDE	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$65,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230048-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	15	
195	TG230049 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. BOCA DEL MEZQUITAL	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230049-000000-0-616001	En proceso	100%	2	10	
196	TG230050 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. FELIPE ANGELES	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$65,000.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230050-000000-0-616001	En proceso	100%	1	15	
197	TG230041 PR.- Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	LOC. GRAL. CARLOS REAL	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230041-000000-0-616001	Cancelada	%	1	22	
198	TG230051 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. MAXIMO GRACIA "EL PINO"	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	30	
199	REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. NAVAJAS	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1	25	
200	TG230052 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. RIO ESCONDIDO	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	15	
201	TG230053 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	LOC. HEROE DE NAGGAR	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230053-000000-0-616001	Cancelada	%	1	20	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
202	TG230054 PR - REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOC. CONTRERAS	LOC. CONTRERAS	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	1-1235050003-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6151-2-250323-TG230054-000000-0-615003	En proceso	100%	3	00	
203	TG230055 PR - Rehabilitación de Caminos de Saca Cosechas	LOC. 5 DE FEBRERO	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	1-1235050003-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6151-2-250323-TG230055-000000-0-615003	Terminada	100%	3	55	
204	TG230056 PR - Rehabilitación de Caminos de Saca Cosechas	LOC. FCO. VILLA VIEJO	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	1-1235050003-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6151-2-250323-TG230056-000000-0-615003	En proceso	100%	3	35	
205	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA COSECHAS	LOC. BELISARIO DOMINGUEZ	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	3	40	
206	REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO	MÓDULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2	250	
207	TG230030 PR - REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOC. RODRIGUEZ PUEBLA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	1-1235020007-999999-00-1140101-2202-000-K14308002-6121-2-250323-TG230030-000000-0-612007	En proceso	100%	1	30	
208	PLANTA DE PRODUCCION DE BICINSUMOS	LOC. LLANO GRANDE	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$332,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	10	
209	U9230001 CP - GASTOS INDIRECTOS	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	3000	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,577,198.29	\$1,577,198.29	\$1,208,118.43	1-5133090004-999999-00-1030101-2202-000-K03309002-3391-1-250323-U9230001-000000-0-3390014	En proceso	100%	1	25	
210	U9230002 CP - PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2023 - HASTA UN 2%	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	5000	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$551,465.72	\$551,465.72	\$551,465.72	1-1241030001-999999-00-1030101-2202-000-K05309001-6151-2-250323-U9230002-000000-0-515001	Terminada	100%	1	15	
211	SC230035 CP - CALLE CRUZ INFANTE ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ Y CIRCUITO INTERIOR	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2023	\$102,540.68	\$248,951.20	\$275,670.47	\$275,670.47	\$275,670.47	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-151223-SC230035-000000-0-614006	Terminada	100%	217	223	
212	SC230037 CP - CALLE COSTA RICA ENTRE NAPOLES E ITALIA	COL. UNIVERSAL	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2023	\$26,492.02	\$89,195.81	\$67,704.09	\$67,704.09	\$67,704.09	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-151223-SC230037-000000-0-614006	Terminada	100%	18	185	
213	SD230029 CP - CALLE CRUZ INFANTE ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ Y CIRCUITO INTERIOR	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2023	\$236,480.19	\$824,114.85	\$620,265.90	\$620,265.90	\$620,265.90	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-151223-SD230029-000000-0-614007	Terminada	100%	199	223	
214	SD230030 CP - CALLE COSTA RICA ENTRE NAPOLES E ITALIA	COL. UNIVERSAL	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2023	\$146,401.03	\$499,968.57	\$351,248.68	\$351,248.68	\$351,248.68	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-151223-SD230030-000000-0-614007	Terminada	100%	123	189	
215	SE230055 CP - GUANIKIRIOSE EN CALLE DEL	COL. VALLE DEL	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$151,047.65	\$017,086.60	\$185,155.63	\$185,155.55	\$185,155.63	1-1235040001-999999-00-1050101-2202-000	Terminada	100%	175		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
216	CRUZ INFANTE ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ Y CIRCUITO INTERIOR SE230055 CP.- GUARNICIONES EN CALLE COSTA RICA ENTRE NAPOLES E ITALIA	GUADIANA COL. UNIVERSAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$11,570.58	\$39,358.51	\$39,355.51	\$11,570.58	\$11,570.58	K05303001-6141-2-151 223-SE230055-000000 0-614001 1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000- K05303001-6141-2-151 223-SE230055-000000 0-614001	En proceso	100%	87	188	
217	SE230052 CP.- REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CENTRO HISTÓRICO	ZONA CENTRO	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$1,336,489.66	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$2,144,437.13	\$2,144,437.13	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000- K05303001-6141-2-151 223-SE230052-000000 0-614001	En proceso	48%	2,735	256,500	
220	SE230018 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUYENTES CON ASFALTO ENTRE BLVD FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$325,461.25	\$1,121,892.91	\$1,025,019.00	\$1,025,019.00	\$1,025,019.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230018-000000 0-614002	Terminada	100%	2,586	523	
221	SE230019 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABINO BARREDA CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RIO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. ZONA CENTRO	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$427,038.46	\$1,467,065.37	\$1,374,722.54	\$1,374,722.54	\$1,374,722.54	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230019-000000 0-614002	Terminada	100%	3,476	1,018	
222	SE230020 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE MASCAREÑAS DE LA COL. PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. PORFIRIO DIAZ	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$511,569.64	\$1,744,683.64	\$1,622,649.16	\$1,622,649.16	\$1,622,649.16	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230020-000000 0-614002	Terminada	100%	4,107	458	
223	SE230021 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DEL GUADIANA CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+319.40 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$373,248.84	\$1,271,540.08	\$1,184,796.34	\$1,184,796.34	\$1,184,796.34	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230021-000000 0-614002	Terminada	100%	3,014	592	
224	SE230022 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE LOS ANDES CON ASFALTO ENTRE CALLE NAZAS (0+000) HASTA 0+331.96 EN EL FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	FRACC. VALLE DEL MEZQUITAL	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$371,916.78	\$1,259,625.69	\$1,143,242.88	\$1,143,242.88	\$1,143,242.88	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230022-000000 0-614002	Terminada	100%	3,037	998	
225	SE230023 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE OCTUBRE CON ASFALTO ENTRE CALLES DE FEBRERO Y CALLE	COL. ERGAL	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$199,634.31	\$1,385,045.62	\$1,257,041.38	\$1,257,041.38	\$1,257,041.38	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230023-000000 0-614002	Terminada	100%	3,155	1,000	

ke.


AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)


N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
226	ABRAHAM GONZÁLEZ EN LA COL. EJIDAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. J. GUADALUPE RODRIGUEZ	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$640,480.75	\$2,183,066.28	\$2,091,376.08	\$2,091,376.08	\$2,091,376.08	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251-423-SE230024-000000-0-614002	Terminada	100%	5,577	860	
227	SE230025 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIA BAYONA CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVD. DE LA JUVENTUD EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. SANTA FE	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$808,512.00	\$3,096,198.40	\$2,926,360.60	\$2,926,360.60	\$2,926,360.60	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251-423-SE230025-000000-0-614002	Terminada	100%	7,796	536	
228	SE230026 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE AV. MERCURIO Y AV. FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ EN EL FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$406,211.84	\$1,366,622.68	\$1,275,804.71	\$1,275,804.71	\$1,275,804.71	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251-423-SE230026-000000-0-614002	Terminada	100%	3,225	1,808	
229	SE230027 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE MASCAREÑAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CARLOS LLÓN DE LA PEÑA Y CALLE REFORMA EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. ZONA CENTRO	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$1,347,344.25	\$4,647,373.20	\$4,043,712.85	\$4,043,712.85	\$4,043,712.85	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251-423-SE230027-000000-0-614002	Terminada	100%	10,764	1,745	
230	SE230028 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE STA. MARÍA DEL ORO EN LA COL. HIPODROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. HIPODROMO	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$337,375.95	\$1,152,134.89	\$1,055,366.73	\$1,055,366.73	\$1,055,366.73	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251-423-SE230028-000000-0-614002	Terminada	100%	2,711	537	
231	SE230029 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIVISIÓN DURANGO CON ASFALTO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y AV. SAN IGNACIO EN LAS COLONIAS CERRO DEL MERCADO III, BENJAMIN MENDEZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y COL. SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. BENJAMIN MENDEZ	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$2,553,158.94	\$8,693,570.85	\$8,243,067.11	\$8,243,067.11	\$8,243,067.11	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251-423-SE230029-000000-0-614002	Terminada	100%	21,640	3,485	
232	SE230030 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE	COL. RECTOR	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$750,307.06	\$2,697,274.11	\$2,589,221.68	\$2,589,221.68	\$2,589,221.68	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-	Terminada	100%	6,021		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	PASTOR ROUAIX CON ASFALTO ENTRE CALLE EDUARDO G. CADAVAL Y CALLE ALBERTO CINCUENQUI EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITIA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	MAYAGOITIA													K05303005-6141-2-251 423-SE230030-000000 0-614002					
233	SE230031 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CALLE LIC. ALBERTO TERRONES EN ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	COL. ZONA CENTRO	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$1,296,631.12	\$4,423,893.59	\$4,104,931.02	\$4,104,931.02	\$4,104,931.02	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230031-000000 0-614002	Terminada	100%	10,882	2,226	
234	SE230032 CP.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSE CON ASFALTO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HACIENDA DE SAN LUIS EN EL FRACC. HACIENDA DE TAPIAS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO	FRACC. HACIENDAS DE TAPIAS	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$331,775.78	\$1,132,513.08	\$1,104,778.08	\$1,104,778.08	\$1,104,778.08	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-6141-2-251 423-SE230032-000000 0-614002	Terminada	100%	2,760	334	
235	SE230064 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "EL NAYAR"	LOC. EL NAYAR	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$293,625.59	\$0.00	\$1,000,000.00	\$978,751.96	\$589,623.48	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000- K05303007-6141-2-260 723-SE230064-000000 0-614004	En proceso	99%	1	4,161	
235	SE230064 PR.- REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "EL NAYAR"	LOC. EL NAYAR	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$293,625.59	\$1,000,000.00	\$999,999.57	\$978,752.25	\$815,322.01	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000- K05303007-6141-2-151 223-SE230064-000000 0-614004	En proceso	99%	1	4,161	
236	SE230065 CP.- RECONSTRUCCIÓN DE ALBERCA OLÍMPICA 450	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	624	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$4,057,239.50	\$13,800,000.00	\$8,100,000.00	\$6,113,376.85	\$6,113,376.85	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000- K05303007-6141-2-151 223-SE230065-000000 0-614004	En proceso	45%	1	256,500	
236	SE230065 CP.- RECONSTRUCCIÓN DE ALBERCA OLÍMPICA 450	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	624	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000- K05303007-6211-2-110 123-SE230065-000000 0-624001	En proceso	45%	1	256,500	
237	SE230057 CP.- MANTENIMIENTO VIAL	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Administración	Urbanización	2023	\$0.00	\$41,953,332.21	\$29,738,526.01	\$29,738,526.01	\$29,738,526.01	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-2411-2-151 223-SE230057-000000 0-241003	En proceso	79%	515,894	256,500	
237	SE230057 CP.- MANTENIMIENTO VIAL	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Administración	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$11,336,032.10	\$4,644,271.95	\$2,918,469.30	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000- K05303005-2411-2-110 123-SE230057-000000 0-241003	En proceso	79%	515,894	256,500	
238	GD230001 CP.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL GUADALUPE VICTORIA	FRACC. SAN IGNACIO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$194,582.03	\$669,628.65	\$649,940.14	\$649,940.13	\$649,940.13	1-1235020001-999999-00-1050101-2202-000- K05311006-6221-2-151 223-OD230001-000000 0-622001	Terminada	100%	1	256,500	
239	ADMINISTRACION	VICTORIA	Directa	Pobres	619	FISE	Contrato	Mantenimiento	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		En proceso	0%	2,152	0.00	

pe. 







AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	INSTALACION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA	DE DURANGO		extrema				de Vivienda												
239	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA	VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	2,182	8,077	
240	TG230004 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. LOS LOBOS	No aplica	Dos grados de rezago	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2,500	14	
241	TG230005 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. EL SALTITO	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$45,240.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230005-0000000-616001	En proceso	100%	2,500	15	
242	TG230006 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. LAZARO CARDENAS	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$45,240.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230006-0000000-616001	En proceso	100%	2,500	20	
243	TG230007 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. REGOCIJO	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230007-0000000-616001	Terminada	100%	2,500	30	
244	TG230008 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. CENTE NARIO	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230008-0000000-616001	Terminada	100%	2,500	14	
245	TG230009 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. NUEVA PATRIA	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230009-0000000-616001	Terminada	100%	2,500	30	
246	TG230010 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. SANTA LUCIA	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230010-0000000-616001	Terminada	100%	2,500	15	
247	TG230011 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. DOMINGO ARRIETA	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$140,000.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230011-0000000-616001	Terminada	100%	2,692	20	
248	TG230012 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. EMPALME PURISIMA	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230012-0000000-616001	Terminada	100%	2,500	20	
249	TG230013 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. NAVAJAS	No aplica	Pobreza extrema	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2,500	25	
250	TG230014 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. SAN FIEDRO DE LOS PINOS	No aplica	Dos grados de rezago	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230014-0000000-616001	Terminada	100%	2,500	10	
251	TG230015 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. LAS HUERTAS	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2,500	10	

ka. 





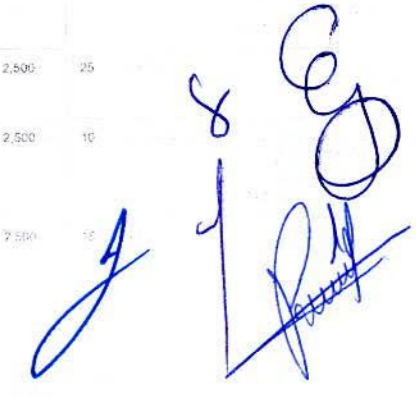

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
252	TG230016 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. LAS GUERAS	No aplica	Dos grados de rezago	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230016-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	15	
253	TG230017 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. ARTICULOS	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$45,240.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230017-000000 0-616001	En proceso	100%	2,500	10	
254	TG230018 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. MESAS DE URBINA	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230018-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	20	
255	TG230019 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. CARRI ZALILLO	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$45,240.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230019-000000 0-616001	En proceso	0%	2,500	14	
256	TG230020 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. CERRO PRIETO	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230020-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	15	
257	TG230021 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. LA LUZ	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230021-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	20	
258	TG230022 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. LAGUNA COLORADA	No aplica	Dos grados de rezago	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230022-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	10	
259	TG230023 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230023-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	15	
260	TG230024 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. BOCA DEL MEZQUITAL	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230024-000000 0-616001	Cancelada	%	2,500	8	
261	TG230025 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. JOSE MA. PINO SUAREZ	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230025-000000 0-616001	No iniciada	%	2,500	30	
262	TG230025 PR.- CONSTRUCCIÓN BORDOS DE ABREVADERO	LOC. CUATRO DE OCTUBRE	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$130,000.00	\$150,800.00	\$45,240.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151 223-TG230026-000000 0-616001	En proceso	100%	2,500	20	
263	SE230043 CP.- PAVIMENTACION EN CALLE CRUZ INFANTE ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ Y CIRCUITO INTERIOR.	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$65,000.29	\$0.00	\$216,516.14	\$216,516.14	\$216,516.14	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110 223-SE230043-000000 0-614002	Terminada	100%	1,222	223	
263	SE230043 CP.- PAVIMENTACION EN CALLE CRUZ INFANTE ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ Y CIRCUITO INTERIOR.	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$415,060.87	\$1,412,836.09	\$1,382,569.13	\$1,382,569.13	\$1,382,569.13	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110 223-SE230043-000000 0-614002	Terminada	100%	1,222	223	

pe.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
264	SE230044 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTA RICA ENTRE NAPOLES E ITALIA	COL UNIVERSAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$45,663.45	\$0.00	\$202,041.92	\$45,663.45	\$45,663.45	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-223-SE230044-000000-0-614002	En proceso	100%	1,268	189	
264	SE230044 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTA RICA ENTRE NAPOLES E ITALIA	COL UNIVERSAL	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$336,777.54	\$1,490,521.75	\$1,490,521.76	\$336,777.54	\$336,777.54	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-151-223-SE230044-000000-0-614002	En proceso	100%	1,268	189	
265	PARQUE LINEAL	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	0	
266	OBRA POR DEFINIR PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$69,493.28	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
267	TG230059 PR.- REHABILITACIÓN DE 204 M.L. DEL CAMINO DE OPERACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHA DEL KM 15+359.80 AL KM 16+003.80 - POB. J. REFUGIO SALCIDO	POB. JOSE REFUGIO SALCIDO	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$347,154.71	\$347,154.71	\$347,154.71	1-1235060002-999999-00-1140101-2202-000-K14306001-6161-2-259-323-TG230059-000000-0-616002	Terminada	100%	204	290	
268	TG230060 PR.- REPOSICION DE 60 ML DE CONCRETO EN EL CANAL PRINCIPAL MARGEN DERECHO DEL KM 15+242.80 AL KM 15+302.80 - POB. J. REFUGIO SALCIDO	POB. JOSE REFUGIO SALCIDO	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$352,845.29	\$352,845.29	\$0.00	1-1235060002-999999-00-1140101-2202-000-K14306001-6161-2-250-323-TG230060-000000-0-616002	En proceso	100%	60	290	
269	SH230015 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 9	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$389,678.60	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151-223-SH230015-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
270	SH230016 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 10	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$428,745.46	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151-223-SH230016-000000-0-619007	En proceso	95%	11	44	
271	SH230017 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 11	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$426,636.17	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151-223-SH230017-000000-0-619007	Terminada	100%	11	44	
272	SH230018 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 12	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$428,789.68	\$0.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151-223-SH230018-000000-0-619007	Terminada	100%	11	44	
273	SH230019 PR.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO PREFABRICADO CON BIODGESTOR 1	ZONA RURAL	Directa	ZAP Rural	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$672,009.72	\$0.00	\$1,808,000.00	\$1,808,000.00	\$1,808,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151-223-SH230019-000000-0-619007	En proceso	41%	18	72	
274	SH230020 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL CON LAMINA 1	ZONA RURAL	Directa	ZAP Rural	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$363,507.09	\$0.00	\$1,213,498.27	\$1,213,498.27	\$1,213,498.27	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151-223-SH230020-000000-0-619007	Terminada	100%	18	72	

pe.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
275	SH230021 CP - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR 4	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$288,501.73	\$288,501.73	\$288,501.73	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151223-SH230021-000000-0-619007	Terminada	100%	24	96	
276	SH230022 CP - REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION PARA TECHO FIRME DE CONCRETO 1	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151223-SH230022-000000-0-619007	En proceso	68%	70	280	
277	TG230069 PR - Construcción Bordes de Abrevadero	Loc. Rio Escordido	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230069-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	14	
278	TG230070 PR - Construcción Bordes de Abrevadero	Loc. El Encinal	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230070-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	14	
279	TG230071 PR - Construcción Bordes de Abrevadero	Loc. San Isidro	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2,500	0	
280	TG230072 PR - Construcción Bordes de Abrevadero	Loc. Ignacio Zaragoza	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2,500	0	
281	TG230061 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. General Mariano Matamoros	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230061-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	20	
282	TG230062 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Plan de Ayala	Complementaria	Pobreza extrema	610	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230062-000000-0-616001	En proceso	100%	1	20	
283	TG230063 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. 18 de Marzo	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230063-000000-0-616001	En proceso	100%	1	20	
284	TG230064 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. San Jerónimo	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	0	
285	TG230065 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Independencia y Libertad	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230065-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	20	
286	TG230066 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Santa Isabel de Salas	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230066-000000-0-616001	Cancelada	%	1	20	
287	TG230067 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Sebastian Lerdo de Tejada	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230067-000000-0-616001	En proceso	100%	1	20	
288	TG230068 PR - Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Ciudad de Acapulco	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250323-TG230068-000000-0-616001	Cancelada	%	1	20	

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
289	SD230039 CP.- Construcción de Subcolector Sanitario del Nogal con 717.00 M de tubería PVC Serie de 18" de diámetro en calle Del Nogal	Fra. Campestre Las Jacarandas	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$630,075.20	\$0.00	\$2,100,250.69	\$2,100,250.69	\$2,100,250.69	0-616001 1-1235030007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SD230039-000000-0-619007	Terminada	100%	717	2,750	
290	OBRA POR DEFINIR PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	No aplica	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$195.02	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
291	OBRA POR DEFINIR BENEFICIARIOS 2022	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	No aplica	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
292	OBRA POR DEFINIR RECURSOS FISCALES 2023	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$73,542.86	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
293	SH230001 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 1	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$388,581.71	\$0.00	\$1,295,272.35	\$1,295,272.35	\$1,295,272.35	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230001-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
294	SH230002 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 2	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$388,581.71	\$0.00	\$1,295,272.35	\$1,295,272.35	\$1,295,272.35	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230002-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
295	SH230003 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 3	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$388,315.10	\$0.00	\$1,294,383.68	\$1,294,383.68	\$1,294,383.68	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230003-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
296	SH230004 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 4	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$388,899.61	\$0.00	\$1,279,665.37	\$1,279,665.37	\$1,279,665.37	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230004-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
297	SH230005 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 5	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$388,635.13	\$0.00	\$1,296,120.43	\$1,296,120.43	\$1,296,120.43	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230005-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
298	SH230012 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 6	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$399,016.65	\$0.00	\$1,296,723.17	\$1,296,723.17	\$1,296,723.17	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230012-000000-0-619007	Terminada	100%	10	40	
299	SH230013 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 7	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$427,527.35	\$0.00	\$1,425,091.18	\$1,425,091.18	\$1,425,091.18	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230013-000000-0-619007	Terminada	100%	11	44	
300	SH230014 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL 8	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$427,754.10	\$0.00	\$1,425,847.01	\$1,425,847.01	\$1,425,847.01	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230014-000000-0-619007	Terminada	100%	11	44	
301	SH230009 CP.- SUPLENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$447,199.71	\$0.00	\$1,490,665.70	\$1,490,665.70	\$1,490,665.70	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-250-323-SH230009-000000-0-619007	Terminada	100%	124	496	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
302	SH230010 CP.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR 2	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$447,434.03	\$0.00	\$1,491,446.75	\$1,491,446.75	\$1,491,446.75	1-1235900007-999999- 01-1030101-2205-000- K03305001-6191-2-250 323-SH230010-000000 0-619007	Terminada	100%	124	496	
303	SH230011 CP.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR 3	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$447,440.50	\$0.00	\$1,491,468.33	\$1,491,468.33	\$1,491,468.33	1-1235900007-999999- 01-1030101-2205-000- K03305001-6191-2-250 323-SH230011-000000 0-619007	Terminada	100%	124	496	
304	SC230056 PR.- Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. Banderas de Agua	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$79,564.40	\$79,564.40	\$0.00	1-1235030001-999999- 00-1140101-2202-000- K14301003-6131-2-250 323-SC230056-000000 0-613001	En proceso	100%	1	30	
305	SC230055 PR.- Equipamiento Fotovoltaico de Pozo Profundo de Agua Entubada	Loc. General Domingo Arrieta	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$90,435.60	\$90,435.60	\$0.00	1-1235030001-999999- 00-1140101-2203-000- K14301003-6131-2-250 323-SC230055-000000 0-613001	En proceso	100%	1	20	
306	TG230074 PR.- Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. San Isidro	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$142,977.70	\$142,977.70	\$45,240.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14308001-6161-2-250 323-TG230074-000000 0-616001	En proceso	100%	2,500	30	
307	TG230075 PR.- Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Laguna Colorada	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14308001-6161-2-250 323-TG230075-000000 0-616001	En proceso	100%	1	15	
308	TG230077 PR.- Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Echeverría de la Sierra	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14308001-6161-2-250 323-TG230077-000000 0-616001	En proceso	100%	2,500	15	
309	TG230076 PR.- Rehabilitación de Bordo de Abrevadero	Loc. Santiago Bayasora	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$22,620.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$22,620.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14308001-6161-2-250 323-TG230076-000000 0-616001	En proceso	100%	1	30	
310	TG230073 PR.- Rehabilitación de Caminos de Saca Cochinas	Loc. Navacoyan	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	1-1235060003-999999- 00-1140101-2202-000- K14308001-6161-2-250 323-TG230073-000000 0-616003	Terminada	100%	3	25	
311	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEFINIR FISM 2023	VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Alcantarillado	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
312	SH230023 CP.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 1	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$399,500.29	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	1-1235900007-999999- 01-1030101-2205-000- K03305001-6191-2-151 223-SH230023-000000 0-619007	En proceso	42%	160	640	
313	SH230024 CP.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 2	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	Pobreza extrema	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	1-1235900007-999999- 01-1030101-2205-000- K03305001-6191-2-151 223-SH230024-000000 0-619007	En proceso	19%	160	640	
314	TG230078 PR.- Construcción Bordo de Abrevadero	Loc. Boca del Mezquital	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14308001-6161-2-151 323-TG230078-000000 0-616001	En proceso	100%	2,500	14	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
315	TG230079 PR.- Construcción Bordes de Atrevadero	Loc. Rio Verde	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-151223-TG230079-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	20	
316	TG230058 PR.- Rehabilitación de Instalaciones Pecuanas	Loc. San Benito (Antes. Zona Rural)	No aplica	Pobreza extrema	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060005-999999-00-1140101-2202-000-K14308002-6161-2-151223-TG230058-000000-0-616005	En proceso	100%	1	50	
317	OBRA POR DEFINIR FISE 2023	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	FISE	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$64,360.02	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
318	SC230058 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON 180.85 M. DE TUBERÍA DE PVC RD 32.5 DE 3" DE DIAM. Y 34 TOMAS DOM. EN CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETRARO EN LA COL. CONSTITUCION	COL. CONSTITUCION	Directa	ZAP Urbana	613	Financiamiento Interno (Crédito Bancarias FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$54,759.62	\$0.00	\$182,565.41	\$182,565.41	\$182,565.41	1-1235030001-999999-00-1030101-2203-000-K03301003-6131-2-120123-SC230058-000000-0-613001	Terminada	100%	181	40	
319	SE230069 CP.- PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE PRGL. PINO SUÁREZ, ENTRE CRUCERO CON CALLE ALFONSO GORDA DEL ROSAL y CALLE HELIO CUERPO NORTE, COL. LUIS ECHEVERRÍA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO EN LA LOCALIDAD DE DURANGO.	COL. LUIS E ECHEVERRIA	Complementaria	No aplica	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	\$731,471.57	\$0.00	\$2,438,238.57	\$2,438,238.57	\$2,438,238.57	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-251423-SE230069-000000-0-614002	Terminada	100%	6,240	566	
320	SJ230001 CP.- DOMO EN LA ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGÓN" CCT 10DPR03022.	COL. ARTURO GAMIZ	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$524,859.23	\$0.00	\$1,784,368.05	\$942,342.08	\$942,342.08	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306006-6191-2-151223-SJ230001-000000-0-619006	En proceso	58%	1	51	
321	SJ230002 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 10DPR09122.	POB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA)	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$440,068.14	\$0.00	\$1,498,195.84	\$746,730.66	\$746,730.66	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306002-6191-2-151223-SJ230002-000000-0-619006	En proceso	51%	1	144	
322	SJ230003 CP.- CONSTRUCCIÓN DE SALA AUDIOVISUAL DE LA ESC. TÉCNICA No. 73, CCT 10DS0078A	FRACC. REAL DEL MEZQUITAL	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$448,352.12	\$0.00	\$448,352.12	\$448,352.12	\$448,352.12	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306003-6191-2-151223-SJ230003-000000-0-619006	En proceso	1%	1	1,036	
322	SJ230003 CP.- CONSTRUCCIÓN DE SALA AUDIOVISUAL DE LA ESC. TÉCNICA No. 73, CCT 10DS0078A.	FRACC. REAL DEL MEZQUITAL	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,049,311.30	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306003-6191-2-110123-SJ230003-000000-0-619006	En proceso	1%	1	1,036	
323	SE230070 PR.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL POB. DOLORES HIDALGO	POB. DOLORES HIDALGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$524,642.49	\$0.00	\$1,764,865.05	\$919,164.75	\$919,164.75	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151223-SE230070-000000-0-614004	En proceso	58%	1	1,103	
324	SJ230005 CP.- AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. "DOÑATEC ARAÚZ" CCT 10EPR01173	COL. TIERRA Y LIBERTAD	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$427,714.89	\$0.00	\$1,561,064.40	\$507,851.27	\$507,833.27	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306007-6191-2-151223-SJ230005-000000-0-619006	En proceso	36%		301	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
325	SE230068 CP.- SEMEAFONALIZACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO. CCT 10DIT0004E.	COL. NUEVA VIZCAYA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040008-999999-00-1050101-2201-000-K05303004-6141-2-151-223-SE230068-000000-0-614008	Cancelada	0%	1	8,500	
326	OD230010 CP.- ESPACIO DE RELAJACIÓN Y RECREACIÓN DEL CBTS 130. CCT 10DCT0398M.	FRACC. LOS FUENTES	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$323,350.22	\$0.00	\$1,100,000.00	\$323,350.22	\$323,350.22	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05311001-6191-2-151-223-OD230010-000000-0-619003	En proceso	75%	1	2,746	
327	OD230011 CP.- REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PANTEÓN DE ORIENTE.	COL. HIPOD ROMO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$599,528.72	\$0.00	\$599,528.72	\$599,528.72	\$599,528.72	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05311007-6191-2-151-223-OD230011-000000-0-619003	En proceso	1%	1	256,500	
327	OD230011 CP.- REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PANTEÓN DE ORIENTE.	COL. HIPOD ROMO	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,400,471.28	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05311007-6191-2-110-123-OD230011-000000-0-619003	En proceso	1%	1	256,500	
328	OD230013 PR.- REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA FAMILIA EN EL POB. EL CONEJO	POB. EL CONEJO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$296,813.62	\$0.00	\$1,000,000.00	\$619,411.40	\$619,411.40	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05311008-6191-2-151-223-OD230013-000000-0-619003	En proceso	70%	1	767	
326	SC230057 PR.- CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL AGUA POTABLE EN EL POB. 4 DE OCTUBRE.	POB. 4 DE OCTUBRE	No aplica	No aplica	613	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1050101-2203-000-K05301003-6131-2-151-223-SC230057-000000-0-613001	No iniciada	0%	1	2,422	
329	SC230057 PR.- CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL AGUA POTABLE EN EL POB. 4 DE OCTUBRE.	POB. 4 DE OCTUBRE	No aplica	No aplica	613	RECURSOS FISCALES	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1050101-2203-000-K05301003-6131-2-110-123-SC230057-000000-0-613001	No iniciada	0%	1	2,422	
330	TG230080 PR.- PROGRAMA EMERGENTE DE SEQUÍA. ZONA RURAL	ZONA RURAL	No aplica	No aplica	616	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235060005-999999-00-1143101-2202-000-K14308002-6161-2-151-223-TG230080-000000-0-616005	En proceso	75%	1	350	
331	SE230057 CP.- MANTENIMIENTO VIAL (C)	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-151-223-SE230057-000000-0-614002	Cancelada	0%	515,984	256,500	
332	SC230065 CP.- TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSÉ, ENTRE C. SAN MARCOS Y SANTA CRUZ	COL. 12 DE DICIEMBRE	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Agua Potable	2023	\$70,563.58	\$0.00	\$240,014.00	\$240,014.35	\$240,014.35	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05301001-6141-2-120-123-SC230065-000000-0-614006	Terminada	100%	42	286	
333	SD230040 CP.- REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ, ENTRE C. SAN MARCOS Y SANTA CRUZ	COL. 12 DE DICIEMBRE	Directa	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Alcantarillado	2023	\$728,788.11	\$0.00	\$778,191.89	\$778,191.89	\$778,191.89	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05302001-6141-2-120-123-SD230040-000000-0-614007	Terminada	100%	24	286	
334	SE230063 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN JOSÉ, ENTRE C. SAN MARCOS Y SANTA CRUZ	COL. 12 DE DICIEMBRE	Complementaria	ZAP Urbana	614	Financiamiento Interno (Crédito Banobras FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$657,503.60	\$0.00	\$1,896,820.07	\$1,896,820.07	\$1,896,820.07	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230063-000000-0-614002	Terminada	100%	1,392	286	
336	SE230065 PR.-	POB. UJO	Directa	Participa	614	FISCAL	Contrato	Agua Potable	2023	\$67,824.75	\$0.00	\$224,179.00	\$224,873.98	\$67,824.75	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-120-123-SE230065-000000-0-614002	En proceso	100%	1	175	

ke.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA; POB. OJO DE AGUA EL CAZADOR	DE AGUA EL CAZADOR		extrema											00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250-323-SC230055-000000-0-613001					
337	SC230061 PR.- EQUIPAMIENTO DE FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA; POB. REGOCIO	POB. REGOCIO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$59,577.50	\$0.00	\$198,592.00	\$198,592.00	\$59,577.50	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250-323-SC230061-000000-0-613001	En proceso	100%	1	25	
338	SC230064 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA; LOC. COLONIA HIDALGO	POB. COLONIA HIDALGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$93,049.00	\$93,049.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250-323-SC230064-000000-0-613001	En proceso	100%	1	50	
338	SC230064 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA; LOC. COLONIA HIDALGO	POB. COLONIA HIDALGO	Directa	Pobreza extrema	613	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$22,792.00	\$22,792.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250-323-SC230064-000000-0-613001	En proceso	100%	1	50	
339	SC230063 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA; POB. NAYAR	POB. EL NAYAR	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$67,897.98	\$67,897.98	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250-323-SC230063-000000-0-613001	En proceso	100%	1	50	
340	SC230062 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE; POB. PRAXEDIS GUERRERO (VIEJO)	POB. PRAXEDIS GUERRERO (VIEJO)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$34,500.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$34,500.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301001-6131-2-250-323-SC230062-000000-0-613001	En proceso	100%	1	35	
341	SC230060 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE; POB. LAS HUERTAS	POB. LAS HUERTAS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$33,646.50	\$0.00	\$112,155.00	\$112,155.00	\$33,646.50	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250-323-SC230060-000000-0-613001	En proceso	100%	1	30	
342	TG230082 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO; POB. LAGUNA COLORADA	POB. LAGUNA COLORADA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230082-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	15	
343	TG230083 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO; POB. SANTIAGO BAYACORA	POB. SANTIAGO BAYACORA	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230083-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	20	
344	TG230084 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO; POB. 16 DE SEPTIEMBRE	POB. 16 DE SEPTIEMBRE	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$45,240.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$45,240.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-250-323-TG230084-000000-0-616001	En proceso	100%	2,500	20	
345	OD230008 CP.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	CO. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$293,888.59	\$0.00	\$1,000,000.00	\$293,888.59	\$293,888.59	1-1236020001-999999-00-1050101-2202-000-K05311006-6221-2-151-223-OD230008-000000-0-622001	En proceso	35%	1	256,500	
346	SE230071 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE COSTA RICA A CALLE EMILIO PORTES GIL	COL. LOPEZ PORTILLO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$1,192,540.36	\$0.00	\$1,192,540.36	\$1,192,540.36	\$1,192,540.36	1-1236040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-151-223-SE230071-000000-0-614002	En proceso	60%	2,056	334	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

Nº	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
346	SE230071 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS; ENTRE CALLE COSTA RICA A CALLE EMILIO PORTES GIL.	COL. LOPEZ PORTILLO	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$2,863,722.10	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-110-123-SE230071-000000-0-614002	En proceso	60%	2,056	334	
347	SE230072 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEMOCRACIA; ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE REVOLUCION.	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$709,962.94	\$0.00	\$2,291,873.08	\$709,962.94	\$709,962.94	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303006-6141-2-151-223-SE230072-000000-0-614002	En proceso	28%	1,034	567	
348	SE230073 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE 12 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 3 DE AGOSTO.	COL. TIERRA Y LIBERTAD	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$632,648.58	\$0.00	\$2,151,870.78	\$632,648.58	\$632,648.58	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05303005-6141-2-151-223-SE230073-000000-0-614002	En proceso	70%	997	222	
349	SE230074 CP.- REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LAS NUBES", UBICADA EN AVE. RESPLANDOR	FRACC. LAS NUBES	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$374,929.81	\$0.00	\$374,929.81	\$374,929.81	\$374,929.81	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151-223-SE230074-000000-0-614004	En proceso	52%	1	1,730	
349	SE230074 CP.- REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LAS NUBES", UBICADA EN AVE. RESPLANDOR	FRACC. LAS NUBES	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$901,070.18	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110-123-SE230074-000000-0-614004	En proceso	52%	1	1,730	
350	SE230076 PR.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO "LABOR DE GUADALUPE"	POB. LABOR DE GUADALUPE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$323,258.14	\$0.00	\$1,100,000.00	\$323,258.14	\$323,258.14	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151-223-SE230076-000000-0-614004	En proceso	5%	1	821	
351	SE230077 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES FRACCIONAMIENTO BARCELONA.	FRACC. BARCELONA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$411,542.72	\$0.00	\$411,542.72	\$411,542.72	\$411,542.72	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151-223-SE230077-000000-0-614004	En proceso	20%	1	1,213	
351	SE230077 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES FRACCIONAMIENTO BARCELONA.	FRACC. BARCELONA	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$988,457.28	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110-123-SE230077-000000-0-614004	En proceso	20%	1	1,213	
352	SE230079 CP.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 COL. DIVISION DEL NORTE.	COL. DIVISION DEL NORTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$352,799.46	\$0.00	\$352,799.46	\$352,799.46	\$352,799.46	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151-223-SE230079-000000-0-614004	En proceso	35%	1	4,870	
352	SE230079 CP.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 COL. DIVISION DEL NORTE.	COL. DIVISION DEL NORTE	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$847,200.54	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110-123-SE230079-000000-0-614004	En proceso	35%	1	4,870	
353	SE230080 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRACC. REAL VICTORIA II	FRACC. REAL VICTORIA II	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$409,894.98	\$0.00	\$409,894.98	\$409,894.98	\$409,894.98	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151-223-SE230080-000000-0-614004	En proceso	62%	1	1,147	
353	SE230080 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRACC. REAL VICTORIA II	FRACC. REAL VICTORIA II	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$970,617.96	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110-123-SE230080-000000-0-614004	En proceso	62%	1	1,147	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

Nº	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
354	SJ230007 PR.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. "GENERAL CARLOS REAL", CLAVE: 10DPR1323S	POB. MORCILLO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$524,166.79	\$0.00	\$524,166.79	\$524,166.79	\$524,166.79	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05305006-6191-2-151-223-SJ230007-000000-0-618006	En proceso	38%	1	152	
354	SJ230007 PR.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. "GENERAL CARLOS REAL", CLAVE: 10DPR1323S	POB. MORCILLO	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,260,898.26	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05305006-6191-2-110-123-SJ230007-000000-0-618006	En proceso	38%	1	152	
355	SJ230005 CP.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC. PRIM. "SOLIDARIDAD", CLAVE 10DPR1606Z	COL. SAN CARLOS	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$477,895.14	\$0.00	\$477,895.14	\$477,895.14	\$477,895.14	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05305006-6191-2-151-223-SJ230005-000000-0-615006	En proceso	18%	1	352	
355	SJ230005 CP.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC. PRIM. "SOLIDARIDAD", CLAVE 10DPR1606Z	COL. SAN CARLOS	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,157,803.86	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05305006-6191-2-110-123-SJ230005-000000-0-619006	En proceso	18%	1	352	
356	SE230082 CP.- ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR GANDARA SOTO DE LA COL. MORGA	COL. MORGA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$438,968.40	\$0.00	\$438,968.40	\$438,968.40	\$438,968.40	1-1235040004-999999-00-1050101-2202-000-K05303007-6141-2-151-223-SE230082-000000-0-614004	En proceso	7%	1	1,690	
356	SE230082 CP.- ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR GANDARA SOTO DE LA COL. MORGA	COL. MORGA	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,040,011.36	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2202-000-K05303007-6141-2-110-123-SE230082-000000-0-614004	En proceso	7%	1	1,690	
357	OD230014 CP.- REHABILITACION DE AREA VERDE PARA LA COL. CARLOS LUNA	COL. CARLOS LUNA	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$445,350.01	\$0.00	\$445,350.01	\$445,350.01	\$445,350.01	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05311009-6191-2-151-223-OD230014-000000-0-619003	En proceso	15%	1	1,530	
357	OD230014 CP.- REHABILITACION DE AREA VERDE PARA LA COL. CARLOS LUNA	COL. CARLOS LUNA	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,039,186.99	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05311009-6191-2-110-123-OD230014-000000-0-619003	En proceso	15%	1	1,530	
358	OD230002 CP.- AVIARIO (ZOOLOGICO SAHUATOBA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$870,000.00	\$870,000.00	1-1236020021-999999-03-1030101-2202-000-K03311001-6221-2-151-223-OD230002-000000-0-622001	Terminada	100%	120	688,697	
358	OD230003 CP.- ALBERGUE PARA LOBOS (ZOOLOGICO SAHUATOBA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,334,000.00	\$1,334,000.00	\$1,334,000.00	1-1236020001-999999-03-1030101-2202-000-K03311001-6221-2-151-223-OD230003-000000-0-622001	Terminada	100%	875	688,697	
360	OD230004 CP.- ALBERGUE PARA OSOS (ZOOLOGICO SAHUATOBA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,682,000.00	\$1,682,000.00	\$1,682,000.00	1-1236020001-999999-03-1030101-2202-000-K03311001-6221-2-151-223-OD230004-000000-0-622001	En proceso	95%	1	688,697	
361	OD230005 CP.- CAFETERIA PARA PUBLICO EN GENERAL (ZOOLOGICO SAHUATOBA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$713,400.00	\$713,400.00	\$713,400.00	1-1236020001-999999-03-1030101-2202-000-K03311001-6221-2-151-223-OD230005-000000-0-622001	Terminada	100%		688,697	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estadn	%	Metas	Población	Netas
362	OD230006 CP.- BAÑOS EN ZONA DE HERPETARIO (ZOOLOGICO SAHUATOBA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$872,800.00	\$872,800.00	\$872,800.00	0-622001 1-1236020001-999999-03-1030101-2202-000-K03311001-6221-2-151223-OD230006-000000-0-622001	Terminada	100%	1	688,697	
363	OD230007 CP.- HABITAT PEQUEÑAS ESPECIES (GATO MONTES, LÉMUR, MAPACHE, ZORRO), ZOOLOGICO SAHUATOBA.	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$527,800.00	\$527,800.00	\$527,800.00	1-1236020001-999999-03-1030101-2202-000-K03311001-6221-2-151223-OD230007-000000-0-622001	En proceso	65%	1	688,697	
364	SH230025 CP.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR 5	CD. VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Rural	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$2,320,000.00	\$2,320,000.00	\$2,320,000.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03305001-6191-2-151223-SH230025-000000-0-619007	En proceso	49%	194	776	
365	SJ230009 CP.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "PATRIA NUEVA". CLAVE: 10EPR0482Z	COL. SAN JOSE III	Directa	ZAP Urbana	619	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (BANOBRA FISM)	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$192,199.95	\$0.00	\$640,666.12	\$640,666.00	\$397,493.56	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306002-6191-2-120123-SJ230009-000000-0-619006	En proceso	100%	462	185	
365	SJ230009 CP.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "PATRIA NUEVA". CLAVE: 10EPR0482Z	COL. SAN JOSE III	Directa	ZAP Urbana	619	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$150,158.35	\$1,141,221.00	\$500,528.32	\$500,528.32	\$310,546.27	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306002-6191-2-250323-SJ230009-000000-0-619006	En proceso	100%	462	185	
366	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$86,317.46	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
367	SE230084 CP.- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE VICTORIA DE DURANGO (2da ETAPA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (BANOBRA FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$584,546.86	\$0.00	\$1,948,489.55	\$1,948,489.55	\$1,260,037.32	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250323-SE230084-000000-0-614001	En proceso	100%	582	256,500	
367	SE230084 CP.- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE VICTORIA DE DURANGO (2da ETAPA)	CD. VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$3,448.06	\$0.00	\$11,493.52	\$11,493.52	\$7,478.34	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250323-SE230084-000000-0-614001	En proceso	100%	582	256,500	
368	SE230085 CP.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LA FERRERIA ENTRE C, PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y BLVD. DE LAS FLORES EN LA COL. VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,314,565.00	\$1,314,565.00	\$1,144,797.43	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250323-SE230085-000000-0-614001	En proceso	100%	2,889	2,689	
368	SE230085 CP.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LA FERRERIA ENTRE C, PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y BLVD. DE LAS FLORES EN LA COL. VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (BANOBRA FISM)	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$366,870.41	\$366,870.41	\$319,490.31	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250323-SE230085-000000-0-614001	En proceso	100%	2,889	2,689	
369	NE230084 CP.- CONSTRUCCION DE	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$104,445.03	\$104,445.03	\$108,373.76	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05303001-6141-2-250323-NE230084-000000-0-614001	En proceso	100%	269	269	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LA FERRERIA ENTRE C. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y BLVD. DE LAS FLORES EN LA COL. VALLE VERDE														K05303001-6141-2-120 123-SE230085-000000 0-614001					
370	SE230066 CP.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LA FORESTAL"	FRACC. LA FORESTAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$532,674.89	\$0.00	\$532,674.89	\$532,674.89	\$532,674.89	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151 223-SE230066-000000 0-614004	En proceso	34%	1	3,930	
370	SE230066 CP.- CONSTRUCCION DE DOMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LA FORESTAL"	FRACC. LA FORESTAL	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,252,190.16	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110 123-SE230066-000000 0-614004	En proceso	34%	1	3,930	
371	SE230075 CP.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CUADRA DEL FERROCARRIL"	COL. LA CUADRA DEL FERRO-CARRIL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$298,498.88	\$0.00	\$298,498.88	\$298,498.88	\$298,498.88	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151 223-SE230075-000000 0-614004	En proceso	30%	1	251	
371	SE230075 CP.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CUADRA DEL FERROCARRIL"	COL. LA CUADRA DEL FERRO-CARRIL	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$701,501.12	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110 123-SE230075-000000 0-614004	En proceso	30%	1	251	
372	SJ230006 CP.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CBTS # 110.	FRACC. 20 DE NOVIEMBRE R	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$313,107.77	\$0.00	\$1,044,000.00	\$313,107.77	\$313,107.77	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05306001-6191-2-151 223-SJ230006-000000 0-619006	En proceso	6%	1,462	2,720	
373	SE230078 PR.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA DE LA LOC. PLAN DE AYALA	POB. PLAN DE AYALA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$323,173.06	\$0.00	\$1,100,000.00	\$323,173.06	\$323,173.06	1-1235040003-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151 223-SE230078-000000 0-614003	En proceso	23%	1	1,130	
374	SE230081 CP.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. GOBERNADORES	"COL. GOBE RNADORES"	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$452,840.36	\$0.00	\$452,840.36	\$452,840.36	\$452,840.36	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-151 223-SE230081-000000 0-614004	En proceso	1%	0	2,370	
374	SE230081 CP.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. GOBERNADORES	"COL. GOBE RNADORES"	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,099,043.11	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05303007-6141-2-110 123-SE230081-000000 0-614004	En proceso	1%	0	2,370	
375	SH230026 CP.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR 6	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$6,090,000.00	\$2,000,420.69	\$2,000,420.69	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-KU709001-6191-2-151 223-SH230026-000000 0-619007	En proceso	0%	1,000	4,000	
376	SC230069 PR.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POB. NAVACOYAN	POB. NAVACOYAN	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$315,497.33	\$315,497.33	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250 223-SC230069-000000 0-613001	En proceso	100%	1,300	65	
376	SC230069 PR.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POB. NAVACOYAN	POB. NAVACOYAN	Directa	Pobreza extrema	613	FINANCIEROS FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$205,531.38	\$205,531.38	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14301003-6131-2-250 223-SC230069-000000 0-613001	En proceso	100%	1,300	65	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	DE CONDUCCIÓN, POB. NAVACOYAN														K14301003-6131-2-250 323-SC230059-000000 0-613001					
377	SC230070 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. NUEVA PATRIA	POB. NUEVA PATRIA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000- K14301003-6131-2-250 323-SC230070-000000 0-613001	En proceso	100%	1	35	
378	SC230071 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. PLAN DE AYALA	POB. PLAN DE AYALA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000- K14301003-6131-2-250 323-SC230071-000000 0-613001	En proceso	100%	1	60	
379	SC230072 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. SAN ISIDRO	POB. SAN ISIDRO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000- K14301003-6131-2-250 323-SC230072-000000 0-613001	En proceso	100%	1	35	
380	SC230073 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POB. LOS YESQUEROS	POB. LOS Y ESQUEROS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000- K14301003-6131-2-250 323-SC230073-000000 0-613001	En proceso	100%	1	30	
382	OD230009 CP.- Construcción Barda Perimetral y Cerco de Protección en la Planta de Selección y Transferencia	Victoria de Durango	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$826,845.54	\$0.00	\$2,754,000.00	\$826,948.54	\$826,848.54	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000- K05311002-6191-2-151 223-OD230009-000000 0-619003	En proceso	%	1	25,650,000	
383	SE230086 PR.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOC. GABINO SANTILLAN	POB. GABINO SANTILLAN	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000- K05303007-6141-2-110 123-SE230086-000000 0-614004	No iniciada	0%	1	820	
383	SE230086 PR.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOC. GABINO SANTILLAN	POB. GABINO SANTILLAN	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000- K05303007-6141-2-110 123-SE230086-000000 0-614004	No iniciada	0%	1	820	
384	SJ230010 CP.- CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO CCT 10DIT004E	COL. NUEVA VIZCAYA	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000- K05306009-6191-2-151 223-SJ230010-000000 0-619006	No iniciada	0%	1	6,695	
384	SJ230010 CP.- CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO CCT 10DIT004E	COL. NUEVA VIZCAYA	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000- K05306009-6191-2-110 123-SJ230010-000000 0-619006	No iniciada	0%	1	6,695	
385	OD230015 CP.- REHABILITACIÓN DE AREA DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. NUEVO DURANGO III	FRACC. NUEVO DURANGO III	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1060101-2202-000- K05311001-6191-2-151 223-OD230015-000000 0-619003	No iniciada	0%	1	5,330	
385	OD230015 CP.- REHABILITACIÓN DE AREA DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. NUEVO DURANGO III	FRACC. NUEVO DURANGO III	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000- K05311001-6191-2-110 123-OD230015-000000 0-619003	No iniciada	0%	1	5,330	
385	OP230058 PR.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO	POB. CINCO DE MAYO	No aplica	No aplica	612	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2202-000- K14301003-6131-2-250	No iniciada	0%	1	25	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	COMUNITARIO, POB. CINCO DE MAYO														223-TG230086-000000-0-612007					
387	SH230001 CP.- CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL NIÑO	COL. ISABEL ALMANZA	No aplica	No aplica	622	RECURSOS FISCALES	Contrato	Infraestructura Basica de Salud	2023	\$23,997,449.82	\$0.00	\$80,000,000.00	\$23,997,449.82	\$23,997,449.82	1-1236020001-999999-00-1050101-2301-000-K05307002-6221-2-151-223-SO230001-000000-0-622001	En proceso	3%	1	256,500	
388	SH230027 CP.- INSTALACIÓN DE TINACOS EN VICTORIA DE DURANGO	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$1,818,603.12	\$0.00	\$0.00	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07305001-6191-2-151-223-SH230027-000000-0-619007	No iniciada	%	1,170	4,600	
389	SH230028 CP.- APLICACION DE ENJARRE EN VICTORIA DE DURANGO	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$362,650.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07305001-6191-2-151-223-SH230028-000000-0-619007	No iniciada	%	3,000	400	
390	SH230029 CP.- APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN VICTORIA DE DURANGO	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$372,210.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07305001-6191-2-151-223-SH230029-000000-0-619007	No iniciada	%	9,500	2,000	
391	SH230030 CP.- INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA EN VICTORIA DE DURANGO	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$839,169.60	\$0.00	\$0.00	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07305001-6191-2-151-223-SH230030-000000-0-619007	No iniciada	%	4,740	632	
392	SH230031 CP.- APLICACIÓN DE PINTURA EN VICTORIA DE DURANGO	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	\$0.00	\$0.00	\$2,607,467.28	\$0.00	\$0.00	1-1235900007-999999-00-1070101-2205-000-K07305001-6191-2-151-223-SH230031-000000-0-619007	No iniciada	%	51,756	3,632	
393	TG230085 PR.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS PARA AUTOCONSUMO: POB. TOMAS URBINA.	POB. TOMAS URBINA	Complementaria	Pobreza extrema	4000	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	1-5231010001-999999-00-1140101-2202-000-K14309002-4311-1-250-323-TG230085-000000-0-431001	En proceso	50%	1	10	
394	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$170,587.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ERIK OSIEL ARÁMBULA ARÁMBULA
DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

L.C.P.F. LUIS IGNACIO ORBANTE RAMÍREZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ GIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. BLANCA IVETE ESPARZA RIVAS
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. RODOLFO CORROJEDO CARRILLO
DIRECTOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


ING. HÉCTOR JESÚS GONZÁLEZ SMITH
DIRECTOR DEL INEVAL MUNICIPAL DE VIVIENDA

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(DICIEMBRE 2023)



ING. JESUS HÉCTOR LÓPEZ MORALES.
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

ka.





ANEXO FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023





FISM






**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**




INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

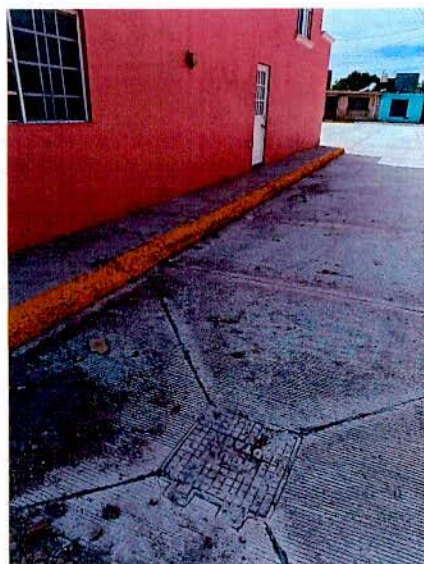

**REHAB. DE AGUA POTABLE EN LA
PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE C.
AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA
FRACC. BENITO JUAREZ**



**SUSTITUCIÓN DE TOMAS
DOMICILIARIAS DE AGUA POT. EN LA
CALLE CHIHUAHUA; ENTRE C.
MÉXICO Y ZACATECAS
COL. MEXICO**

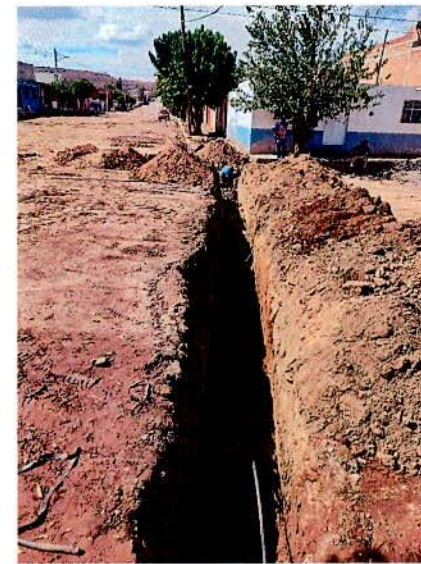

**REHAB. DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE PORFIRIO DÍAZ; ENTRE C.
GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y PLUTARCO
ELÍAS CALLES
COL. LOPEZ PORTILLO**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**




INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE



**REHAB. DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE PASEO DE LAS
ARBOLEDAS; ENTRE C.
REAL DEL MEZQUITAL y
MEZQUITES
COL. VALLE VERDE**



**REHAB. DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE PRINCIPAL;
ENTRE ACCESO Y EL CANAL
POB. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN**

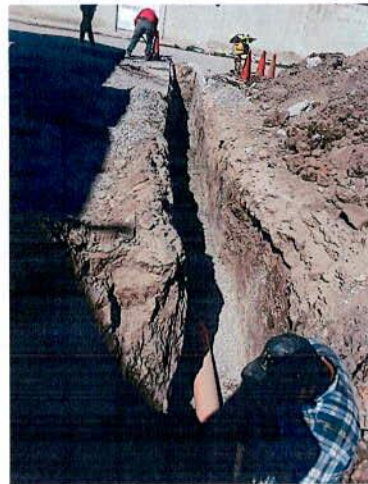

**REHAB. DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE CALANDRIAS;
ENTRE C. PASEO DE LOS
FLAMINGOS Y PASEO
JILGUEROS
FRACC. SILVESTRE
REVUELTAS**



**TOMAS DOMICILIARIAS EN
LA CALLE COAHUILA;
ENTRE C. MÉXICO Y 10 DE
FEBRERO
COL. MEXICO**






FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023



ALCANTARILLADO



**REHAB. DE
ALCANTARILLADO EN LA
PRIVADA NIÑOS HEROES;
ENTRE C. AGUSTÍN
MELGAR y JUAN ESCUTIA
FRACC. BENITO JUAREZ**

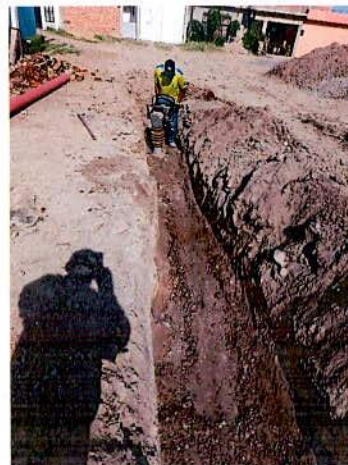

**REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLADO EN LA
PRIVADA CHAPULTEPEC;
ENTRE C. AGUSTÍN
MELGAR Y JUAN ESCUTIA
FRACC. BENITO JUAREZ**



**REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLADO EN LA
CALLE CHIHUAHUA; ENTRE
C. MÉXICO Y ZACATECAS
COL. MEXICO**



**REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLADO EN LA
CALLE PORFIRIO DÍAZ;
ENTRE C. GUSTAVO DÍAZ
ORDÁZ y PLUTARCO ELÍAS
CALLES
COL. LOPEZ PORTILLO**




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



ALCANTARILLADO



DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL; ENTRE ACCESO y EL CANAL POB. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN

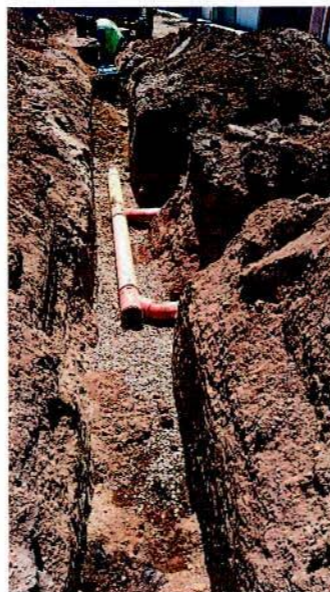

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALANDRIAS; ENTRE C. PASEO DE LOS FLAMINGOS y PASEO JILGUEROS FRACC. SILVESTRE REVUELTAS



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUILLERMO RÍOS; ENTRE C. IGNAIO LÓPEZ TARSO y TERESA DE CALCUTA COL. VALLE DEL GUADIANA




FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023



ALCANTARILLADO



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15 DE MAYO; ENTRE C. LIC. JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERÁZ y 18 DE MAYO COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID

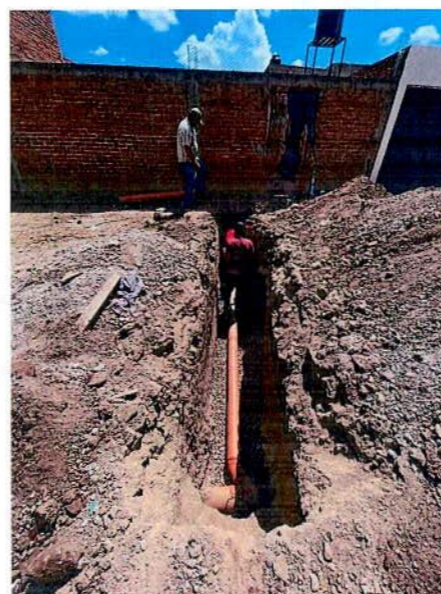

DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS; ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL y MEZQUITES COL. VALLE VERDE



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE COAHUILA; ENTRE C. MÉXICO y 10 DE FEBRERO COL. MEXICO



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



GUARNICIONES Y BANQUETAS



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA
CALLE CHIHUAHUA; ENTRE C. MÉXICO Y
ZACATECAS
COL. MEXICO**



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE
PRINCIPAL; ENTRE EL ACCESO Y EL CANAL
POB. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN**





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**




**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COAHUILA;
ENTRE C. MÉXICO Y 10 DE FEBRERO.
COL. MEXICO**


PAVIMENTACIÓN




**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA; ENTRE
MÉXICO Y ZACATECAS
COL. MEXICO**

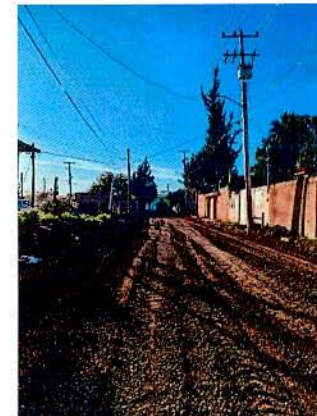

**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS;
ENTRE C. REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES
COL. VALLE VERDE**

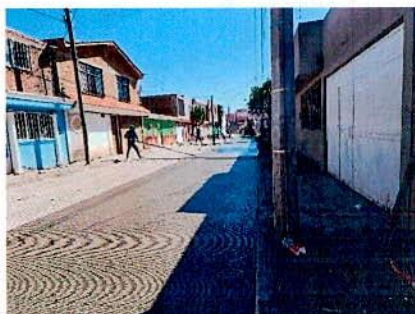

**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
COAHUILA; ENTRE C. MÉXICO Y 10 DE
FEBRERO.
COL. MEXICO**

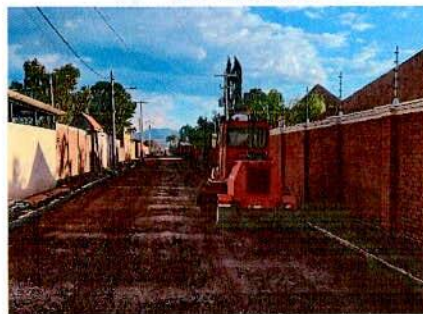

**PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE
PRINCIPAL; ENTRE ACCESO Y EL CANAL
POB. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN**



**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CALANDRIAS;
ENTRE C. PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO
JILGUEROS
FRACC. SILVESTRE REVUELTAS**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "ABRAHAM GONZÁLEZ"
POB. ABRAHAM GONZALEZ





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



**REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "LLANO GRANDE"
POB. LLANO GRANDE**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



**REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "MORCILLO"
POB. MORCILLO**





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





**REHABILITACIÓN EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO "SANTIAGO BAYACORA"
POB. SANTIAGO BAYACORA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

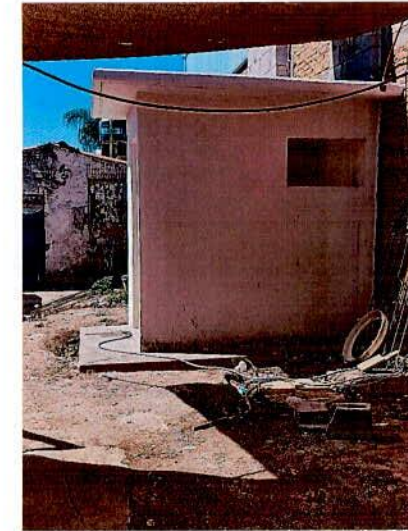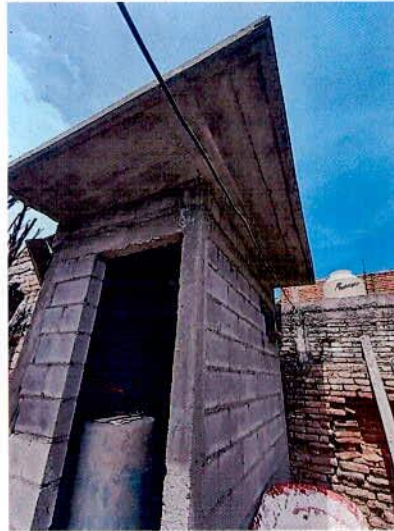

Construcción de Cuarto para Baño en Victoria de Durango



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



**Construcción de Cuarto Dormitorio Rural
en Zona Rural**





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



Construcción de Cuarto Urbano en Victoria de Durango



FINANCIAMIENTO (FISM)






**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

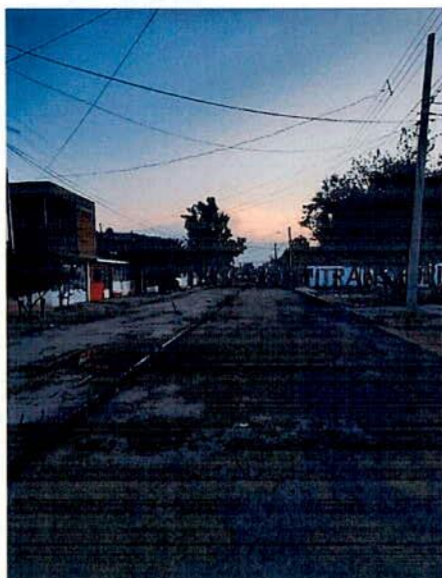

**REHABILITACIÓN AGUA POTABLE EN
LA CALLE 5 DE MAYO; ENTRE C.
INDEPENDENCIA Y MANUEL
BUENDÍA
COL. JOSE REVUELTAS**



**REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE DALIA; ENTRE C.
JAZMÍN Y CLAVEL
COL. PRI AMPLIACION**



**REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE
EN LA AVE. JUAN SALAZAR (O
PROLONG. LILAS); ENTRE C. ROSAS Y
PROLONG. TEMAZCAL
COL. JUAN SALAZAR**



**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



ALCANTARILLADO



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300; ENTRE AVE. DIVISIÓN DURANGO Y C. MARIANO ARRIETA FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA "COL. JOSE REVUELTAS"



REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FELIPE ANGELES 300; ENTRE C. SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ "COL. JOSE ANGEL LEAL"



**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



ALCANTARILLADO



**REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA
CALLE DALIA; ENTRE C. JAZMÍN Y CLAVEL
"COL. PRI AMPLIACION"**



**DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA
CALLE 5 DE FEBRERO; ENTRE C. 10
DE MAYO Y C. ARROYO SECO
COL. CONSTITUCION**



**REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLADO EN LA CALLE
MIRASOL; ENTRE C. ZAFIRO Y C.
CAMINO A LA LOMA
COL. SAN CARLOS**






**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



GUARNICIONES Y BANQUETAS



**CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5
DE MAYO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y MANUEL
BUENDÍA
COL. JOSE REVUELTAS**

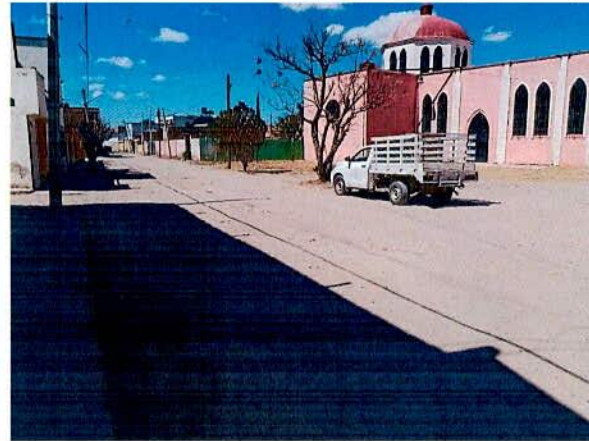

**CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES EN LA CALLE
COSTA RICA; ENTRE C. NUEVA
DELHÍ Y NÁPOLES
COL. UNIVERSAL**



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
EN LA CALLE DALIA; ENTRE C.
JAZMÍN Y CLAVEL
COL. PRI AMPLIACION**






**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



GUARNICIONES Y BANQUETAS



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA
CALLE 5 DE FEBRERO; ENTRE C. 10 DE MAYO Y
C. ARROYO SECO
COL. CONSTITUCION**

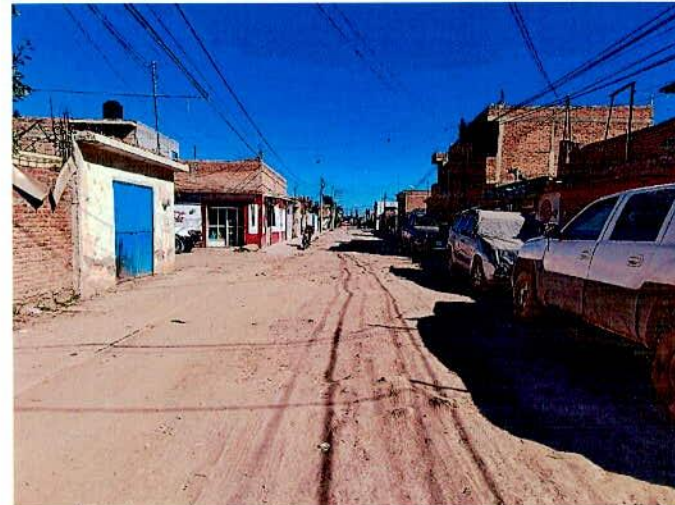

**GUARNICIONES EN LA CALLE
MIRASOL; ENTRE C. ZAFIRO Y C.
CAMINO A LA LOMA
COL. SAN CARLOS**



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
EN LA AVE. SAN JOSÉ; ENTRE C. SAN
VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN
COL. SAN JOSE III**



**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN



**PAVIMENTACIÓN EN LA PRIVADA No. 3; ENTRE
C. OJO DE AGUA Y C. CERRADA
FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO**



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE
FELIPE ANGELES 300; ENTRE C.
SAN JUAN DE GUADALUPE Y
CESÁREO RODRÍGUEZ
COL. JOSE ANGEL LEAL**



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE
DALIA; ENTRE C. JAZMÍN Y CLAVEL
COL. PRI AMPLIACION**






**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE FEBRERO;
ENTRE C. 10 DE MAYO Y C. ARROYO SECO
COL. CONSTITUCION**

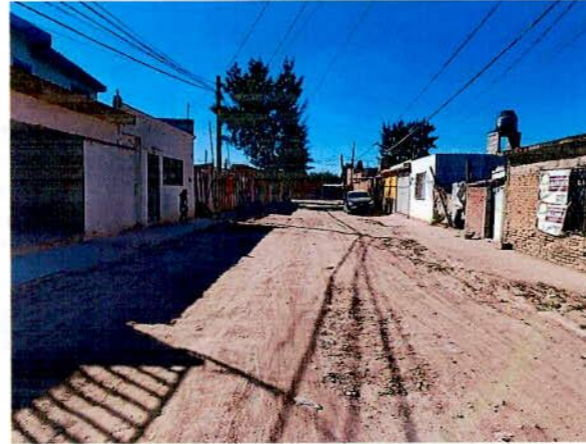

**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE
MIRASOL; ENTRE C. ZAFIRO Y C.
CAMINO A LA LOMA
COL. SAN CARLOS**



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE
COSTA RICA; ENTRE C. NUEVA DELHÍ
Y NÁPOLES
COL. UNIVERSAL**





**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN



**PAVIMENTACIÓN EN LA AVE. JUAN SALAZAR (O
PROL. LILAS); ENTRE C. ROSAS Y PROL. TEMAZCAL
COL. JUAN SALAZAR**



**PAVIMENTACIÓN EN LA AVE. SAN JOSÉ; ENTRE C. SAN VALENTÍN Y SAN
JUAN DE LETRÁN
COL. SAN JOSE III**






**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300; ENTRE
AVE. DIVISIÓN DURANGO Y C. MARIANO ARRIETA
FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA**

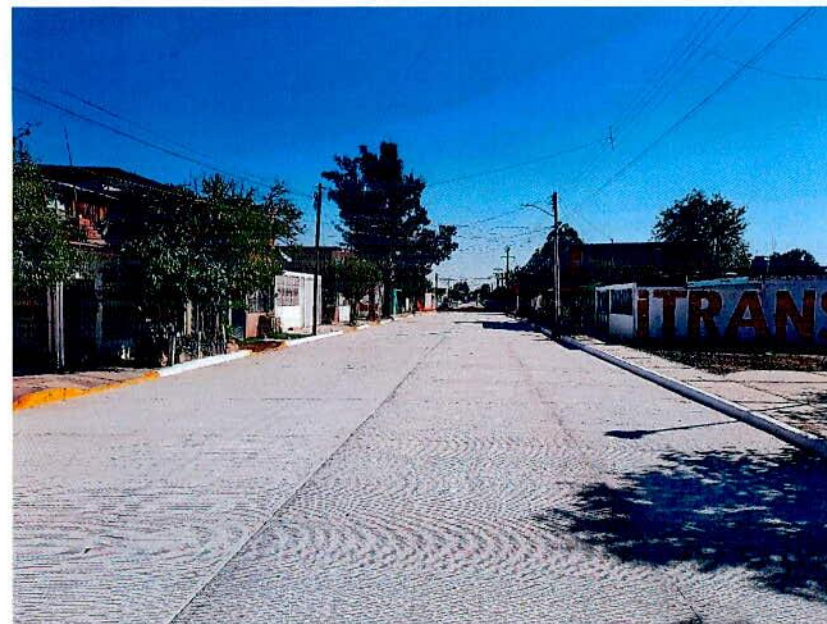

**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE
MAYO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y
MANUEL BUENDÍA
COL. JOSE REVUELTAS**



**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**EQUIPAMIENTO
FOTOVOLTAICO DE POZO DE
AGUA POTABLE
POB. EL NAYAR**



**EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
LOC. DE SAN JOSÉ DE ANIMAS**



**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**LÍNEA DE CONDUCCIÓN
LOC. EL CARRIZO**



**LINEA DE CONDUCCIÓN
LOC. LOS LOBOS**






**FINANCIAMIENTO (FISM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**




INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**REHABILITACIÓN DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO
POB. 20 DE NOVIEMBRE**

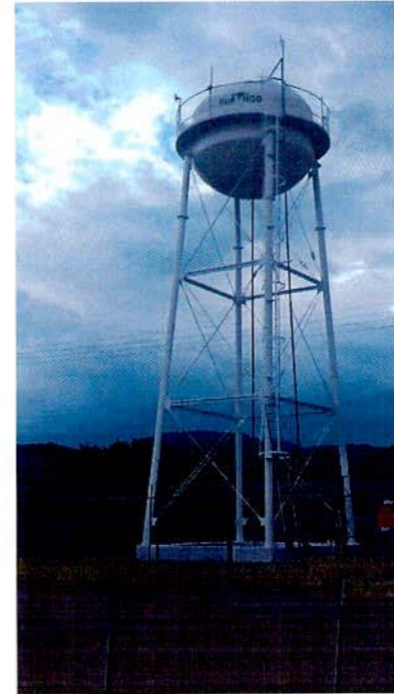

**REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
POB. EL CARMEN Y ANEXOS.**

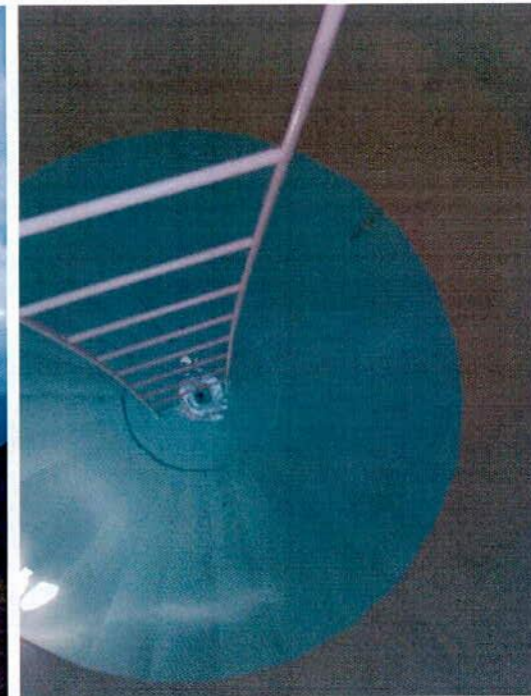



PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)





**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE



**TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE COSTA RICA; ENTRE C. NÁPOLES E ITALÍA
COL. UNIVERSAL**






**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



GUARNICIONES Y BANQUETAS



**Calle Costa Rica entre Nápoles e Italia
en Col. Universal**

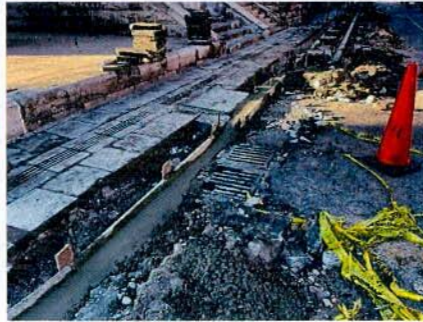

**REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE VICTORIA DE DURANGO**



**Calle Cruz Infante entre Calle Ignacio
López y Circuito Interior
En Col. Valle del Guadiana**



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN




**Pavimentación calle Adolfo
López Mateos entre Costa Rica a
Emilio Portes Gil
en Col. López Portillo**



**Calle Costa Rica entre Napoles
e Italia Col. Universal**



**Calle Cruz Infante entre Calle
Ignacio López y Circuito Interior
en Col. Valle del Guadiana**

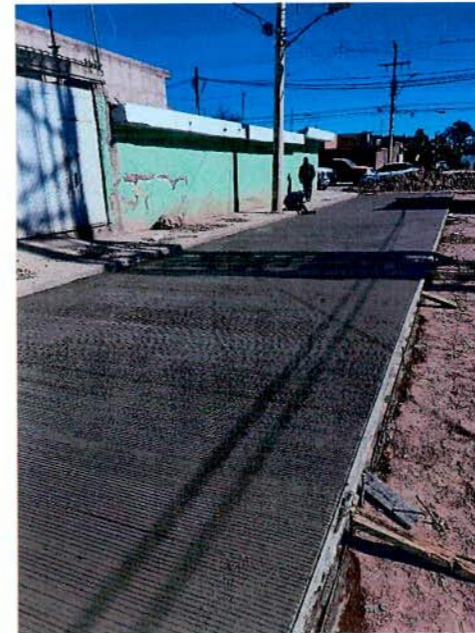

**Pavimentación de calle 12 De Octubre entre 10 de Abril y 3 de
Agosto
en Col. Tierra Y Libertad**






**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

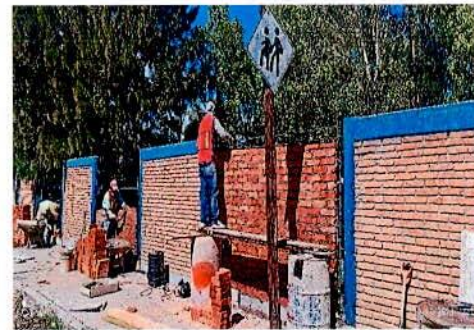

**DOMO EN LA ESC. PRIM. "RICARDO FLROES MAGÓN"
CCT 10DPR0302Z.
COL. ARTURO GAMIZ**


**CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, CCT 10DPR0912Z.
POB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA TINAJA)**



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

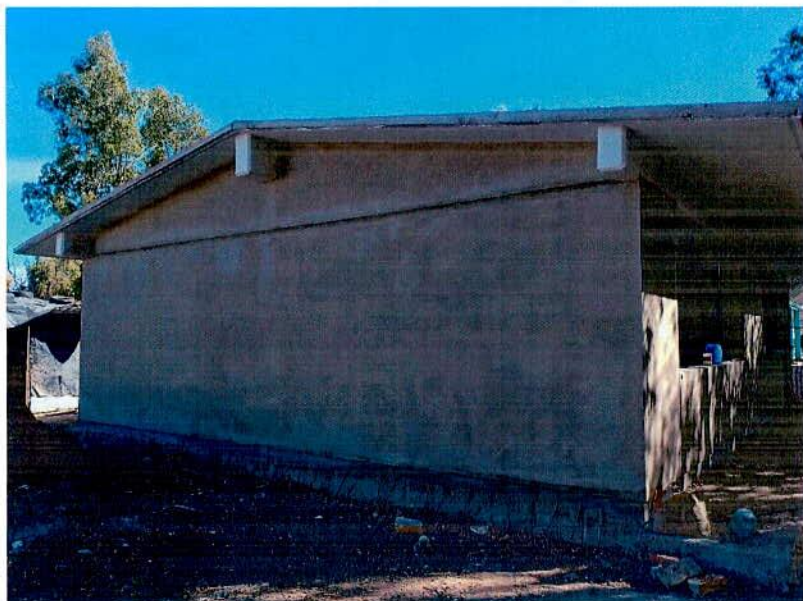

**AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. "DOROTEO ARANGO",
CCT 10EPR0327G
COL. TIERRA Y LIBERTAD**



**Cancha de Fútbol en Escuela
Solidaridad CCT 10DPR1606Z
COL. SAN CARLOS**



**Construcción de Domo en la
Cancha de Basquetbol Escuela
General Carlos Real CCT
10EPR0061Q, Loc. Morcillo**



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL POB. DOLORES HIDALGO



Rehabilitación de la Unidad Deportiva Las Nubes ubicada en Avenida Resplandor Fracc. Las Nubes


"REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL NAYAR"



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

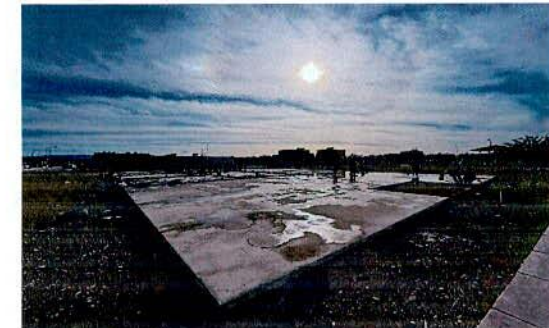

**Construcción de Barda en Área
Deportiva col. Cuadra del
Ferrocarril**

**Rehabilitación de Cancha de Fútbol 7 Col.
División de Norte**


**Construcción de Cancha de Usos
Múltiples Fracc. Barcelona**



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



OBRA DIVERSA

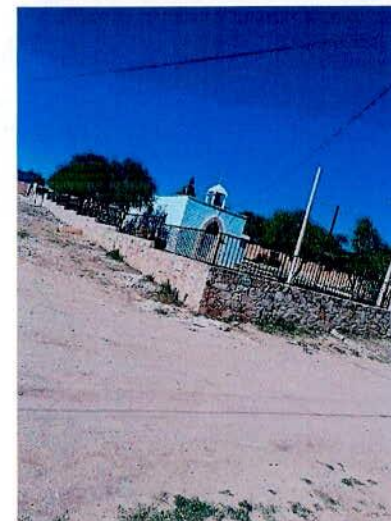

**CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL GUADALUPE
VICTORIA**

**REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA FAMILIA EN EL POB. EL
CONEJO**



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



OBRA DIVERSA



**RECONSTRUCCIÓN DE ALBERCA OLÍMPICA
EN VICTORIA DE DURANGO**





**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



OBRA DIVERSA



**Construcción del Centro de Operaciones de Emergencia
en Col. Guadalupe**

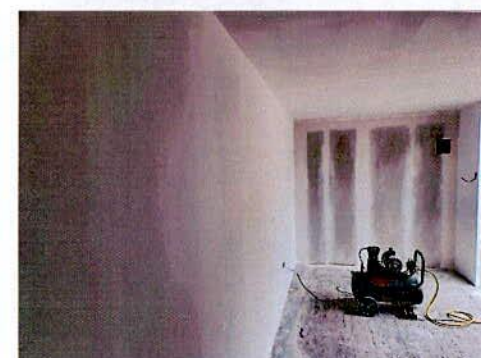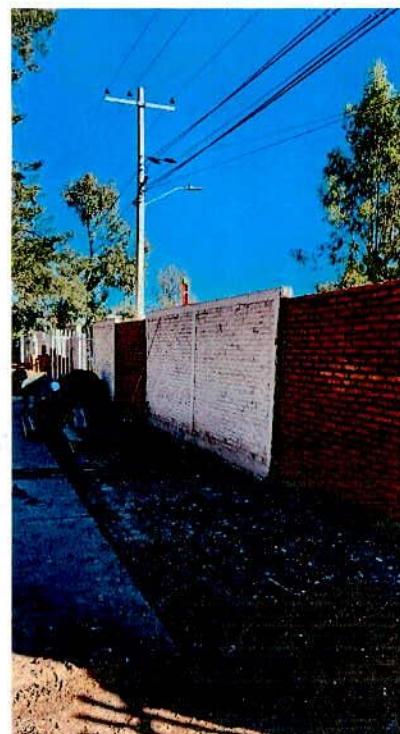

**Espacio de Relajación y Recreación del CBTis 130
CCT10DCT0398M en Fracc. Los Fuentes**



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



OBRA DIVERSA



**Rehabilitación de Área Verde
Col. Carlos Luna**



Rehabilitación y Remodelación del Panteón de Oriente



**PARTICIPACIONES FEDERALES (PNM)
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

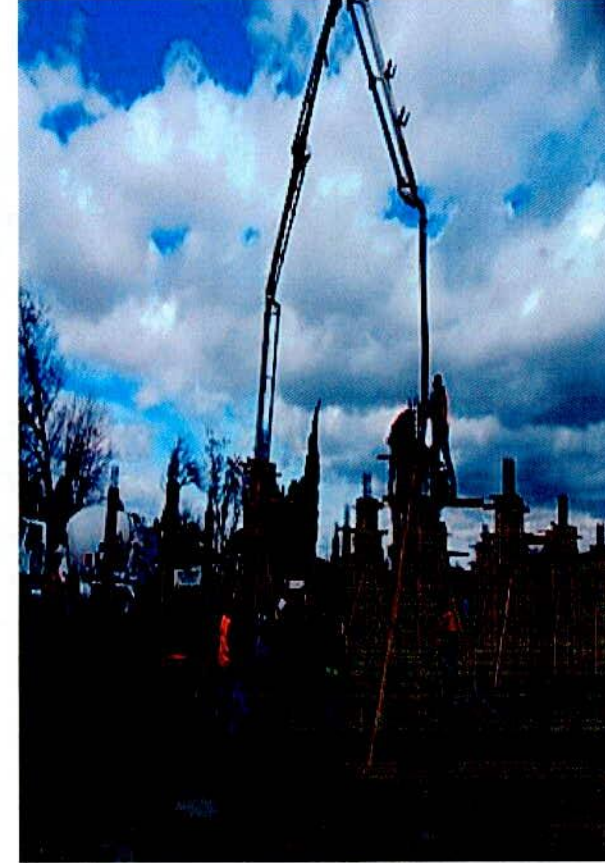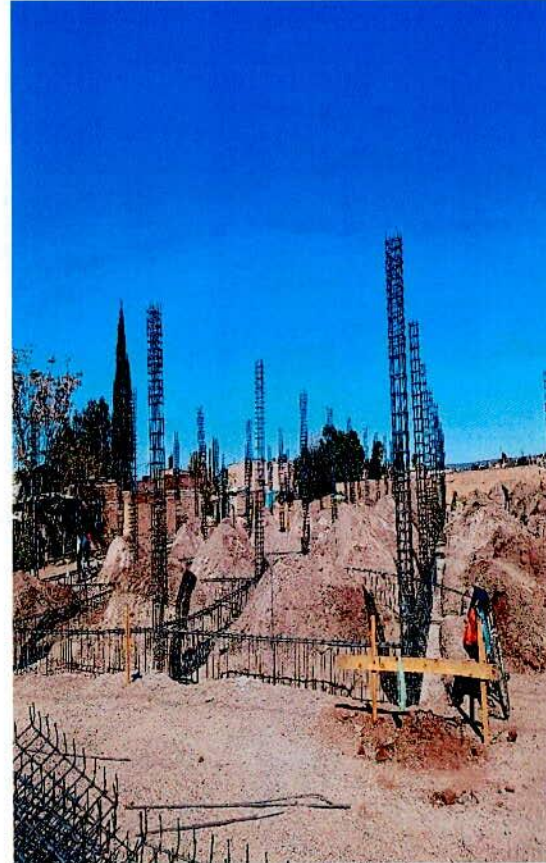

Construcción Hospital del Niño



REPUBE 2023






**REPUVE
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN DE CALLES

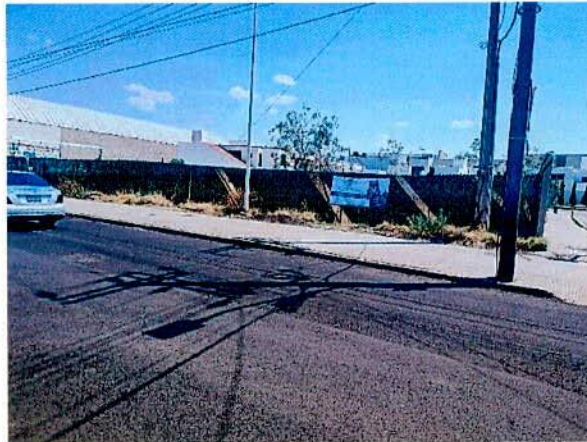

Pavimentación de Calle Constituyentes con Asfalto entre Blvd. Francisco Villa y Calle Año de Juárez en el Fracc. Guadalupe Victoria infonavit, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango



Pavimentación de Calle Gabino Barreda con Asfalto entre Calle Independencia y Av. Dolores del Rio Zona Centro en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango



Pavimentación de Calle Reforma con Asfalto entre Blvd. Cnel. Enrique Carrola Antuna y Calle Mascareñas de la Col. Porfirio Díaz, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango




REPUVE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023




PAVIMENTACIÓN DE CALLES



Pavimentación de Calle Valle del Guadiana con Asfalto entre Calle Nazas (0+000) hasta 0+319.40 en el Fracc. Valle del Mezquital, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango

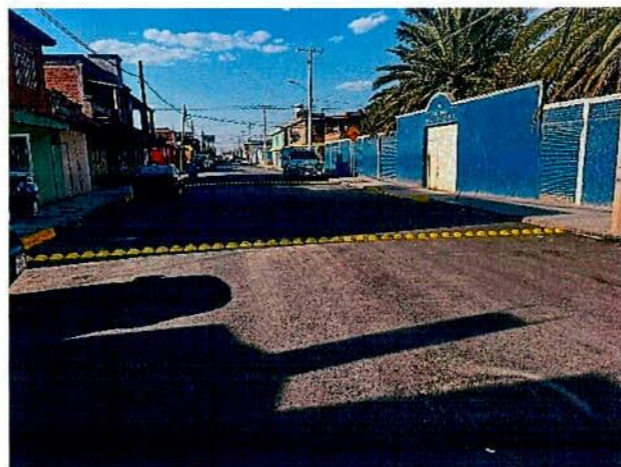

Pavimentación de Calle 15 de Octubre con Asfalto entre Calle 5 de Febrero y Calle Abraham González en la Col. Ejidal, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango

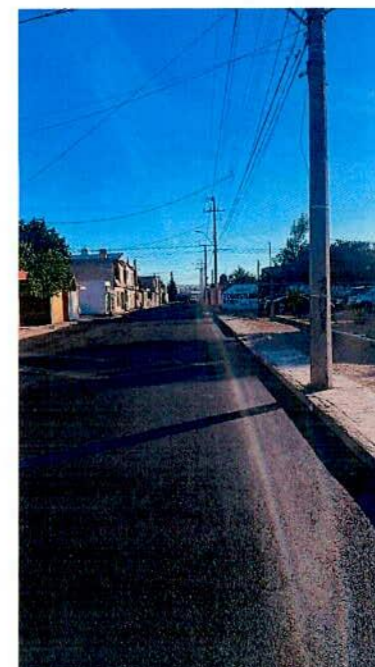

Pavimentación de Calle Valle de los Andes con Asfalto entre Calle Nazas (0+000) hasta 0+331.90 en el Fracc. Valle del Mezquital, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango




**REPUVE
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN DE CALLES



Pavimentación de Calle Benito Juárez con Asfalto entre Calle Justo Sierra y Calle Ricardo Flores Magon en la Col. J. Guadalupe Rodríguez, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango

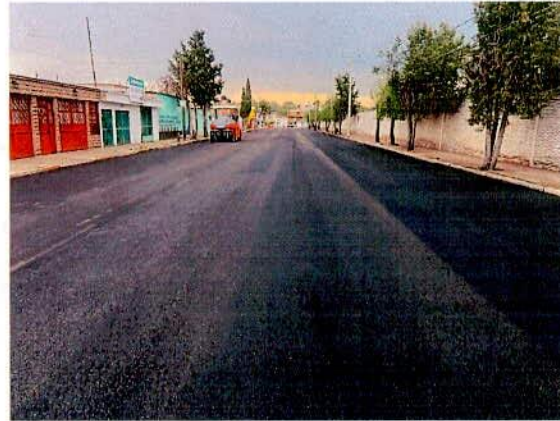

Pavimentación de Calle María Bayona con Asfalto entre Prol. Pino Suarez y Blvrd. de la Juventud en la Col. Santa Fe, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango



Pavimentación de Calle 8 de Julio con Asfalto entre Av. Mercurio y Av. Fidel Velázquez Sánchez en el Fracc. Fidel Velázquez, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango





**REPUVE
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN DE CALLES



Pavimentación de calle Mascareñas con asfalto entre calle Marlos león de la Peña y calle reforma en Zona Centro, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango



Pavimentación de Calle División Durango con Asfalto entre Cerro del Mercado y Av. San Ignacio en las Colonias Cerro del Mercado III, Benjamín Méndez, 16 de Septiembre y Col. San ignacio, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango



Pavimentación de calle canatlán con asfalto entre calle Educación y calle Sta. María del Oro en la Col. Hipodromo, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango




**REPUVE
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**



PAVIMENTACIÓN DE CALLES



Pavimentación de Calle Pastor Rouaix con Asfalto entre Calle Eduardo G. Cadaval y Calle Alberto Cincunegui en la Col. Héctor Mayagoitia, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango

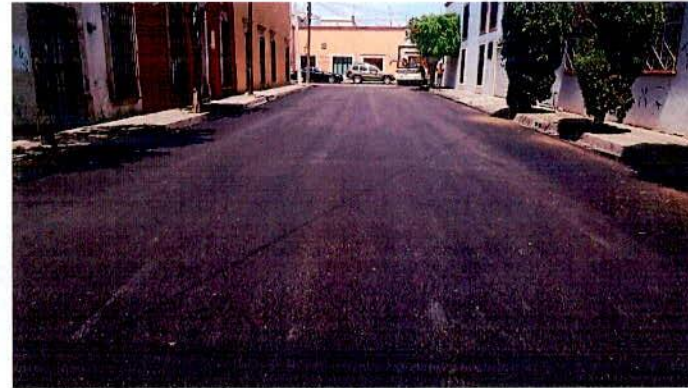

Pavimentación de Calle Elorreaga con Asfalto entre Calle Lic. Benito Juárez y Calle Lic. Alberto Terrones en Zona Centro, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango



Pavimentación de Calle San José con Asfalto entre Calle México y Calle Hacienda de San Luis en el Fracc. Hacienda de Tapias, en el Municipio de Durango, en la Localidad de Durango
