

OPERADO

2022

FISM**OBRAS PÚBLICAS**
Dirección de Obras Públicas**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-55

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**Subprograma:** 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA**Clave de la Obra:** SE220020 CP**Descripción de la Obra:** REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO- JORGE "LUPO" SALAZAR**Ubicación:****Colonia:** FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA**Fecha Real de Inicio:** 08/06/2022**Fecha Real de Terminación:** 05/09/2022**En la Localidad de:** Durango**Municipio:** 005.- DURANGO**Estado de:** DURANGO**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:**Unidad OBRA Cantidad:** 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0743	11 de abril de 2022	\$1,099,999.77	\$1,099,999.77	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:**Unidad OBRA Cantidad:** 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,093,442.44	\$1,093,442.44	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Rehabilitación de baños. Retiro de muebles sanitarios, lavabo y wc, incluye: material con recuperación. Revisión y reparación de tubería pvc sanitaria de 2" a 4" incluye sondeo y reposición de tubos en mal estado. Pintura vinil acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos marca berel de 7 años de garantía, incluye: aplanado con mortero comercial arena proporción 1:5, preparación, lijado, descercado, limpieza, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de dispensador de toallas en rollo jofel color humo modelo ag24100 suministro y colocación de dispensador de jabón jofel color humo modelo dj90001 malla retiro de malla ciclónica de 2.00 mts de altura incluye: herramienta, mano de obra y limpieza cancha de voleibol cajeo de materia no útil, incluye: carga y acarreo fuera de la obra, afine de excavación suministro y colocación de hule de silo en toda la superficie de 3 capas con traslapes de 20 cm tubo de pvc de 8" perforado en todo lo largo de la cancha 2 filas construcción de pozo de absorción a base de ladrillo rojo recocido con tapa brocal y piso de grava con dimensiones de 1.5 m ancho, 1.5 m alto. Suministro y colocación de arena sílica. Muerto de concreto de .70x.40x.40 mts de f'c=150 kg/cm2 con camisa para tubo de 2" cal.12 galv. Para evitar oxido. Suministro y colocación de tubo de 2" cal.12 galvanizado con argollas metálica de 2 1/2". Suministro y colocación de red de nylon semiprofesional. Suministro y colocación de líneas a base de nylon para delimitar la cancha de voleibol color rojo. Excavación en material tipo b para alojar guarnición. Demolición de firme de concreto de 10 cm esp; incluye: retiro fuera de obra. Cancha de futbol 5. Pintura esmalte en estructura de portería de cancha de futbol 5 de 2 a 3 manos, incluye: limpieza, lijado o resanado. Frontón. Suministro y aplicación de pintura vinílica de 2 a 3 manos en gradas y barda perimetral, incluye: preparación de superficie y resanado. Aplicación de pintura esmalte en estructura de 2 a 3 manos, incluye: limpieza, lijado y preparación de la superficie. Demolición de caseta con medios manuales de 2x2x2.5 mts de alto, incluye: carga y acarreo fuera de la obra. Imagen institucional. Lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos. Alumbrado cancha de usos múltiples desmontaje, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km 2.5 de reflectores existentes de 250 watts en postes de 10 metros de la cancha de usos múltiples, desmontaje de una altura de 10 mts. Suministro y colocación de tapa con tornillo y tuerca para registro eléctrico de 6 1/2" x 2" de la parte inferior del arbotante para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor. Pintado de arbotante cónico circular de 10 mts de alto con pintura

OPERADO

2022

FISM


OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



anticorrosiva y esmalte con dos tonos de aplicación, indicados por supervisor. Pintado de cruceta para cuatro reflectores con pintura anticorrosiva y esmalte con dos tonos de aplicación, indicados por supervisor. Pintado de cruceta para dos reflectores con pintura anticorrosiva y esmalte con dos tonos de aplicación, indicados por supervisor. Sondeo y limpieza de poliducto existente de 1 1/4". Suministro y colocación de conector ac-508. Suministro y colocación de conector cilíndrica para acometida aislado. Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2x10amp. Suministro y colocación de contactor magnético para 30 amp 220v. Suministro y colocación de reloj digital marca tork modelo: e101pb con batería de respaldo a 127 volt. Contacto. Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para intemperie en caja conduit fs de 3/4" a 2.20 mts de altura en arbotante de cancha de usos múltiples incluye: tubería conduit p.g. De 3/4" fijación, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de registro eléctrico con un desarrollo de 1 mts de ultimo registro eléctrico. Suministro y colocación cable duplex urd (1x6) + (1x6) incluye: amarres, cinta de aislar scotch super 23 y 33 para su aislamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo qo 1x20 incluye conexión y pruebas. Alumbrado perimetral: Desmontaje, almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km:2.5 de luminaria cuadrada existentes de 250 watts en postes de 10 mtros de la cancha de usos múltiples, desmontaje de una altura de 10 mts. Suministro y colocación de tapa con tornillo y tuerca para registro eléctrico de 6 1/2" x 2" de la parte inferior del arbotante para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor. Pintado de arbotante cónico circular de 10 mts de alto con pintura anticorrosiva y esmalte con dos tonos de aplicación, indicados por supervisor. Suministro y colocación cable triplex urd (2x6) + (1x6) incluye: amarres, cinta de aislar scotch super 23 y 33 para su aislamiento. Suministro y colocación de conector ac-508. Suministro y colocación de conector cilindrico para acometida aislado. Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2x10amp. Suministro y colocación de contactor magnético para 30 amp 220v. Suministro y colocación de fotocelda, base para fotocelda, incluye: pijas, tres cables de control cal.12, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de salida para fotocelda y base, hacia arriba de caseta con tubería pvc de 1/2" desde gabinete alcodm incluye: mufa 1/2, tubo galvanizado pared gruesa a la intemperie, conectores, coples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de gabinete alcodm 40x30x20 incluye fijación. Domo. Retiro y reubicación (en alumbrado perimetral) de luminaria sola basic de 100 watts, modelo sola led city plus de led de 100 w sin base para fotocelda incluye: luminaria de 100 watts multi voltaje. Suministro y colocación de reloj digital marca tork modelo: e101pb con batería de respaldo a 127 volt. Suministro y colocación de contactor magnético para 30 amp 220v. Suministro y colocación cable triplex urd (2x6) + (1x6) incluye: amarres, cinta de aislar scotch super 23 y 33 para su aislamiento. Suministro y colocación de tubería gal. 1/2" pared delgada incluye: dos cables cal 12 thw, un cable cu. Cal: 12 desnudo, cortes, juntas, conectores, pijas auto taladrantes, abrazaderas omega, condulets ovalado, tubo licuatite, cable uso rudo 3x14 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de tubería gal. 3/4" pared gruesa incluye: monitores, contras, cortes, juntas, conectores, pijas auto taladrantes, abrazaderas omega y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Oficina. Suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mvp algedi iii incluye: luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de luminaria 6ydlled 430mv30v, bucamanga v1 para empotrar, incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Baños hombres. Suministro y colocación de luminaria 6ydlled 430mv30v, bucamanga v1 para empotrar, incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Baños mujeres. Bodega. Suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mvp algedi iii incluye: luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de luminaria 6ydlled 430mv30v, bucamanga v1 para empotrar, incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Locales. Suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mvp algedi iii incluye: luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de luminaria 6ydlled 430mv30v, bucamanga v1 para empotrar, incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Alimentación octagono. Sondeo y limpieza de poliducto existente de 1 1/4". Retiro y almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km 2.5 de cable thw cal. 8 y de la cancha de usos múltiples. Suministro y colocación cable duplex urd (1x6) + (1x6) incluye: amarres, cinta de aislar scotch super 23 y 33 para su aislamiento. Acometida. Suministro y colocación de interruptor principal hdl26040, marca square d incluye: gabinete y fijación a caseta. Suministro y colocación de centro de carga qo112l125grb monofásico, incluye: frente y fijación. Suministro y colocación tubo licuatite de 1 1/4" incluye: fijación. Suministro y colocación conector recto de 1 1/4". Suministro y colocación de tubo conduit de p.d de 1 1/4". Suministro y colocación de conector p.d de 1 1/4". Suministro y colocación de abrazadera unicanal de 1 1/4". Suministro y colocación de pija #8 x 1.5. Suministro y colocación de varilla para sistema de tierras de 3 mts de largo x 5/8" incluye: conector para varilla reforzado, un metro de alambre de cu. Cal. 6. Rehabilitación de gabinete de 1.50mts x.80cm x.25cm incluye pintura de esmalte anticorrosiva, cambio de madera triplay al interior de gabinete, chapa, candado no. 10 marca philips. Subestacion. Suministro y colocación de corta circuitos en 13,2, con fusibles de 2 amp. Suministro y colocación de apartarrayos en 13,2. Atípicos. Suministro y colocación de perfil tubular de 1 1/2" cal. 18, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. Pintura esmalte en pisos, muros y estructura metálica, a dos manos, incluye: limpieza de la superficie. Suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 ca. 10.5, fijada con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en parte baja según proyecto, incluye: equipo, herramienta, andamios, materiales y mano de obra. Aplanado fino en muros y plafones con mortero comercial-arena 1:4 con espesor prom. De 2 cm.. A plomo y regla, acabado con llana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates, incluye filetes. Rehabilitación de bancas a base de muros de tabique y asientos con perfiles de herrería, incluye:

rehabilitacion de muros con tabique, aplanado fino, pintura en muros y herreria. Colocacion de garnicion de concreto $f'c=150$ kg/cm^2 , diferentes secciones. Demolicion de ledge con medidas aproximadas de 4.30x2.30 en forma piramidal con inicio de 0 a 45cm, incluye: de muro de 4.30x0.15x0.95 m y acarreo de material no util fuera de la obra. Demolicion de funbox con medidas aproximadas de 2.57x0.60.0.45 mts, incluye: acarreo de material no util fuera de la obra. Concreto $f'c=200$ kg/cm^2 en muros y columnas con cemento normal t.m.a. 3/4" elaborado en obra con maquina revolovedora, incluye colado, vibrado y curado durante 7 dias, para muro ciclopeo. Cimbra en muros y columnas aparente con triplay de pino de 16 mm, incluye: habilitado., cimbrado, descimbrado, chaflanes y ochavos. Suministro y colocacion de registro alumbrado prefabricado de concreto con medidas de 40x40x40 cms, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de registro de baja tension prefabricado de concreto con medidas de 60x60x60 cms, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de poliducto electrico reforzado de 1 1/4" incluye: cortes, codo, conectores, coples, excavacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Reposicion de firme de concreto de $f'c=150$ kg/cm^2 en 12 cm de espesor t.m.a. 3/4", incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de luminaria con sensor de movimiento de sobreponer 17.8 cm de diametro, mca comercial electric modelo venecia, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. suministro y colocacion de reflector led de 100 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, de 9,000 lumens modelo rs-100wbb / bc incluye: cable uso rudo, cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de reflector led de 150 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, de 13,500 lumens modelo rs-150w incluye: cable uso rudo cal 3x12, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

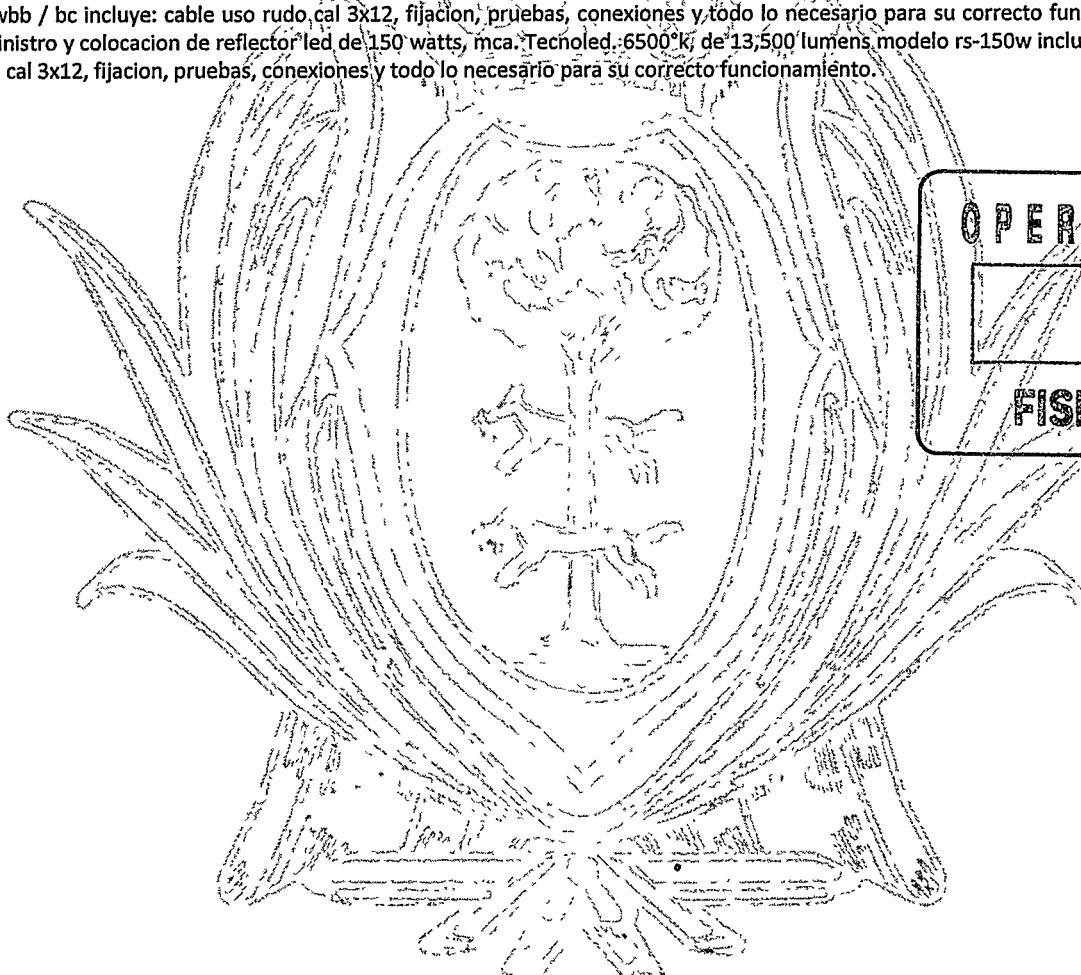

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE


ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION


MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ.

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

