

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFE-2022-86

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE220062 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO "EL HUIZACHE II" ✓

Ubicación: 0

Colonia: FRACC. HUIZACHE II ✓



Fecha Real de Inicio: 19/08/2022 ✓ Fecha Real de Terminación: 16/11/2022 ✓

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0792	15 de junio de 2022	\$1,585,140.38	\$1,585,140.38	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$-904,965.42	\$-904,965.42	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$889,786.10	\$0	\$0	\$889,786.10	\$0


Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,569,961.06	\$680,174.96	\$0	\$889,786.1	\$0


ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Pintura en cancha de usos múltiples pintura top deportivo en líneas de canchas de usos múltiples en diferentes colores, de 5 cm de ancho trabajo terminado incluye trazo, limpieza y preparación de superficie. Cancha de fútbol 7 pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte en estructura metálicas (color blanco) ptr 2"x2" de tela ciclónica de cancha de fútbol con una altura de 2.00 mts en laterales y 4.00 mts. En cabeceros, incluye lijado, fondo y pintura suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63 cal. 10.5 incluye fijación con solera soldada de 3/4x3/16 con fondo anticorrosivo y acabado con esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en parte baja según proyecto, incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano obra. Pintura en domo suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálica de 2 a 3 manos color según proyecto en estructura de domo, columnas, vigas, canalones y bap, incluye fondo anticorrosivo y preparación de la superficie pintura en barda perimetral pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en estructura metálica (modulos en barda perimetral medida 6.00 largo 1.50 altura promedio), aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersión, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie , lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en estructura metálica (puertas de acceso medida 6.00 largo 2.60 altura promedio), aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersión, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie , lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura en sanitarios pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de



garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura en rampa para personas con capacidades diferentes en color azul incluye pintura de discapacidad en color blanco (rotulado) incluye logotipos discapacidad. Retiro de lavabos existentes, anclados en barra en sanitarios incluye acarreo hacia fuera de la obra. Suministro y colocación de lavabo de primera calidad marca incluye llaves marca urrea reforzadas pintura en gradas suministro y aplicación de pintura esmalte alkidalica de 2 a 3 manos color según proyecto en estructura de domo con vigas, canalones y bap, incluye fondo anticorrosivo y preparación de la superficie pintura esmalte marca berel y/o similar alquidalico, en estructura metalica (modulos en estructura 25.00 largo 1.50 altura promedio), con su estructura para alojar lona ...incluye desmontaje y montaje de lona para pintar la estructura aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersion, incluye; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Pintura en tableros y estructuras pintura esmalte marca berel y/o similar alquidalico, en estructura en estructura tipo conade aplicacion de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersion, incluye; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Incluye rehabilitacion de tableros pintura en caseta pintura vinil-acrítica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Área de esparcimiento suministro y colocación de corteza fina triturada en área de trotapista y áreas de juegos infantiles con un espesor promedio de 7 cms, incluye acarreos, limpieza y acomodo de la misma. Aparatos ejercitadores incluyentes pintura y sustitucion de lona en bancas rehabilitacion en bancas existentes, desmontaje y montaje de lona en sombra de bancas sección (2.00 mts x 2.00 mts). Suministro y aplicación de pintura esmalte alkidalica de 2 a 3 manos color según proyecto en estructura, incluye fondo anticorrosivo y preparación de la superficie.) Pintura en palapas existentes suministro y aplicación de pintura esmalte alkidalica de 2 a 3 manos color según proyecto en estructura de papalas de acero de sección (4.30mts x 4.30 mts), incluye fondo anticorrosivo y preparación de la superficie.) Trotapista suministro y colocación de corteza fina triturada en área de trotapista y áreas de juegos infantiles con un espesor promedio de 7 cms, incluye acarreos, limpieza y acomodo de la misma. Pintura en cesto de basura suministro y aplicación de pintura esmalte alkidalica de 2 a 3 manos color según proyecto en estructura de cestos de basura de acero, incluye fondo anticorrosivo y preparación de la superficie.) Instalación eléctrica alumbrado perimetral retiro y almacenamiento de luminaria mangus de 175 watts a bodegas municipales (planta en carretera mexico km 2.5) incluye: acarreos, mano de obra y herramienta incluye: traslado a almacen indicada por supervisión pintura de arbotante conico cuadrado de 5 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de brazos para arbotante 30 cm con placa perforada para atornillar en percha de arbotante. Suministro y colocación de fotocelda incluye: fotocelda fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactor magnético marca siemens modelo 3rt1036 con bobina en 220 incluye: fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Canchas de fut bol 7 retiro y almacenamiento de reflector tipo campana de 1000 watts a bodegas municipales (planta en carretera mexicana km 2.5) incluye: traslado a almacen indicada por supervisión suministro y colocacion de reflector led de 600 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, de 63000 lumens y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento pintura de arbotante conico circular de 10 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de tapa con tornillo y tuerca para registro eléctrico de 6 1/2" x 2" de la parte inferior del arbotante para conexiones, con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono indicados por supervisor. Canchas de usos multiples retiro y almacenamiento de reflector tipo campana de 400 watts a bodegas municipales (planta en carretera mexicana km 2.5) incluye: traslado a almacen indicada por supervisión pintura de arbotante conico circular de 9 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de reflector led de 200 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, de 12000 lumens y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento domo cancha usos multiples retiro y almacenamiento de reflector tipo campana de 400 watts a bodegas municipales (planta en carretera mexicana km 2.5) incluye: traslado a almacen indicada por supervisión suministro y colocacion de reflector led de 100 watts, mca. Tecnoled. 6500°k, rzh-100w-bb de 10,000 lumens y/o similar incluye: conectores registros, cable uso rudo cal 3x12, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de reloj digital con respaldo de batería marca tork incluye fijación en gabinete suministro y colocación de contactor magnético para 30 amp 220v suministro y colocación de tuberia poliducto pad 1 1/4" reforzado naranja empotrada en piso a 40 cm. Nivel de piso nat. Suministro y colocación cable triplex urd (2x6) + (1x6) incluye: amarres, cinta de aislar scoch super 23 y 33 para su aislamiento suministro y colocación de registro prefabricado de concreto de 40x40x40 con tapa suministro y colocación de tuberia gal. 3/4" pared delgada incluye: dos cables cal 10 thw, un calbe cu. Cal. 12 desnudo, cortes, juntas, conectores, pijas autotaladrantes, abrazaderas omega, condulets, codos, tubo licuatite, cable uso rudo 3x14 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2 x10amp suministro y colocación de cable cal 10 thw suministro y colocación de conector ac-508 contactos suministro y colocación cable triplex cal. 6 incluye: amarres, cinta de aislar scoch super 23 y 33 para su aislamiento suministro y colocación de tuberia poliducto pad 1" reforzado naranja empotrada en piso a 40 cm. Nivel de piso nat. Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para intemperie en caja condulet fs de 3/4 a 2.2 mts de altura incluye: tuberia conduit p.g. De 3/4" fijación, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de registro electrico, 3.7 mts de desarrollo suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x20amp

suministro y colocación de cable desnudo cal 12 suministro y colocación de cable cal 12 thw imagen institucional lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión rotulacion de logotipo institucional institucional del programa de recursos atipicos sum. Y col. De ejercitador de pecho, fabricante jumbo, modelo aem-514, aparato ejercitador-pecho-fortalece los musculos de brazos, hombros y pecho. Area minima requerida: l (3.60 m), /a (1.90 m). Sum y col de barras paralelas-fabricante jumbo, modelo okst-s03x. Aparato ejercitador-fortalece los musculos de los hombros, pecho y brazos mejora el equilibrio y flexibilidad de las articulaciones area minima requerida: l (3.48 m), /a (1.90 m) sum y col de ejercitador de escalera, fabricante jumbo, modelo okok no. 1, aparato de ejercicio-cintura-ayuda a fortalecer los musculos de cultura y abdomen mejora la flexibilidad de las articulaciones, area minima requerida: l (2.92 m), /a (1.90 m) suministro y colocacion de doble ejercitador de muñecas para parque publico, marca jumbo, modelo taji pushing, fortalece los musculos de brazos, hombros y muñecas, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion. Sum y col de ejercitador de pierna portro/rider suministro y colocacion de ejercitador de brazo, marca jumbo, capacidad para 2 personas incluye todo lo necesario para su correcta colocacion. Sum y col de ejercitador bicicleta marca jumbo suministro y colocacion hasta una altura de 4 metros de luminaria solaed city plus de-70w sin base para fotocelda, 100-277 v. 50/60 hz, ip 66, 7000 lm con 42 leds. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución pintura de tráfico de hule clorado marca berel o similar, en guarnición tipo bola, incluye: preparación de superficie, limpiezas, mano de obra y herramientas suministro e instalacion de modulo ejercitador de la marca jumbo modelo okok-no2-1 escalera doble, incluye mano de obra modulo ejercitador okok no2-1, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion

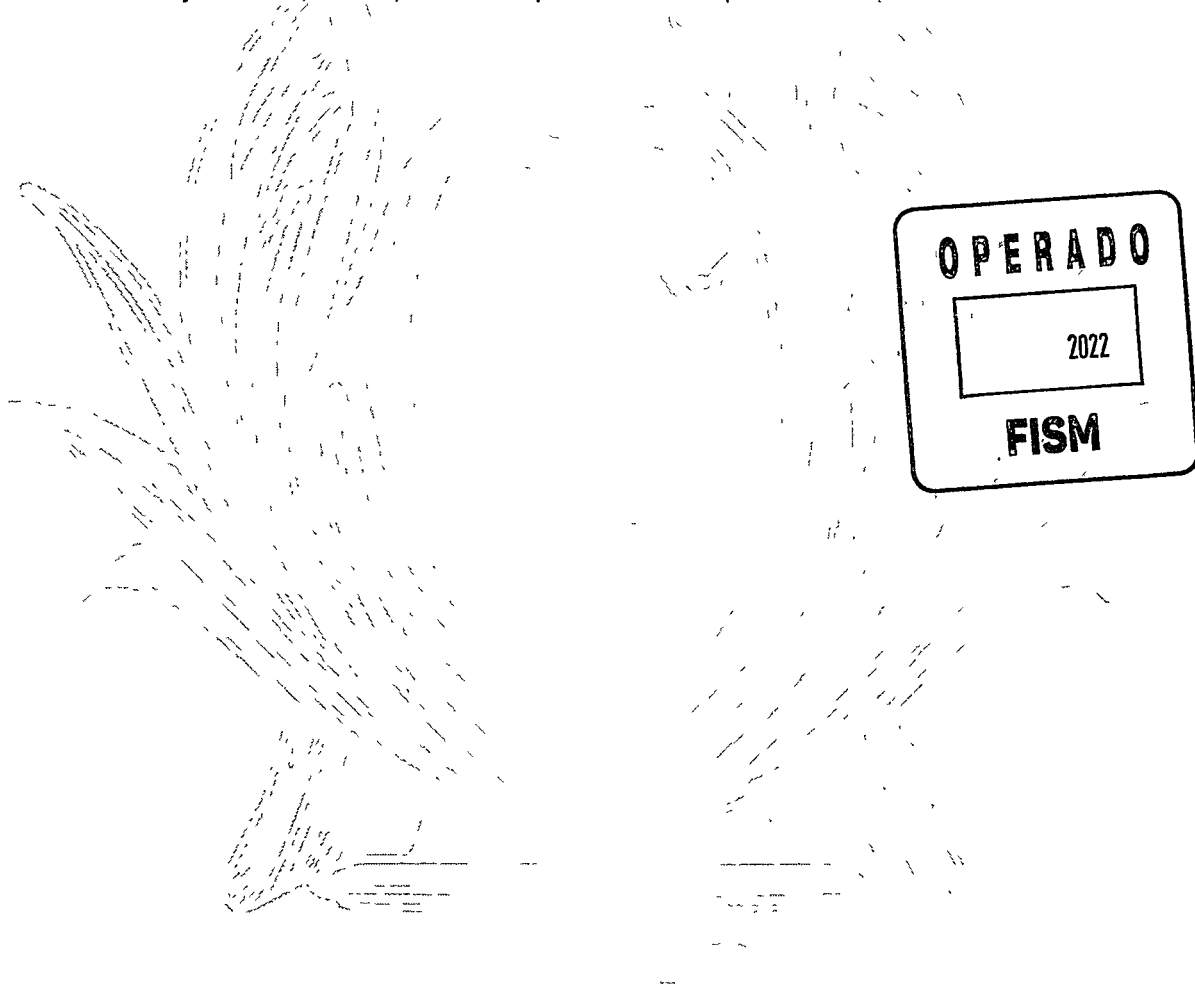

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

REGIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

MARIA DEL RAYO BARRAZA OCTEA

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

